

## 工程暂停令

工程名称：浙江天能动力源有限公司屋顶分布式光伏发电项目（20.34MWp）（三期、四期）  
编号：ZHJL-ZH-A08-002

致：海宁科茂微电网技术有限公司（施工项目经理部）

由于根据建设方要求原因，现通知你方于2022年05月16日12时起，全场暂停（工序）施工，并按下述要求整改。

建设单位、总包单位、监理单位会同现场相关管理人员，对现场进行了安全专项大检查，在检查过程中发现以下安全问题：

- 1、2#厂房爬梯上人点过高；
- 2、屋面未启动爬梯无禁用和警示标志。

要求：1、对三方联合检查出的安全隐患问题整改。  
2、组织全员安全教育学习，并形成学习记录。  
3、排查施工现场安全隐患。

以上问题整改和学习完成后报监理项目检查，符合要后开出工程复工令。



项目监理机构（盖章）：

总监理工程师（签字）：

夏新华

日期：

2022.5.16

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

## A.0.7 工程复工令

工程名称：浙江天能动力源有限公司屋顶分布式光伏发电项目（三期、四期）  
编号：ZHJL-ZH-A07-002

致：海宁科茂微电网技术有限公司（施工项目部）

我方发出的编号为 ZHJL-ZH-A08-002 《工程暂停令》，要求局部暂停施工的 所有施工 部位（工序），经查已具备复工条件，经建设单位同意，现通知你方于 2022 年 5 月 17 日 12:00 时起恢复施工。

附：工程复工报审表



项目监理机构：

总监理工程师：

夏新华  
期： 2022.5.17

本表由监理单位填写，一式三份，监理单位二份，建设、施工单位各一份

表 B.0.16 工程复工申请表

工程名称：浙江天能动力能源有限公司分布式光伏发电项目  
编号：HNKM-FGSQ-02

致 常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）：

第 ZHJL-ZH-A08-002 号工程暂停令指出的工程停工因素现已全部消除，具备复工条件。特报请审查，请予批准复工。

附：整改报告。

施工项目部（章）项目经理：王立新

日期：2022.5.17

审查意见：

同意复工，整改符合要求

项目监理机构（章）总监理工程师：王立新

日期：2022.5.17

审批意见：

建设单位（章）项目经理：

日期：


注：本表一式三份，由施工单位填报，建设单位、项目监理机构、施工单位各一份。

## 现场安全整改回复


- 1、现场组织工人进行安全教育培训；
- 2、外扶梯落脚点高的，下面垫东西方便上人；
- 3、未启用梯子，贴安全警示标识和警示线，禁止上人；
- 4、工人上下外扶梯系安全带。



现场安全教育培训

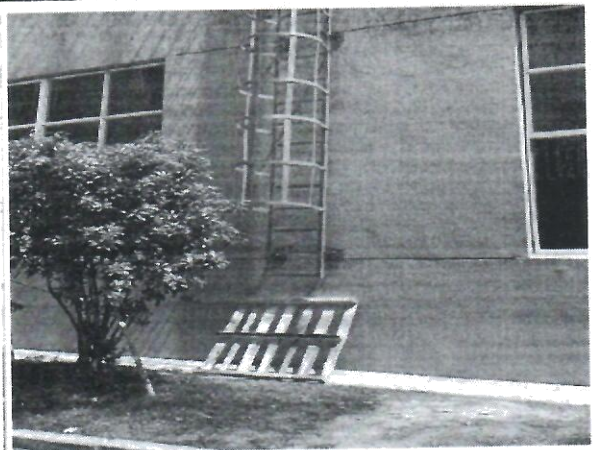

外扶梯落脚点高的

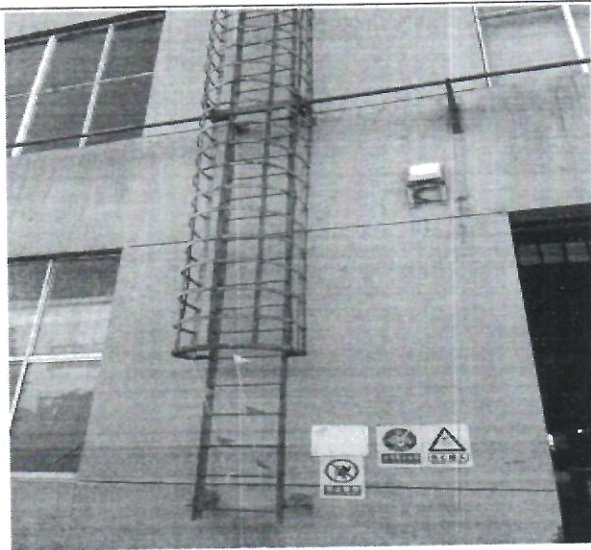

未启用外扶梯贴警示标识和拉警示线



工人上下外扶梯系安全带

# 安全教育培训报审表

工程名称：浙江天能动力能源有限公司吴山基地绿色产业园光储充示范项目屋顶分布式光伏发电项目  
编号：SYTH-CLBS-22

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方于 2022 年 5 月 17 日进行现场的安全教育学习培训，现将安全教育文件报上：  
请予以审核。

- 附件：1、会议签到表  
2、安全教育文件  
3、及整改回复报告

施工项目部（盖章）：  
项目经理（签字）：  
日期：2022.5.17

审查意见：

资料齐全，同意实施

项目监理部（盖章）：  
总监理工程师（签字）：  
日期：2022.5.17

审批意见：

建设单位（盖章）：  
项目经理（签字）：  
日期：

注：本表一式 4 份，由施工项目部填写，建设单位、监理单位各 1 份，施工单位 2 份

# 安全培训工作汇报


## 1. 开展时间:

2022 年 5 月 17 日;

## 2. 项目名称:

浙江天能动力源有限公司屋顶分布式发电项目;

## 3. 培训内容:

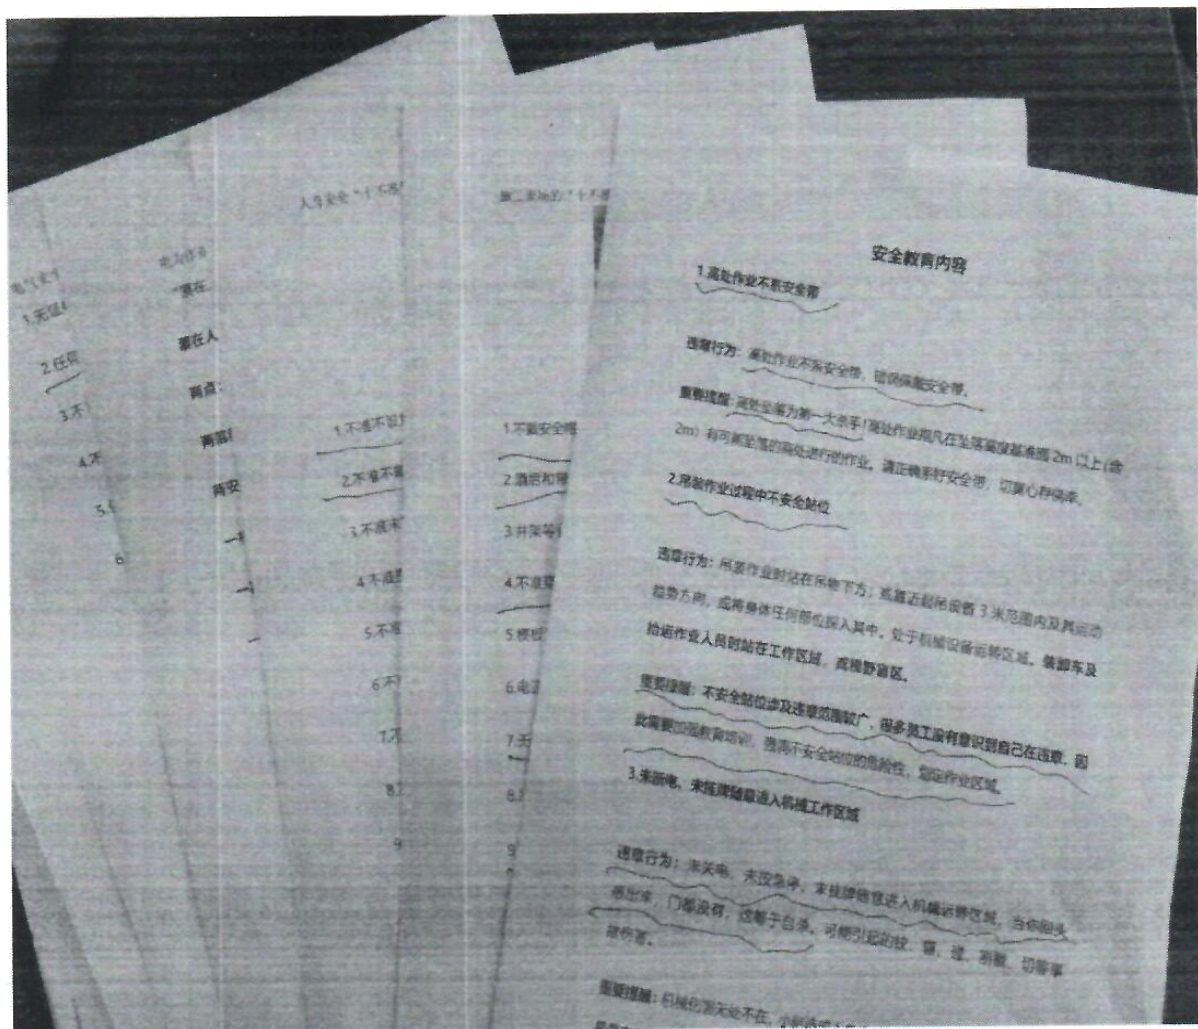

#### 4. 现场情况:



安全知识宣讲



观看安全事故警示视频

## 5. 培训记录:

培训签到表

|      |     |                   |             |
|------|-----|-------------------|-------------|
| 培训内容 |     | 吴山天路光伏电站施工人员强化培训会 |             |
| 培训时间 |     | 2022年5月7日         | 培训地点 吴山天路基地 |
| 序号   | 姓名  | 单位名称              | 联系电话        |
| 1    | 傅元元 | 长嘉实               | 13717282018 |
| 2    | 曾松  |                   |             |
| 3    | 王深明 |                   | 18867229901 |
| 4    | 刘久月 |                   | 1826267160  |
| 5    | 袁白阳 |                   | 13996589264 |
| 6    | 刘久刚 |                   | 13983550848 |
| 7    | 马望平 |                   | 17723804980 |
| 8    | 蔡远群 |                   | 18883646006 |
| 9    | 夏从俊 |                   | 15874496629 |
| 10   | 杜德平 |                   | 15923806460 |
| 11   | 郭南贤 |                   | 15367665695 |
| 12   | 张河新 |                   | 18974303083 |
| 13   | 曾文兰 |                   | 18723003011 |
| 14   | 熊立荣 |                   | 13790154294 |
| 15   | 龙金亮 |                   | 17338358111 |
| 16   | 张沛  |                   | 15906211061 |

|    |     |    |             |
|----|-----|----|-------------|
| 1  | 陈子  | 天能 | 15757180262 |
| 2  | 苏时佳 |    | 18325121273 |
| 3  | 张良吉 |    | 13175027676 |
| 4  | 赵青松 |    | 13965599467 |
| 5  | 蔡进平 |    | 15319686838 |
| 6  | 魏孝峰 |    | 13805674918 |
| 7  | 黄松林 |    | 13535361464 |
| 8  | 曹虎康 |    | 15546970251 |
| 9  | 王云  |    | 18895533443 |
| 10 | 许国  |    | 15901932461 |
| 11 | 许志强 |    | 18961519990 |
| 12 | 李永强 |    | 19906579991 |
| 13 | 李永强 |    | 13914011886 |
| 14 |     |    |             |
| 15 |     |    |             |
| 16 |     |    |             |

## 6. 培训总结：

本次安全培训相关内容知识，全面覆盖整个项目施工流程，梳理了各个流程节点及实际操作项目中需要注意的事项，加强了现场施工人员的安全风险防范、安全隐患排除、安全意识巩固；本次安全培训知识全面、效果明显、意义重大，会后立即在现场对施工人员进行随机性的知识提问，施工人员都能准确回答解释。

在后面的施工过程中我们会严格要求施工安全的管理，做好施工安全实施的检查，杜绝项目施工过程中安全隐患的出现。
