

表 B.1 监理工作联系单


工程名称：连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目

编号：LYGGF-JLLX-01

致 西安大唐电力设计研究院有限公司 (单位)

主题：1、关于桩进场的问题
2、关于施工图的要求
3、关于主变的定位及施工方法

内容：1.现场从 7.2-7.11 测量放桩位点全部完成，12 日至今无施工，期间因下雨、草势疯长，许多之前所放的桩位标记被冲毁、掩盖。要求总包方抓紧督促管桩进场及施工，以免二次放点；

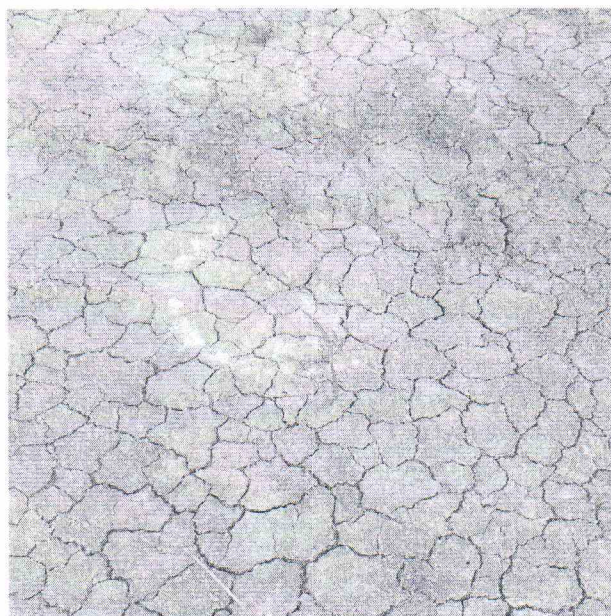

- 2.现场施工时所用的图纸必须是由设计院加盖出图章的蓝图；
- 3.要求设计方尽快确定主变位置及主变基础施工方法并出具施工蓝图；

项目监理机构 (章)：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：



填报说明：

本表一式____份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。
