

监理工作联系单

工程名称:禹州市花石二期80MWp光伏发电项目

编号:CZZHJL-YZHS-33

致:河南众志施工项目部

事由:安全、文明、质量施工相关事宜

内容:近日,我监理组人员在巡视施工现场,对你方施工区域进行了全面的检查发现以下问题:

1、组件安装完成后的包装箱及托盘未能及时的清理现场,由于天气的炎热和干燥未避免施工人员在现场吸烟造成火灾,现要求你方尽快处理;

2、在监理列会上和我方监理人员在现场多次口头说明,上下班施工人员严禁乘坐铲车和施工作业时禁止乘坐施工机械来回穿梭;

3、接地焊接时,我监理人员发现对已完成后的工序未能按照设计要求和规范进行作业(如:焊渣未能及时清理、防锈防腐未能做到位)就进行下一道工序;

4、组与组之间的电缆套管必须进行绑扎,目前已通电区域要求你方组织专业人员进行绑扎,避免电缆磨损时引发安全事故。

附:图片第二页


监理单位(章):

总/专业监理工程师

日

期:2016年8月5日

注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部 1 份。

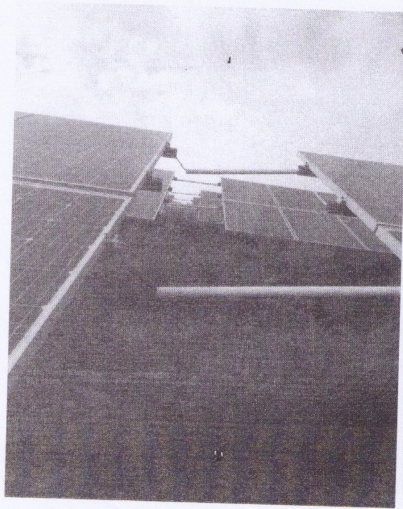

电缆套管脱落未绑扎禁锢



工人乘坐铲车进行作业



接地焊接不规范



包装箱、托盘未清理现场
