

监理工作联系单

工程名称：郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-07

致：东风设计研究院有限公司项目经理部（总包单位）

主题：关于加强强台风对光伏电站影响预控事宜

内容：


根据 2017 年 3 月 1 日江苏省内出现强对流天气引起的强台风现象，已造成多地光伏电站破损，为了防止该现象在本工程发生，现提醒你单位加强施工质量控制，并做好以下检查：

1、对已安装完成的光伏组件及在建项目进行全面检查，其中包括螺丝的紧固件、扣件的调整，对有损坏的扣件立即予以更换。有条件的话，可以用双股 2 平方毫米的铁丝将处于迎风面的串列组件进行捆绑固定。

2、可以对光伏支架加装紧固防风拉杆，以防支架随风扭动；将串列两侧凿开过岩的地锚进行夯实处理；紧固全场所有螺栓；

3、加强对组件、支架的巡回检查力度，一旦发现松动的组件和支架，及时进行固定处理。

4、其他未详事项望你单位自查自纠处理。

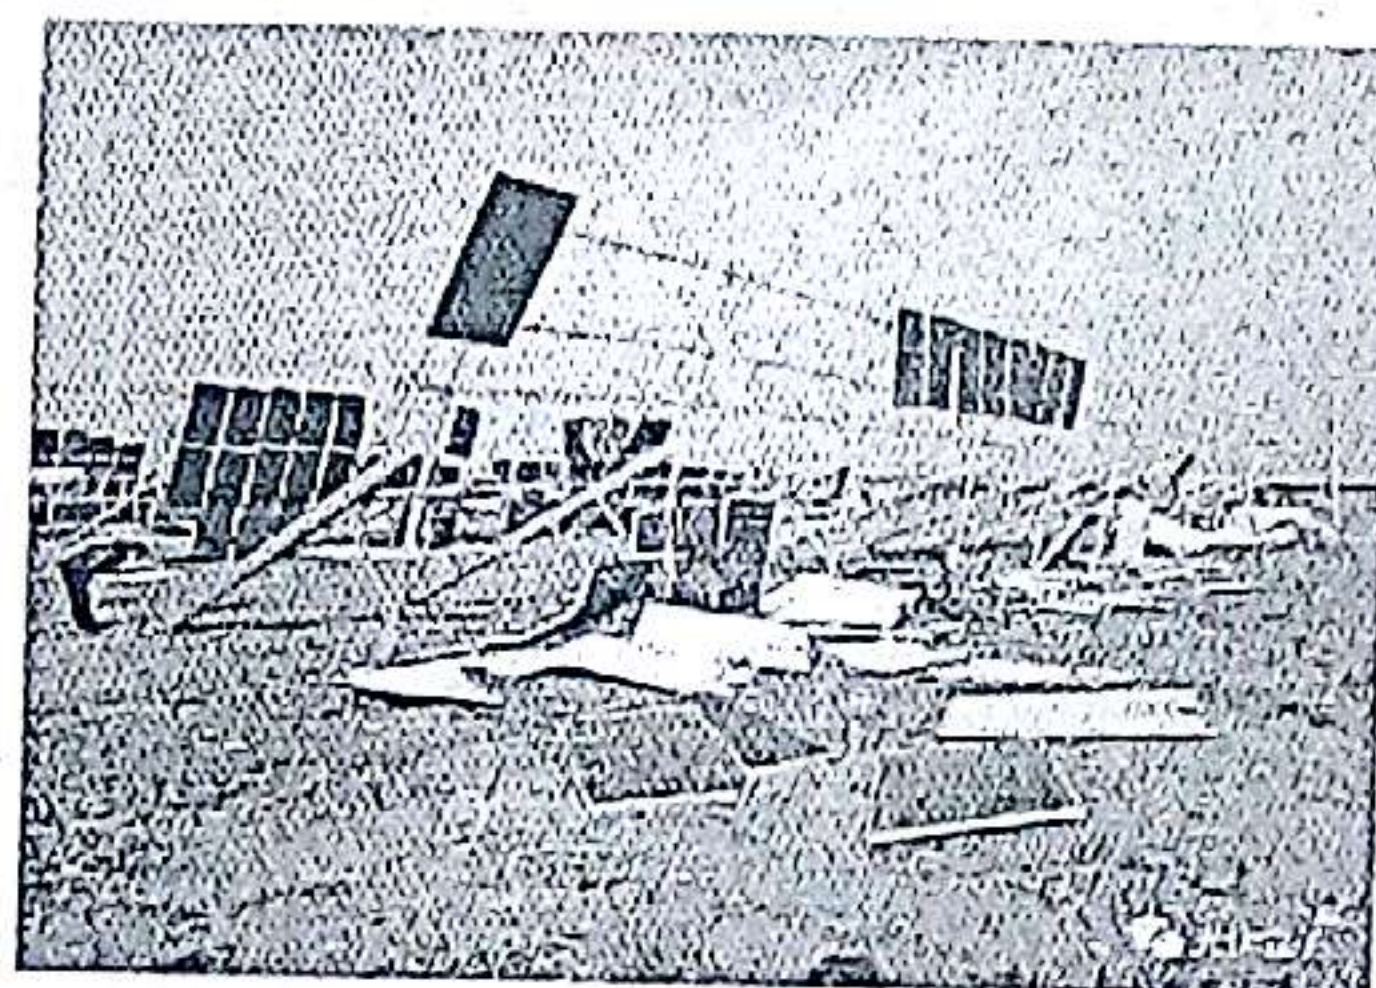

由于 3 月 1 日强台风造成损失图片以警示（图片非本工程）

附件：无

抄送：苏州天穗新能源科技有限公司（建设单位）

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

李松波

日

期：2017.3.2

本表(含附件)一式三份，由监理项目部填写，接收单位存一份，监理项目部存一份，业主单位留存一份。
