

# 监理工作联系单

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 100 兆瓦光伏发电项目


编号：JXM6—030

致：江苏华能建设工程集团有限公司施工项目部

事由：关于施工现场安全文明施工的相关问题



内容：

目前，为了保质保量的按期并网，各方都在紧张的施工，现场施工管理出现了松懈麻痹的现象。五月四日，由于引孔施工区域靠近已安装完成的组件，引孔飞溅物造成组件玻璃破碎损坏；五月五日，运输车辆不慎碰到已经安装完成的支架、组件，导致支架檩条变形，组件破损。现场安全施工、文明施工没有认真落实。为此，要求你施工项目部针对以上问题，及时进行现场安全文明施工的彻底整顿。由于后期的补缺施工量大，引孔施工区域会经常靠近安装完成的组件及电气设备，务必做好相应的保护、遮挡措施。同时，对引孔位置要进行认真核查，保证下方没有已敷设完成的电缆，严防引孔时导致已埋电缆的损坏。对施工人员，特别是施工车辆驾驶人员，加强安全文明施工的教育，强化安全意识，确保安全生产、文明施工。

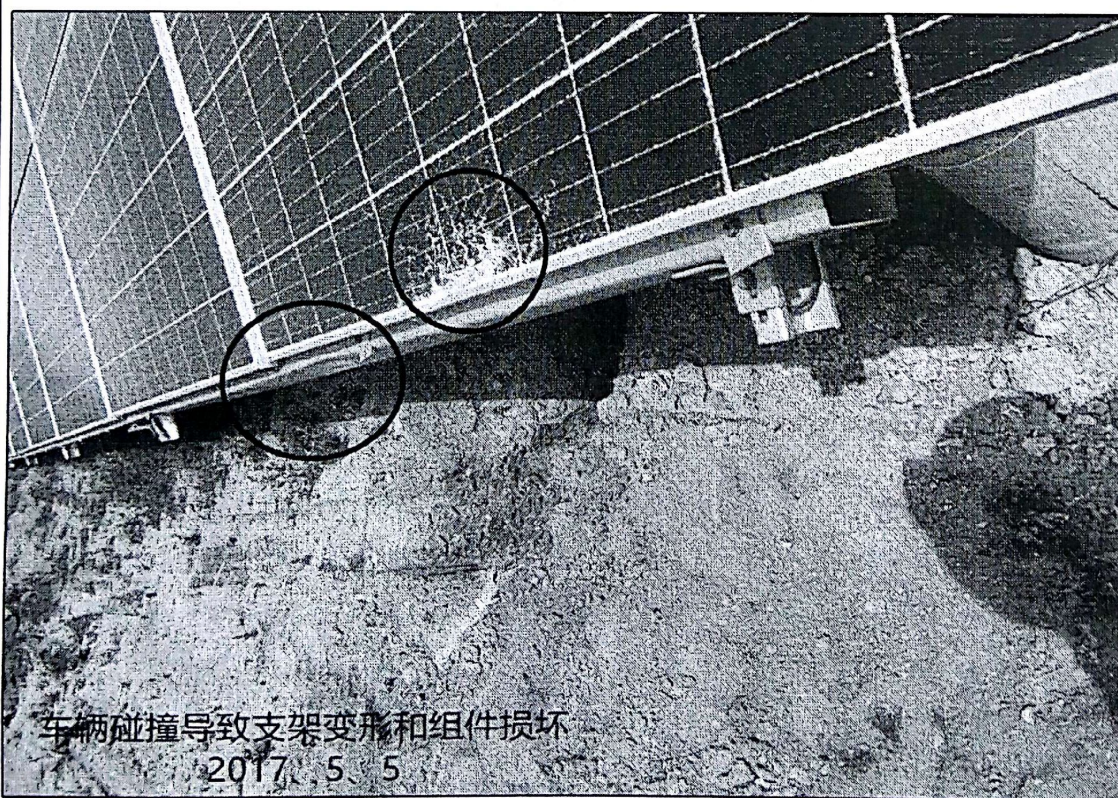

车辆碰撞导致支架变形和组件损坏

2017.5.5

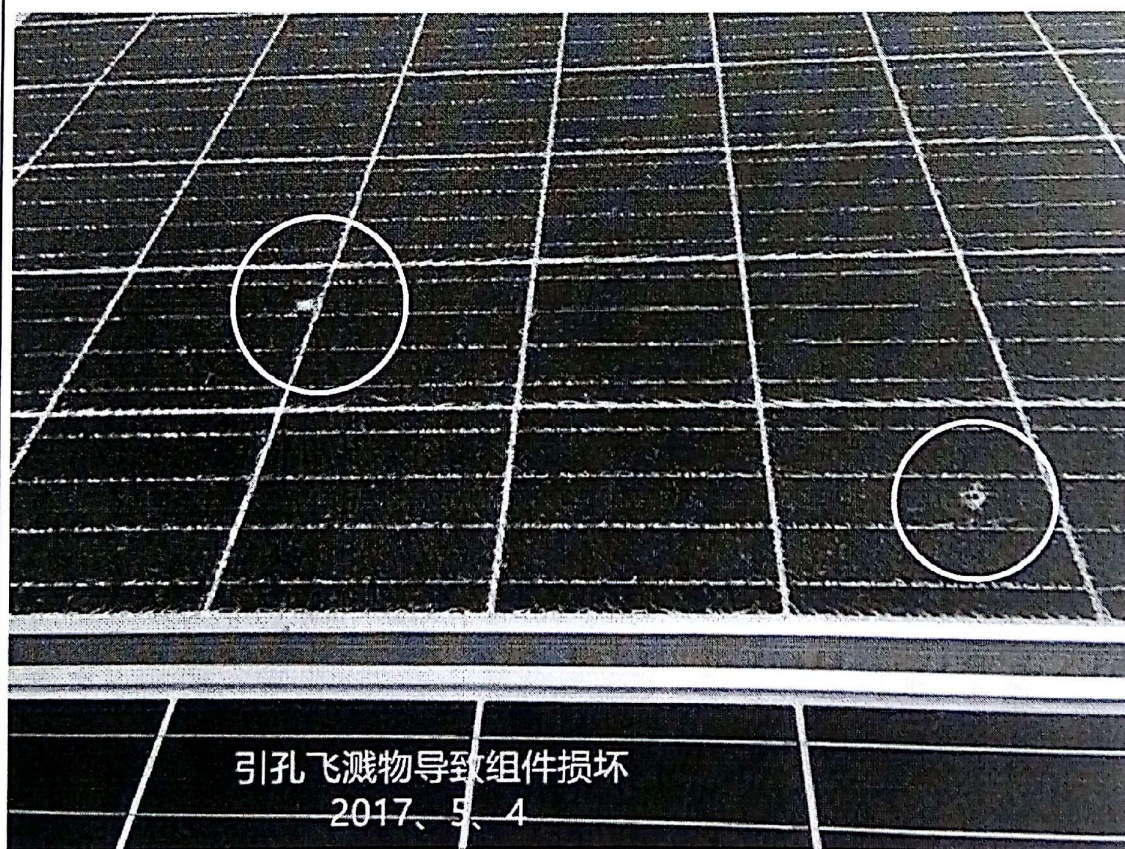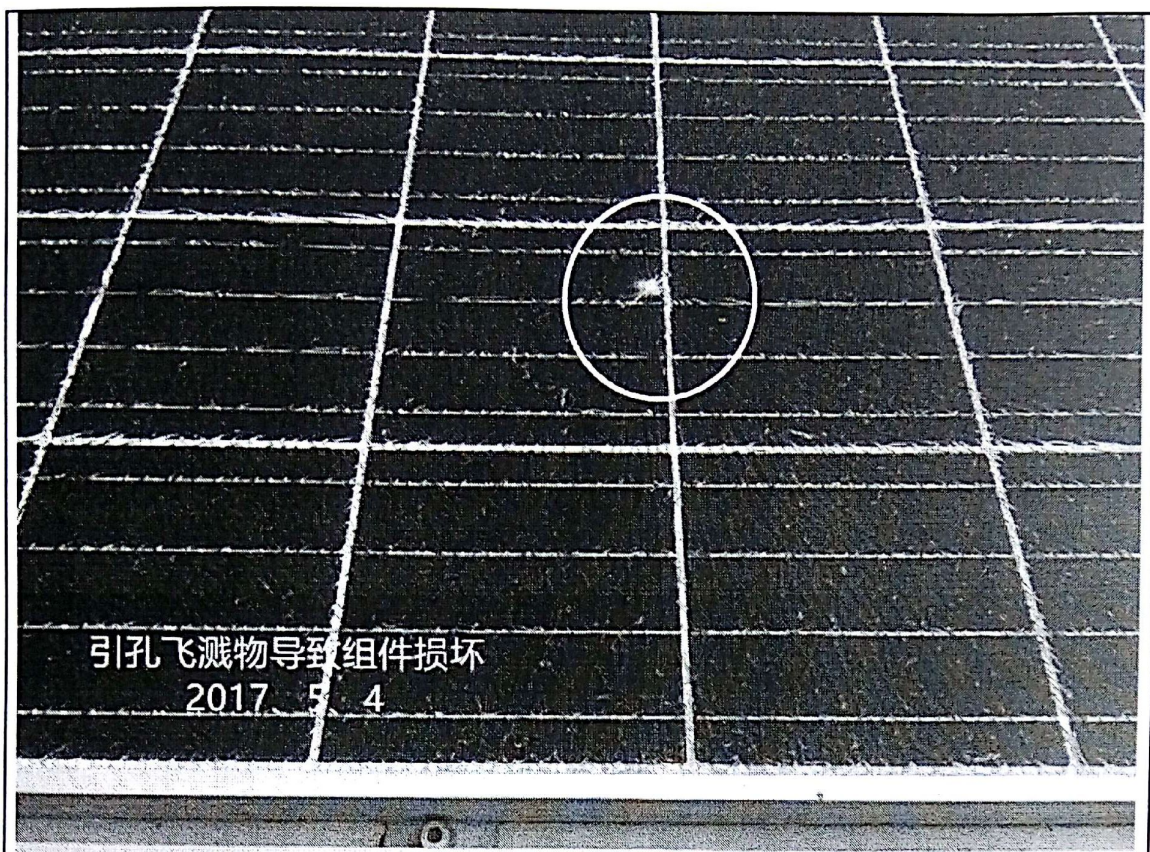

引孔飞溅物导致组件损坏  
2017、5、4



监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日

期：2017年5月6日



注 本表一式\_\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存\_\_份。
