

监理工作联系单

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目


编号：JXM6—014

致：江苏华能建设工程集团有限公司施工项目部


事由：光伏区支架、组件安装造成桩基断裂事由

内容：

光伏区支架、组件安装过程中，发现部分支架在桩基浇筑后，尚未达到一定强度的情况下，就已开始施工，导致桩基断裂，在明知桩基断裂的情况下，现场施工人员不但没有及时进行整改，反而仍继续进行组件安装，给后期整改造成极大不便，现场监理人员多次提醒，仍置之不理，我行我素。现要求你项目部必须在保证桩基基础不受损坏的前提下，再进行支架、组件等相关施工，并及时对损坏的桩基进行修复，你施工项目部应及时进行跟踪，监理项目部将对修复的桩基进行确认。

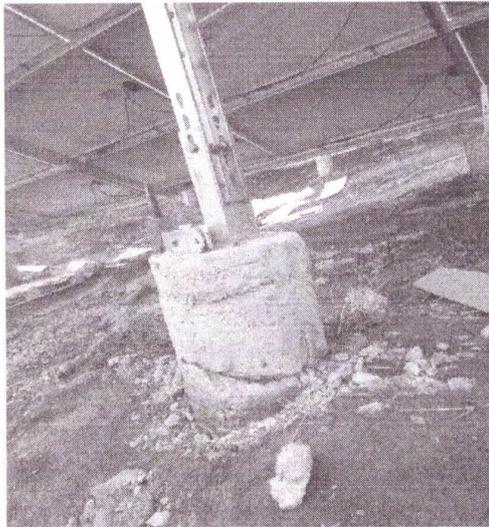

断裂的桩基基础

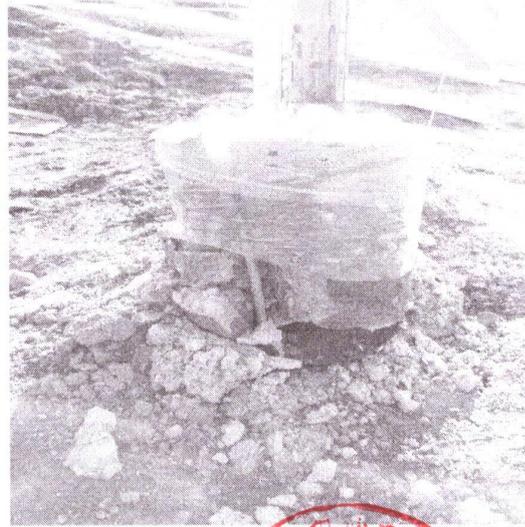

断裂的桩基基础

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李强军

日

期：2018年12月20日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。
