

监理工作联系单

工程名称: 常州蠡河置业发展有限公司武进经发区民营工业园 2.42MW 光伏发电项目 编号: ZHJL-LXD02

致: 南京紫泉电力设计咨询有限公司 (EPC 单位)、泰州敬道电力工程有限公司 (施工单位)

事由: 现场施工现场存在质量问题及报验工程资料存在的问题等事项

内容:

一、2016 年 10 月 27 日星期四,我监理项目部在现场巡视检查过程中发现诸多不合规之处,存在如下问题:

- 1、屋顶损坏的透气管未进行修复或进行有效防护,连续降雨会使雨水灌入其中,严重会造成屋顶渗水。
- 2、施工现场残留施工垃圾遍地,E 栋部分虹吸口已经堵塞!护角等杂物要及时清理。
- 3、E 栋屋顶组件存放不合规,组件背板积水使组件浸泡在雨水当中,更有个别接线端子也浸泡在水中!
- 4、E 栋水泥预制块倒扣在屋顶防水压缝带上,钢制水泥预埋件刺破压缝带。
- 5、屋顶压缝带应加以保护,搬运小车在经过时要仔细,避免对其造成损伤。
- 6、支架角度调节垫片已经到货,请按图施工,确保支架在最佳设计角度。
- 7、屋面组件及支架材料要分散堆放,D 栋已吊装材料堆放过于密集应立即分散开。
- 8、浇筑混凝土预制块时,地面残留的混凝土等材料要及时清除。

二、上报我监理项目部资料存在的问题:

- 1、吊装车辆行驶安全检验合格证不清晰,无法确定是否过期。
- 2、施工组织设计时间存在问题;封面与内容的项目名称不统一;计划表、施工总平面图、临时用地表空白!
- 3、特种作业人员操作证复印件、文案类文件封面要加盖项目章。
- 4、应急预案应添加联系人电话。
- 5、SAQB2-001 安全管理及风险控制方案、质量通病防治方案请按项目实际情况编写,不存在事项精简去除。
- 6、上下级关系搞清楚,交底与被交底人员明确!
- 7、上屋爬梯方案项目名称及时间与项目有出入请重新提供。
- 8、材料报验要加名称、封面!分材料报,一种材料一份报验单。

抄送: 常州市弘和电力科技有限公司 (建设单位)


监理项目部 (章)


总/专业监理工程师: 

日期: 2016 年 10 月 27 日

注本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存三份。

附图:

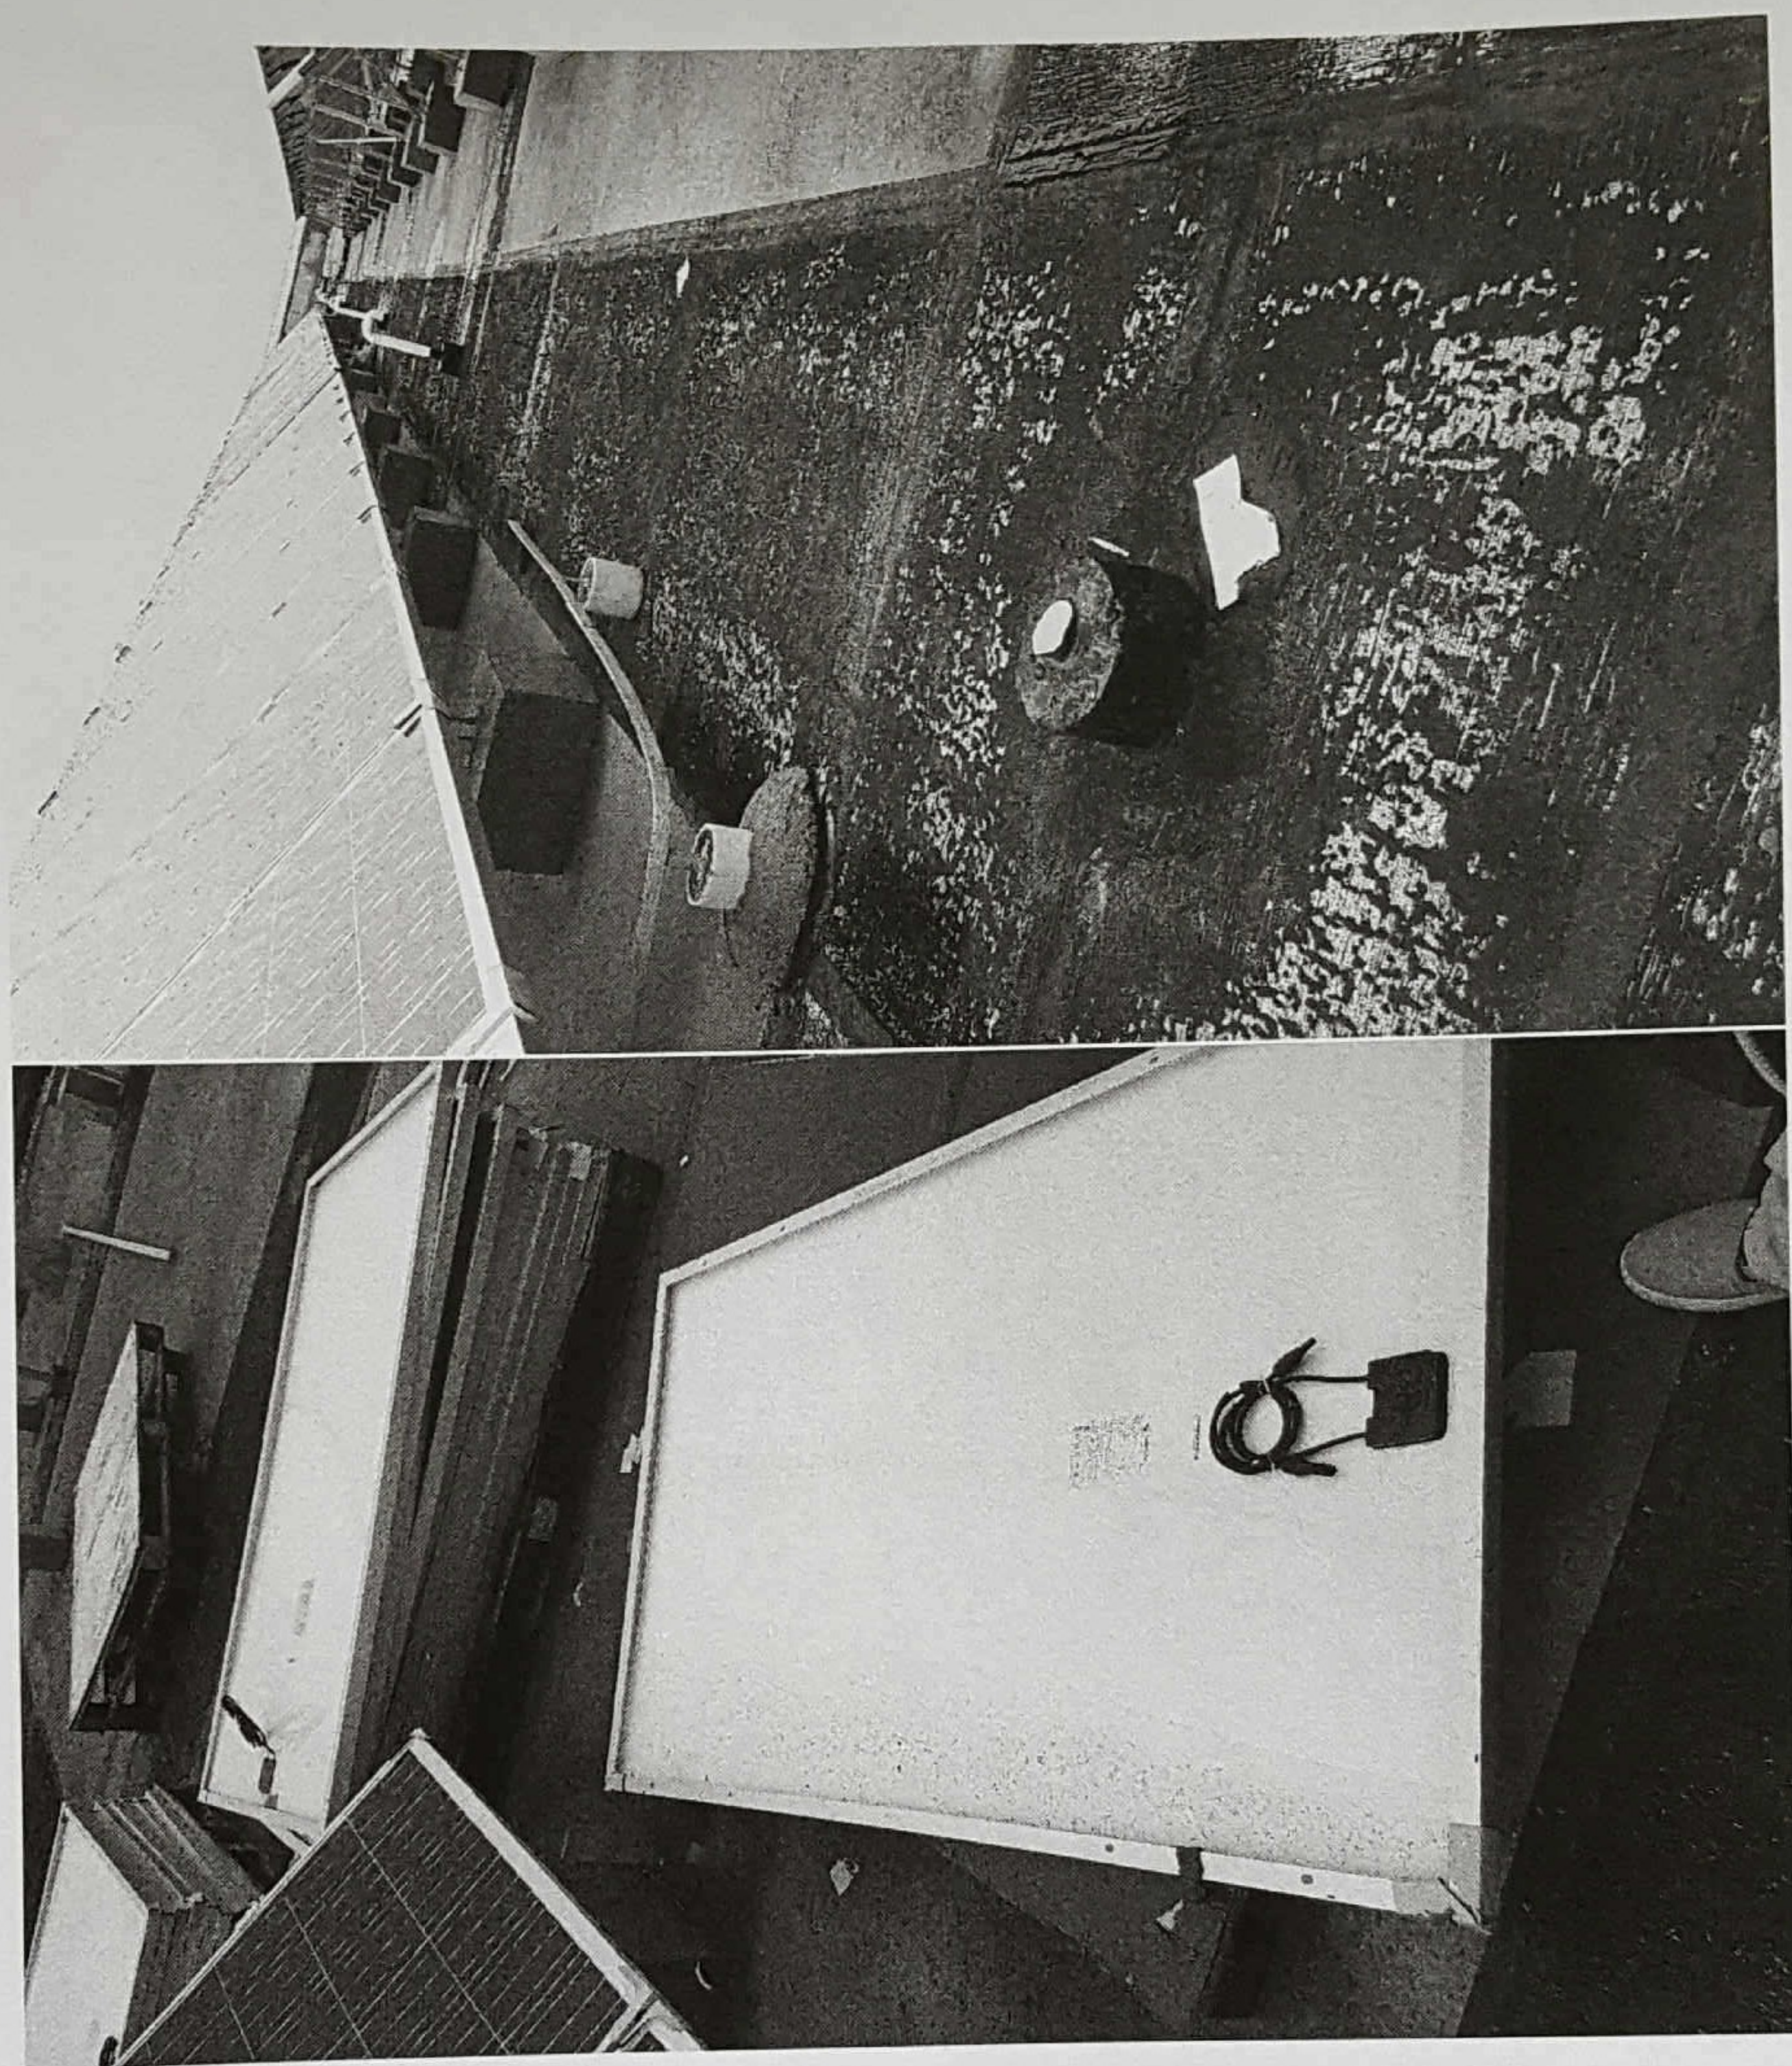

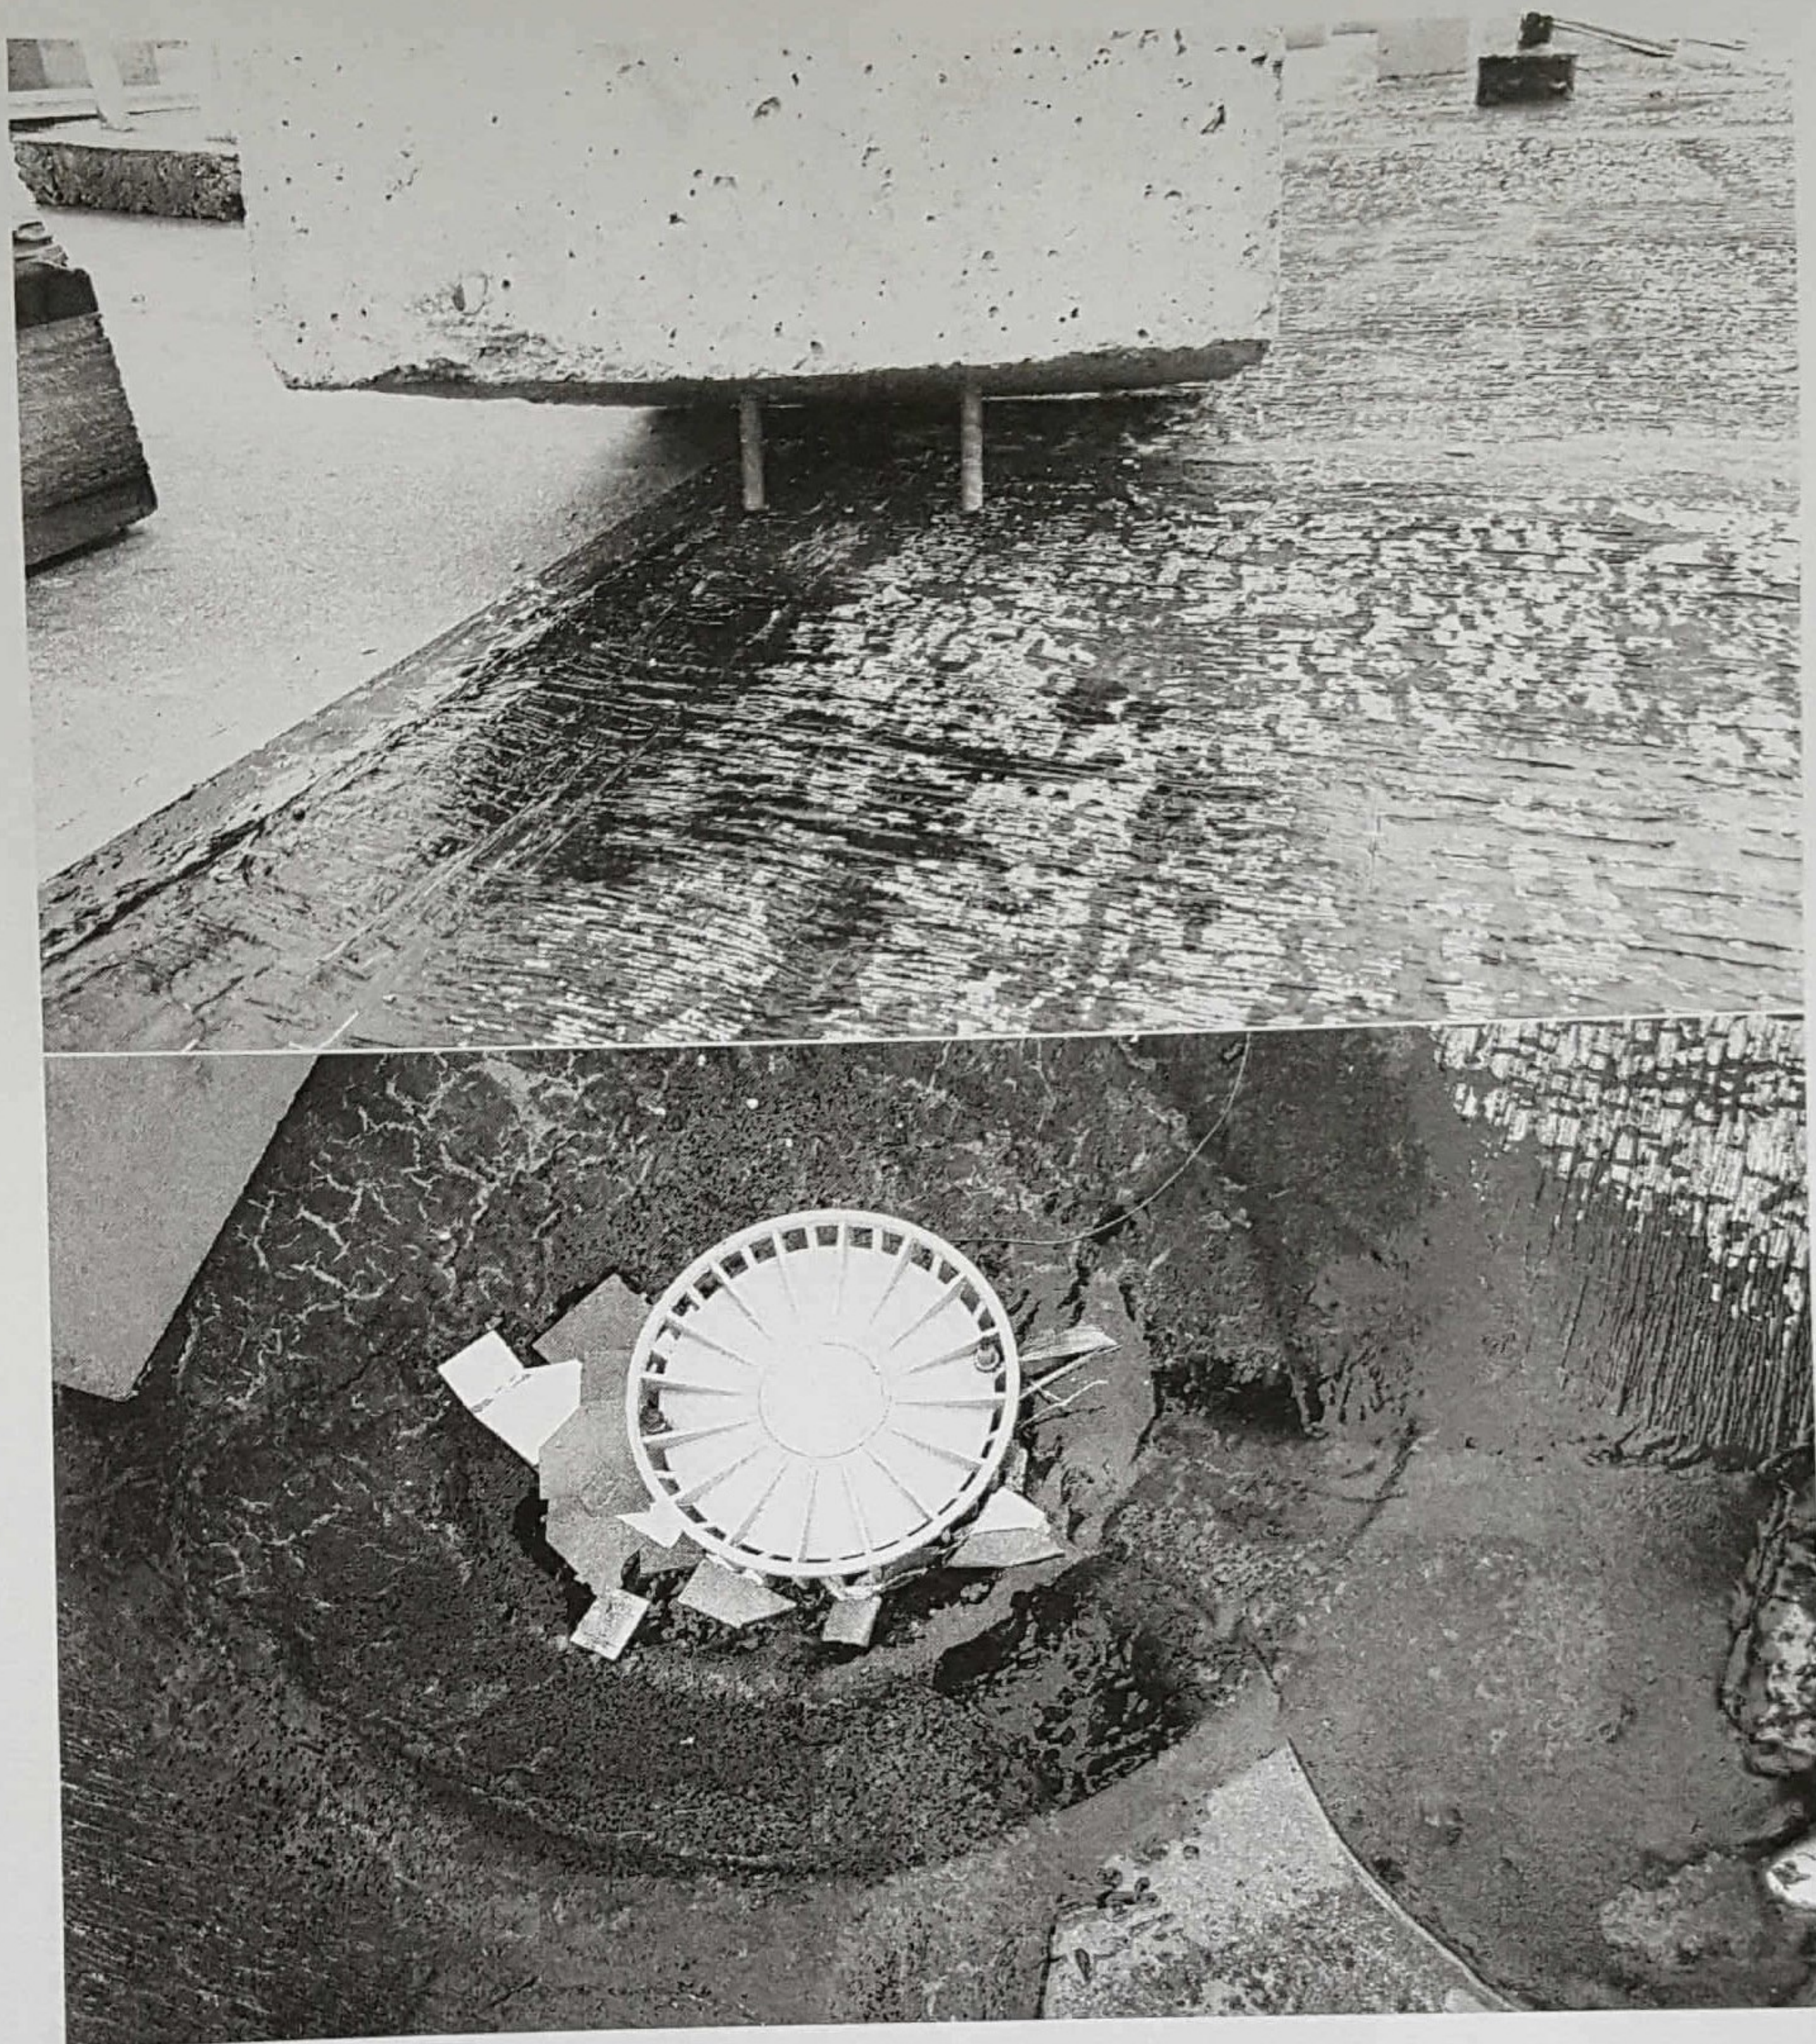

-----以下无正文-----
