

表 B.1 监理工作联系单

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: CZZH-LXD-045

致: 深圳蓝波绿建集团股份有限公司吴兴妙西项目部

主题: 关于光伏区施工时存在质量问题的事宜

内容:

- 1、5#光伏区安装完成的电缆桥架及盖板存在返锈的现象, 要求你施工单位必须及时进行防腐处理, 返锈严重的必须更换;
- 2、10月05日浇筑完成的支架基础, 模板拆除后部分混凝土外观质量不合格, 出现了蜂窝、麻面、烂根、异形等现象, 要求你施工单位立即整改;
- 3、光伏区焊接完成的接地扁钢, 没有刷防腐漆就直接回填, 要求你施工单位立即整改, 把所有接地扁钢彻底做完防腐, 报监理项目部验收合格后, 方可回填;
- 4、光伏支架在现场随意堆放, 已被回填土掩埋, 要求你施工单位及时清理, 由专业人员负责管理以免材料丢失, 影响光伏区施工进度;
- 5、光伏区已经安装完成的支架, 部分立柱安装的不垂直, 而且每组支架的剪刀支撑没有及时安装到位, 要求你施工单位立即整改;
- 6、5#光伏区有部分组件、支架立柱被做检修道路的挖机损坏, 要求你施工单位及时更换, 同时做好成品保护的工作;
- 7、要求你施工单位在浇筑开关站道路时, 预留好同条件试块, 达到强度后送检, 所用水泥、沙子、石子等材料必须提供材质证明文件及合格证;
- 8、开关站的消防验收报告及站内消防设施至今没有提供, 要求你施工单位给业主一个合理的完美的解释。

以上问题我监理项目部多次要求施工单位整改, 但施工单位至今没有彻底整改, 如果出现安全、质量问题我监理项目部不负任何责任。


本单抄送建设单位 施工单位各一份, 监理留存一份。

项目监理机构 (章)

总监理工程师:

日期:



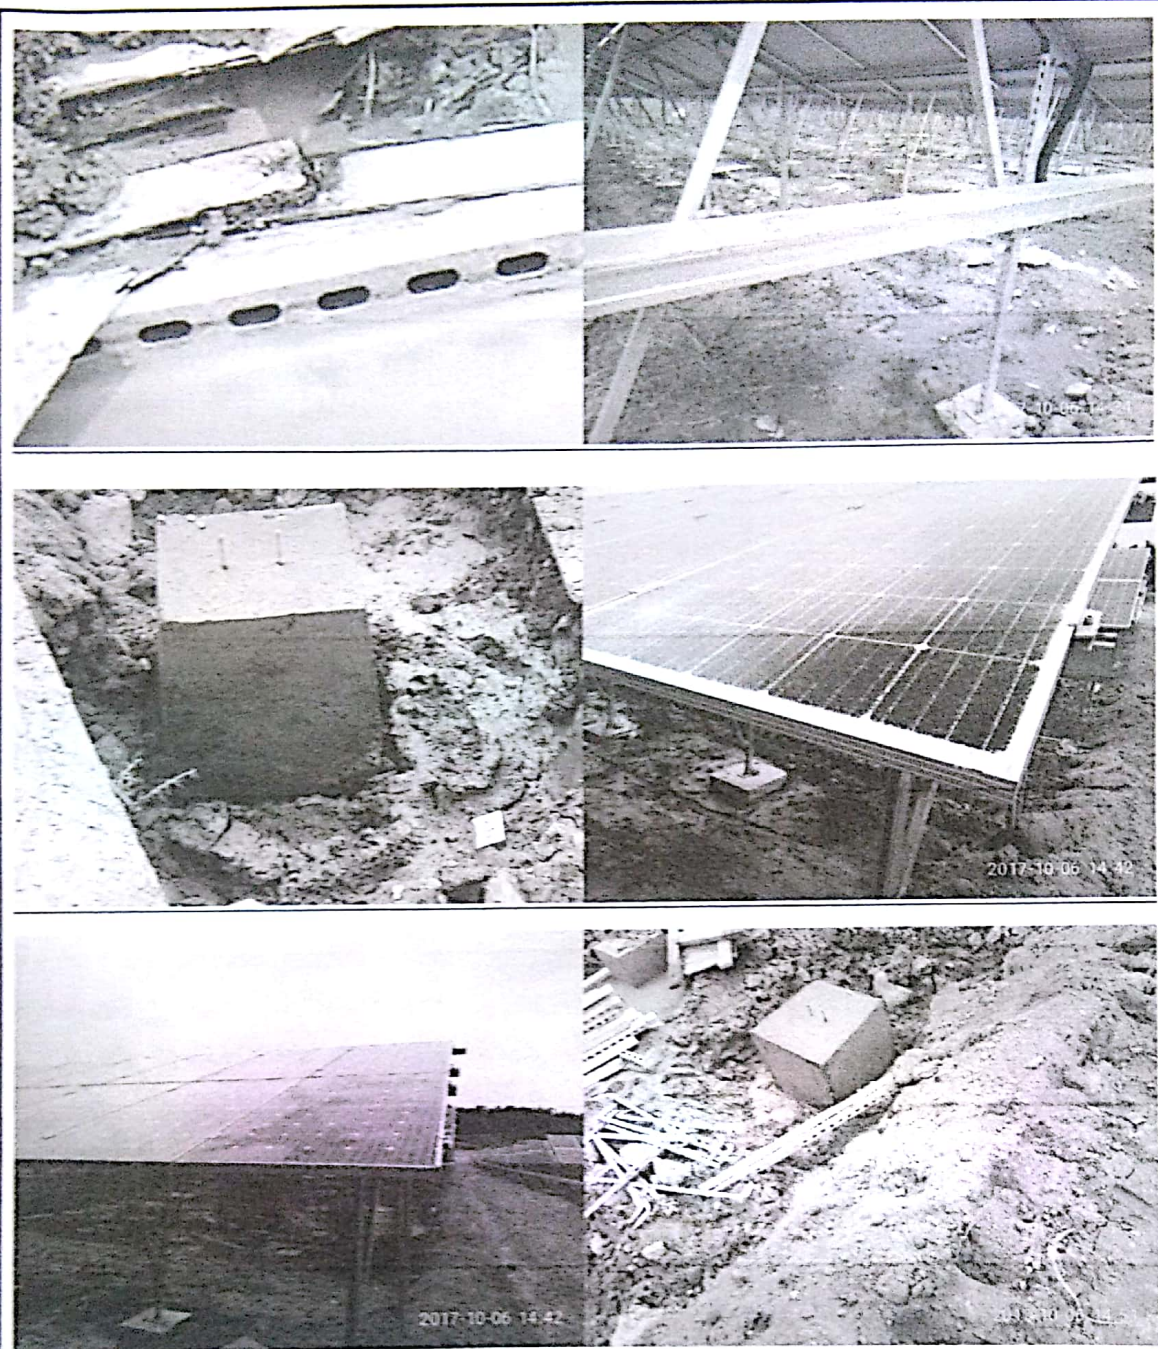

填报说明：本表一式 三 份，由项目监理单位填写，抄送相关单位。

