

监理工作联系单

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号：-012

主送：江西晶科能源工程有限公司施工项目部

抄送：嘉禾县晶科电力有限公司项目部


事由：关于工程施工质量事宜

内容：你单位已进入支架安装阶段，要求支架安装前浇桩必须经过三级自检合格后，再报监理检查合格方可进行支架安装。桩基浇桩要求如下：

- 1、浇桩施工完成后垂直度误差小于等于正负 2 度。
- 2、钢管中心与混凝土桩中心水平误差小于等于正负 5mm。
- 3、桩位水平误差正负 30mm。
- 4、桩径允许误差-10mm。



桩基不合格照片

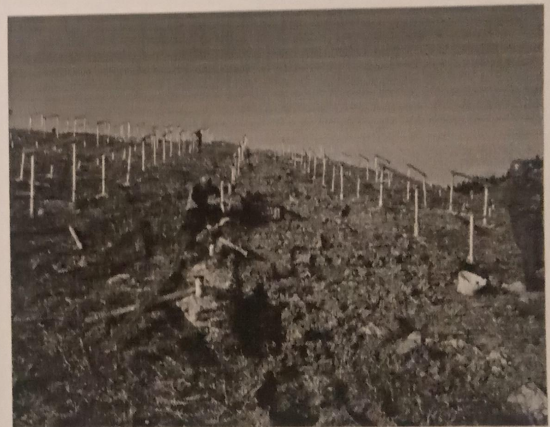

支架安装不合格照片

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2016 年 2 月 8 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。
