


# 工程联系单

编号: ZHJL—XST—004

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

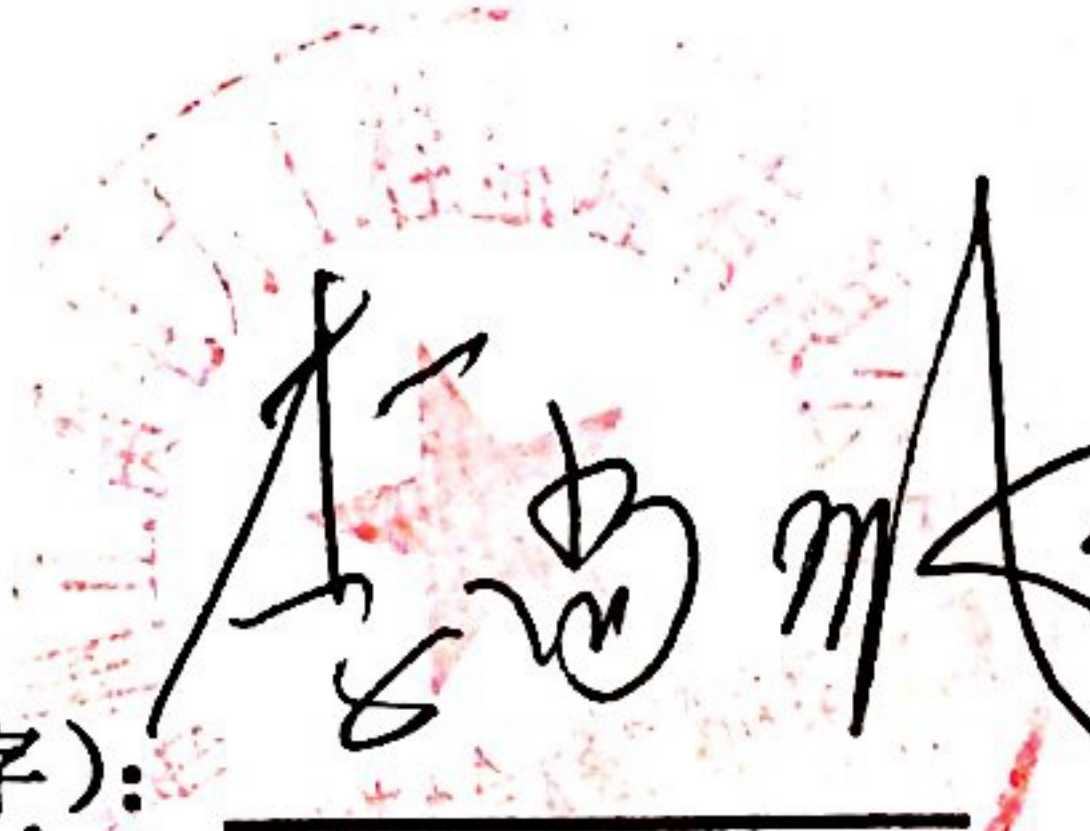
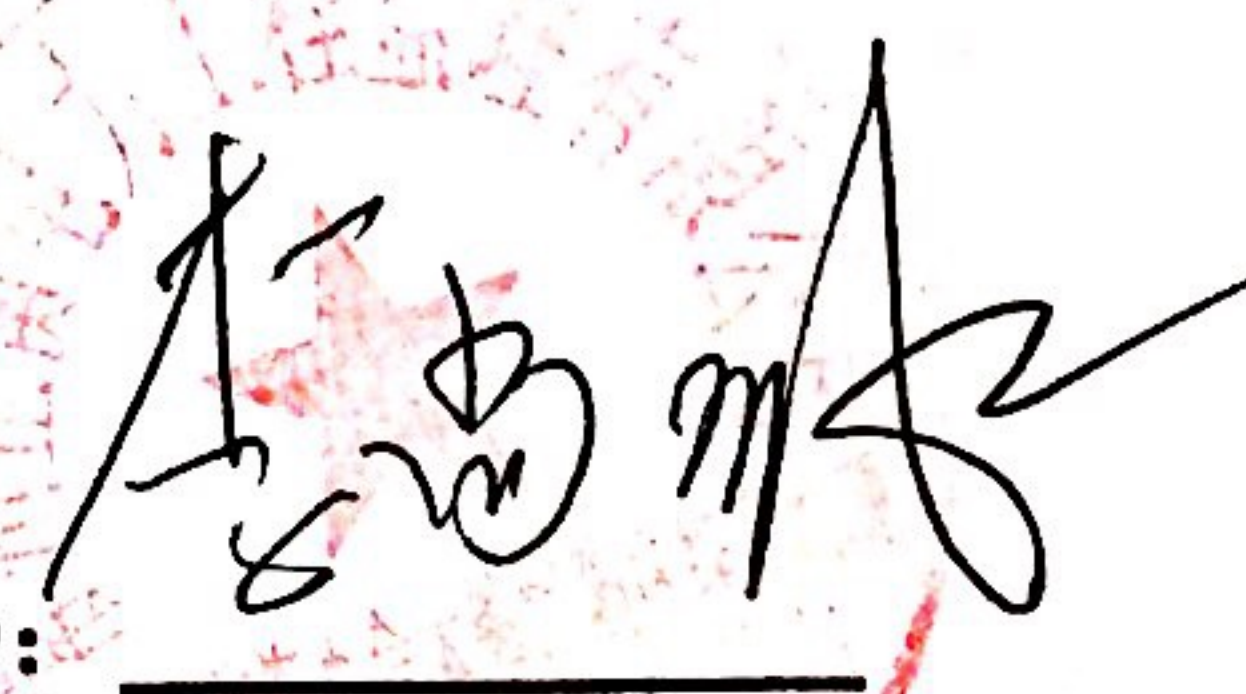
|    |                |          |                                                                                            |
|----|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事由 | 关于施工质量及安全的相关事宜 | 签收人姓名及时间 |  11.4.2 |
|----|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

致: 江苏华能建设集团有限公司

- 1、你单位在现场施工人员及管理人员, 未佩戴安全帽, 要求立即整改完成, 做好施工现场的安全文明施工。
- 2、开关站外墙保温施工, 保温钉密度不符合设计规范要求 (间隔太大), 要求立即整改按规范要求进行加密。
- 3、在天气温度较低的情况下, 全场土建施工及室内外装修施工后应做好夜间保温措施。
- 4、光伏方阵支架组件安装, 螺栓必须上紧上牢, 倾斜角度必须保证符合设计要求。
- 5、灌注桩浇筑完成后及时进行养护工作, 过养护期后方可进行后续施工。

发文单位 (章):

项目负责人 (签字):

  
  
2017 年 4 月 2 日

注: 1、本联系单分为建设单位工程联系单 (C.0.11)、项目监理单位工程联系单 (C.0.12)、施工单位工程联系单 (C.0.13)。

2、收文单位如有疑义, 应在自收到本联系单后 48 小时内书面提出。

3、本表发文与收文单位各一份。
