

监理工作联系单

工程名称：公布井光伏园区 P2 区 110KV 升压站建设工程

编号：GBJGF-B3-005

致：江苏盛邦装饰建筑有限公司


抄送：正信天航（陕西）电力科技有限公司

事由：关于 P2 外墙保温的问题

内容：

你单位在外墙保温施工中，所有门窗洞口及起始部位未做翻包加强网，洞口四周未设置加强 45 度玻纤网及保温板粘贴点砂浆不规范，现要求你方对以上问题立即整改。另在进入下一道工序施工前，必须向我监理部报验。如未进行报验，不经我单位同意擅自进入下道工序，所产生的一切后果由你单位承担。

附图集 10J121

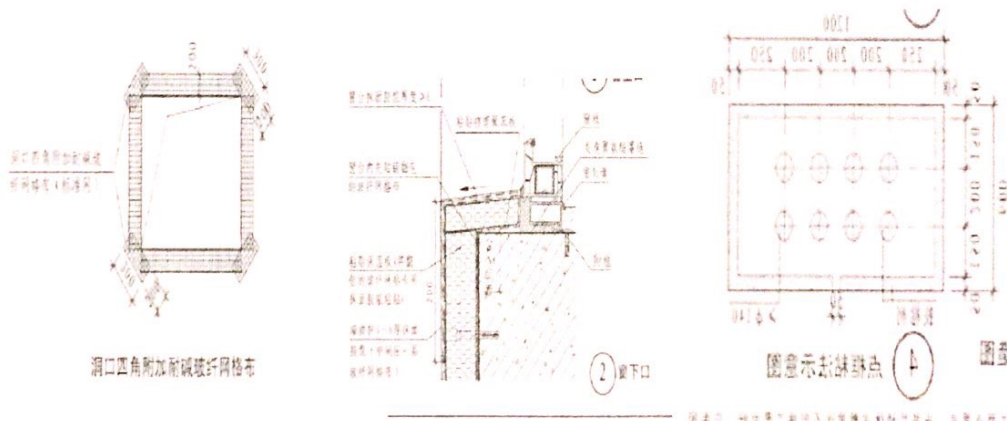

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王峰

日期：2017年4月27日

注 本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份
