



常州正衡电力工程监理有限公司

监理工作联系单

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-20171210-08

致：四川锦龙电力建设有限公司（施工单位）

主题：关于光伏区桥架、支架安装与质量相关事宜：

内容：我监理部对光伏区桥架和支架进行了全面检查，发现存在下列质量问题及隐患：

1. 因施工原因造成桥架安装固定不牢固，形成多处桥架承载后严重变形和损坏；
2. 检查发现，局部桥架安装不规范，出现倾斜，扭曲，横不平竖不直，存在严重的质量问题；
3. 现场发现，部分支架安装平整度成波浪状，严重影响后期组件安装及外观形象；
4. 现场多处支架斜拉筋脱落或未紧固到位，不符合图纸设计及规范要求；

现要求贵公司立即组织人员对光伏区全面检查，采取合理有效措施，确保在蓄水节点前，将以上问题按规范要求整改到位。

附图

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

2017年12月10日


本表(含附件)一式三份，由监理项目部填写，接收单位存一份，监理项目部存一份，业主单位留存一份。

数据 讲话

专业 解答




常州正衡电力工程监理有限公司

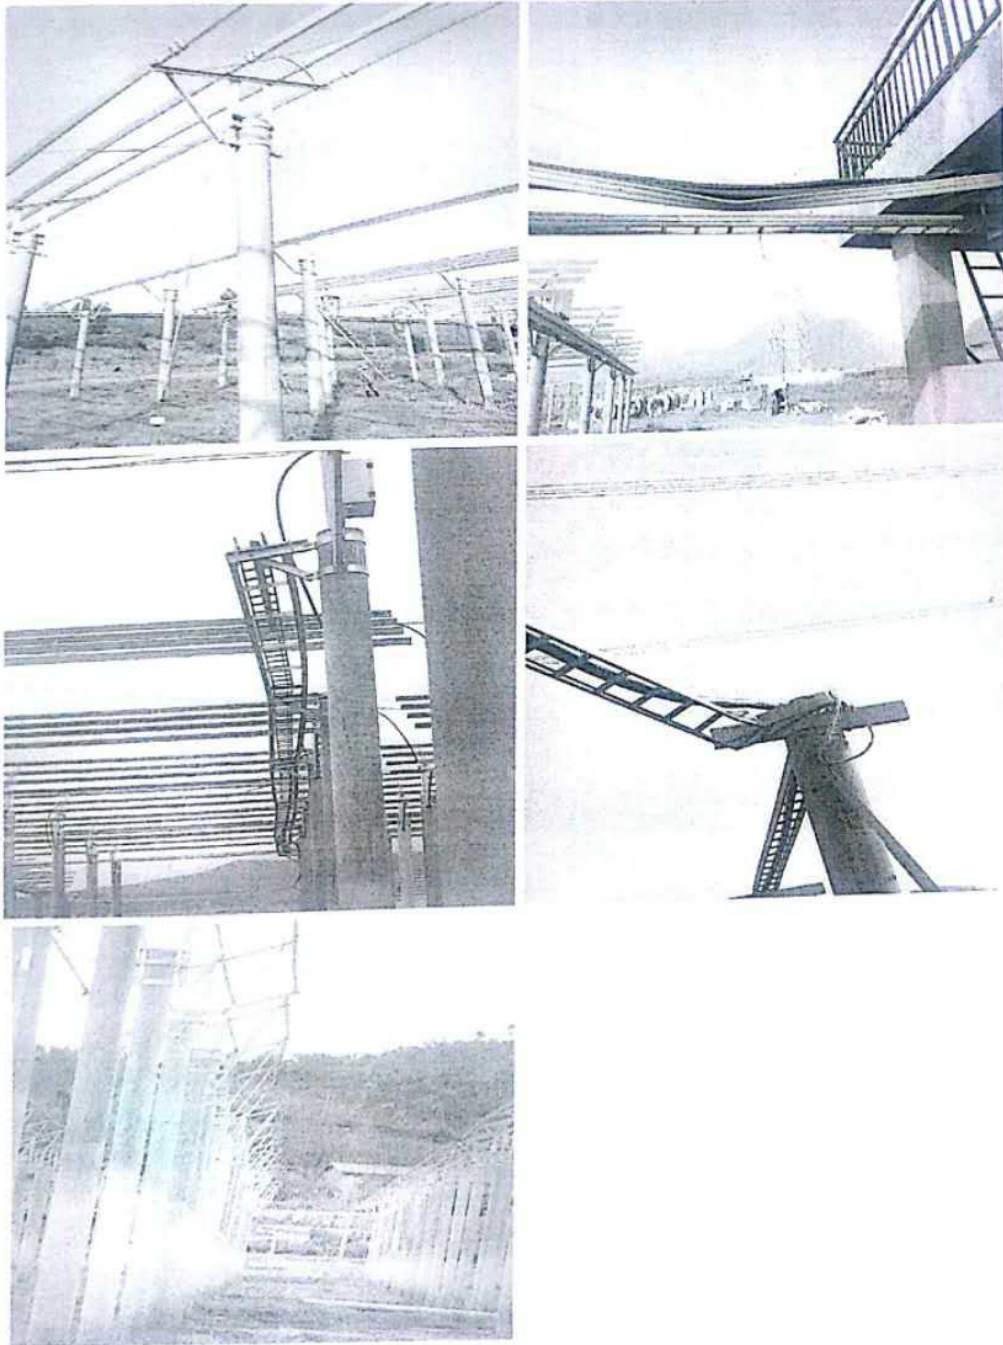


数据 讲话

专业 解答


柱钢筋搭接使用点焊不符合规范要求

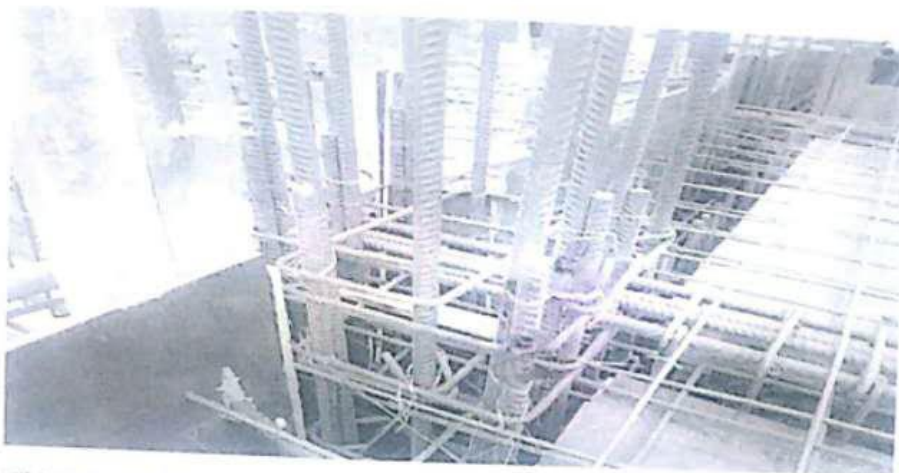


顶部面筋搭接长度不符合规范要求

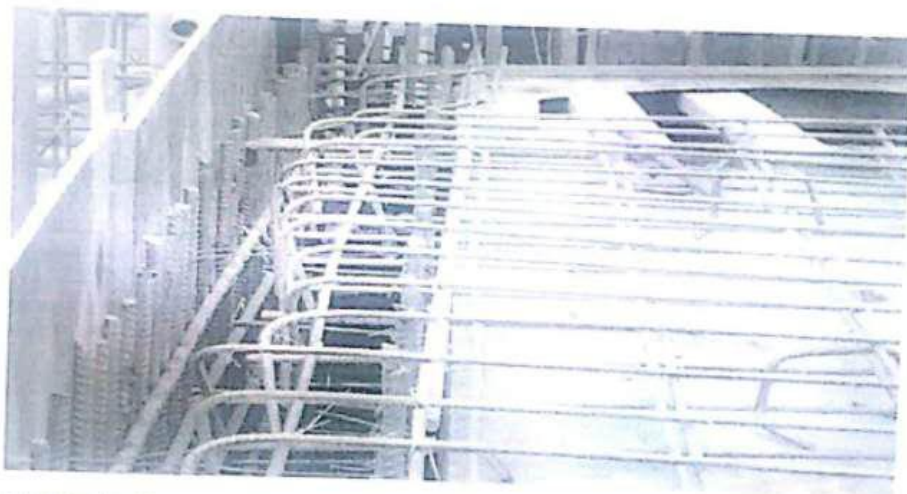

侧墙竖钢筋尺寸不够、无弯钩锚固

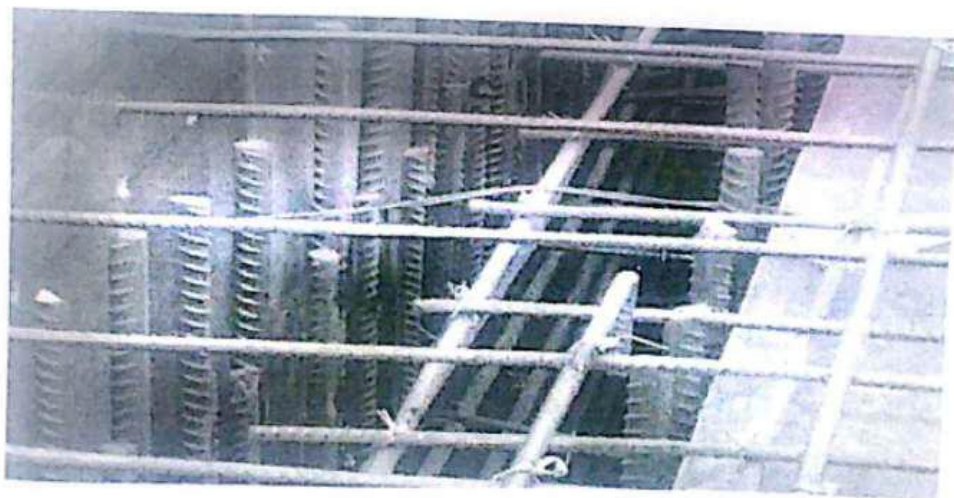

顶部面筋缺少横向钢筋

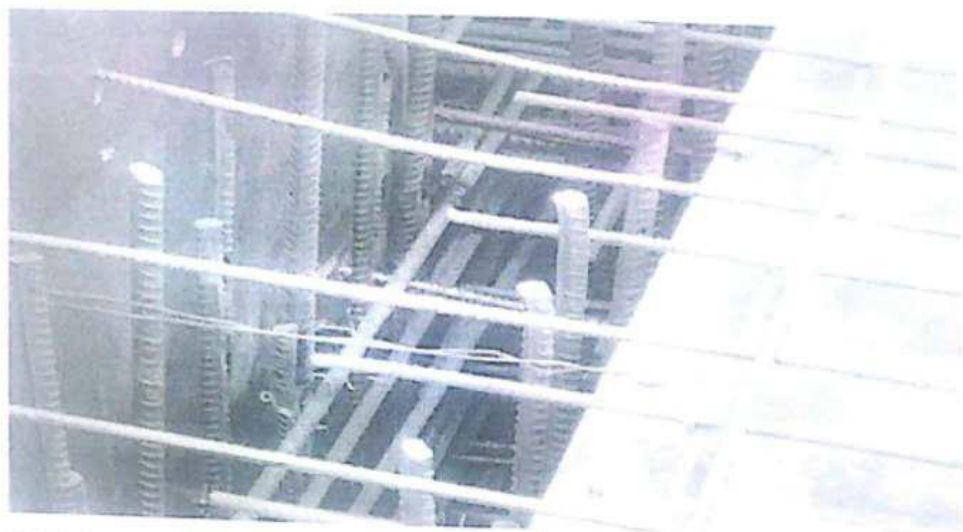

模板未固定牢固



模板安装缝隙过大

