



常州正衡电力工程监理有限公司

## 监理工作联系单

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWP 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-20180128-14

致：四川锦龙电力建设有限公司

主题：关于管理区安全文明施工及成品保护的相关事宜：

内容：经业主及监理现场巡视发现管理区临时用电极不规范，存在严重的人员触电隐患；多数施工人员包括现场管理人员未佩戴安全帽，现场安全施工得不到有效保障；光伏区进入升压站处高压电缆被石头或其他硬物覆盖，电缆外绝缘层得不到有效的保护；鉴于上述情况要求如下：

1. 要求贵公司立即组织人员，按规范要求合理布置临时用电，所用配电箱安装必须符合规范要求，安装位置要远离人员活动区（特别是附近村庄儿童），配电箱必须完好无损，要严格实行“一机一闸一漏保”，漏保动作应正确可靠，不得一闸多接或设置分路开关，断路器上应贴有标牌、标签指示负载名称，不得使用裸露电缆线及护套线，配电箱及所有负载金属外壳必须有可靠接地，必须确保施工用电安全；
2. 要求贵公司加强对施工现场的文明施工管理及员工的安全教育，凡进入施工现场必须按规范要求正确佩戴安全帽；
3. 要求贵公司立即安排人员，将被掩埋的高压电缆清理出来，并采取设置围栏等有效措施进行保护；

附图 片4张

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：李东君

日 期：2018年01月25日

数据 讲话

专业 解答



常州正衡电力工程监理有限公司

本表(含附件)一式三份,由监理项目部填写,接收单位存一份,监理项目部存一份,

业主单位留存一份

临时用电现场照片






常州正衡电力工程监理有限公司

施工未佩戴安全帽



高压电缆被掩埋

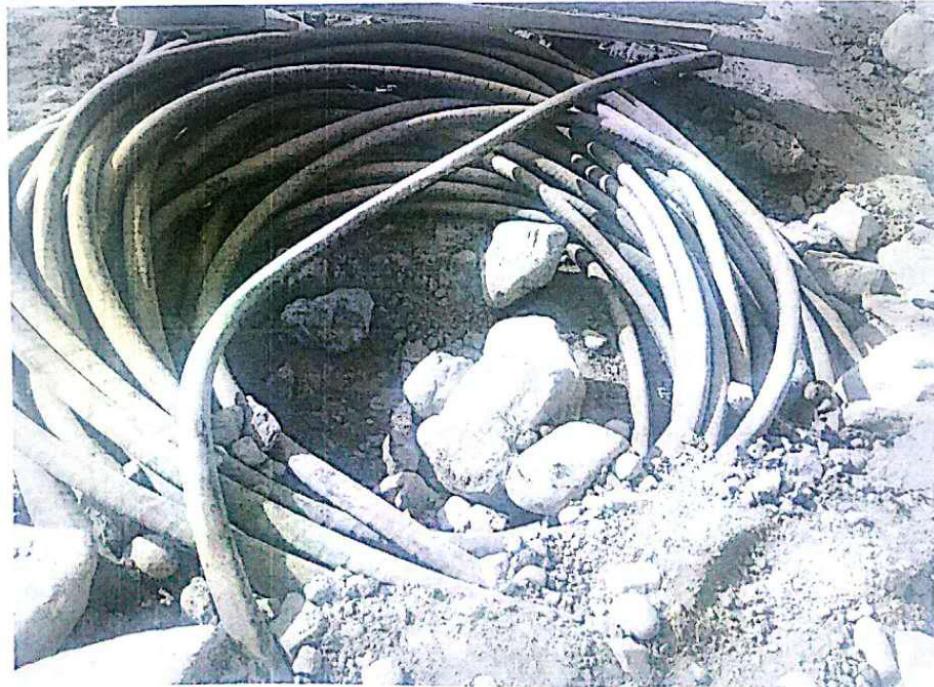

数据 讲话

专业 解答

