

# 监理工作联系单

工程名称：浙江奔多实业有限公司 4.8MW 屋顶光伏发电项目

编号：BDGD-ZHJL-LX-20161220


致：中设无锡机械设备工程有限公司

事由：关于电缆堆放及外线施工事宜

内容：

奔多 4.8MW 屋面光伏发电项目现光伏电缆已累计到场 34000 米，低压电缆已全部到场，但外线顶管施工和桥架迟迟未有任何施工进度，导致现场电缆堆放凌乱，无人看管。请贵方把已到货的电缆有序的堆放至开阔地段，保障厂区内部道路通畅，并加快外线施工的进度，顶管方案如存在困难，需尽快给出较好的施工方案并进行施工，确保不会因此而延误工期。


致此。

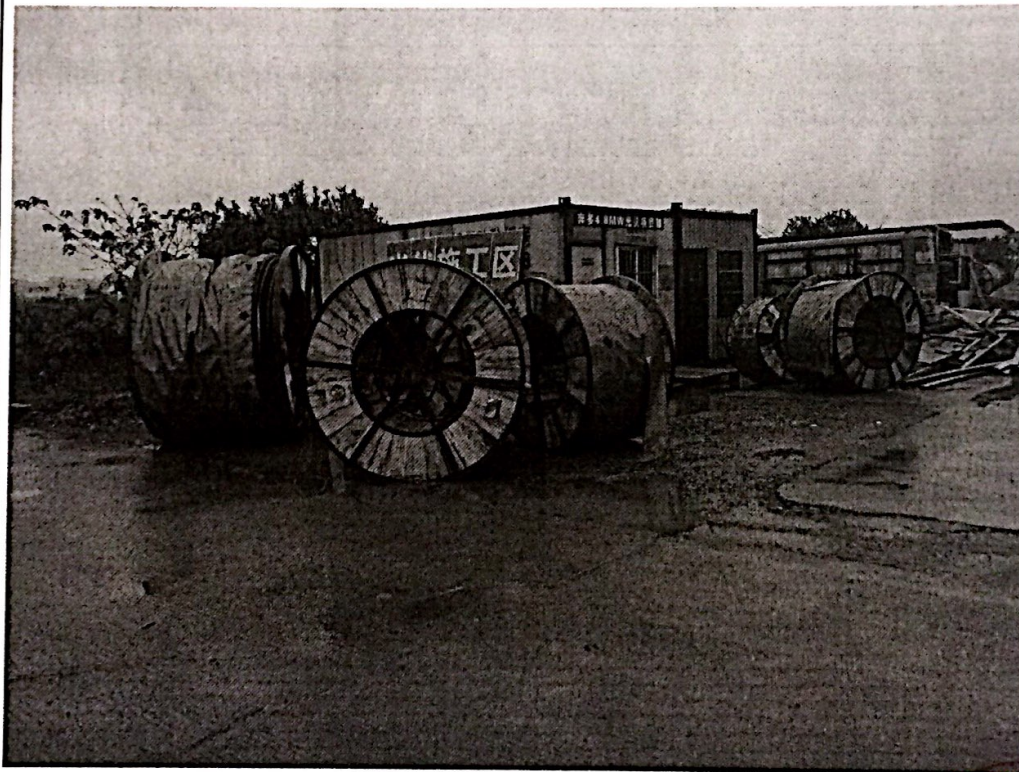

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2016 年 12 月 20 日



本表一式 肆 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。



由 扫描全能王 扫描创建
