

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 临漳戴克电器 11MWp 屋顶分部式光伏发电项目

编号: LZDK-ZHJL-005

致: 中微机电科技股份有限公司戴克项目部:

事由: 关于组件安装前的屋面保护及防漏的相关问题

内容:

经监理现场巡视发现, 你单位在施工过程中, 对厂区屋面的环境卫生不够重视, 影响整体观感。希望贵单位重视施工环境保护, 支架安装控制胶量; 组件安装前及时清理施工现场杂物, 特别是金属制品; 排查屋面彩钢瓦的破损及错位, 及时修复, 修复完成后才能进行组件安装作业, 避免后期因屋面破坏导致屋面漏水引发纠纷。

(附图第 2 页)

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: _____

日 期:



注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部 1 份。




戴克B区屋面
2016-12-09



戴克B区屋面
2016-12-09



戴克B区屋面
2016-12-09

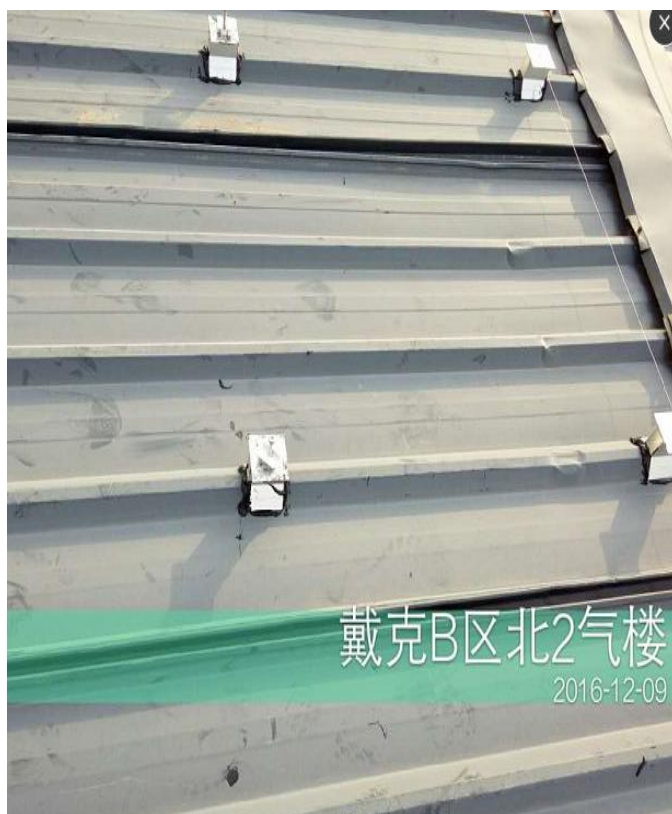

戴克B区北2气楼
2016-12-09
