

监理工作联系单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程


编号： 008

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：关于主控楼回填、主变防火墙支模

内容：

我方人员在你单位施工中发现以下问题：主控楼回填前垃圾、石块没有清理完成，要求清理完成后通知我方、建设单位进行验收。主变防火墙钢筋没有绑扎完成就支模，要求你方验筋后再进行下一道工序

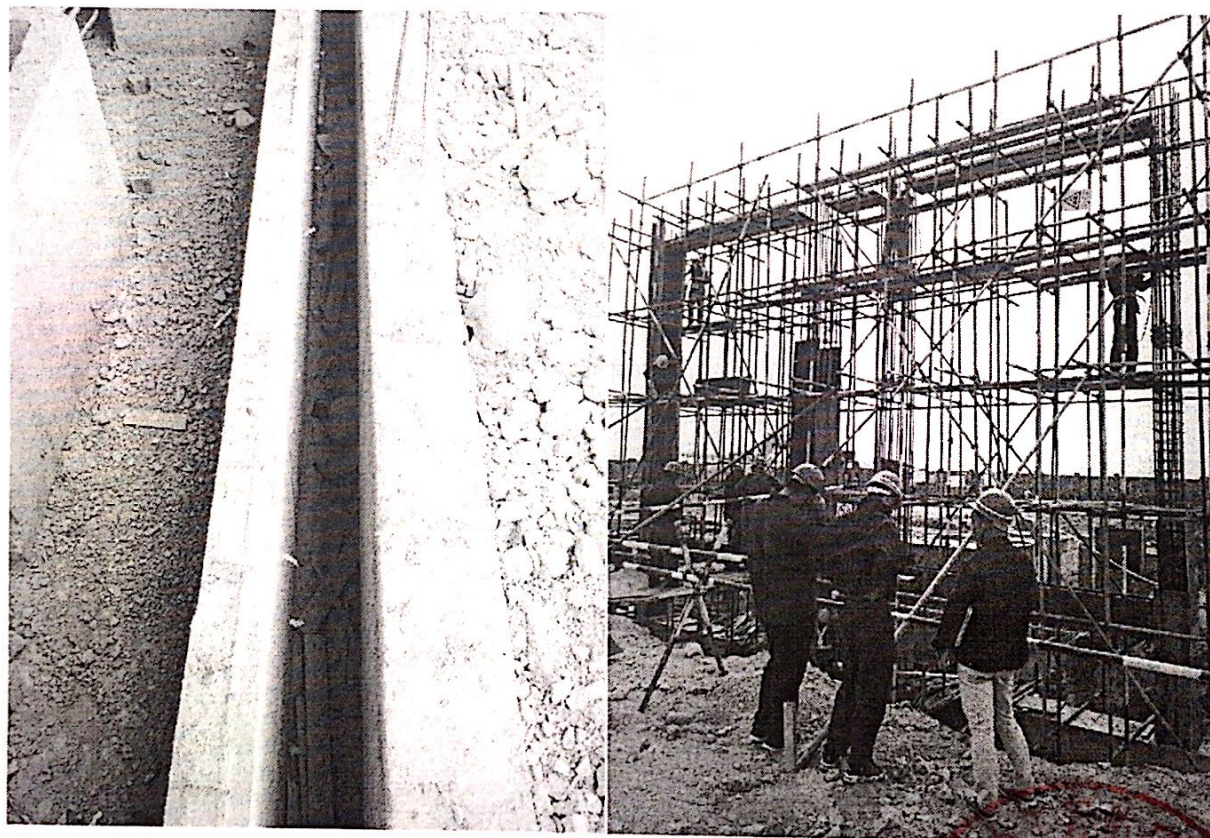

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：梅波

日期：2017 年 04 月 30 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。
