

监理工作联系单

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目 编号：006

致：湖南湘中输变电建设有限公司（董塘项目部）

事由：关于现场施工事宜

内容：要求你部在施工中严格按照设计图纸进行施工，对图纸中存在的问题应即时通知业主和设计单位出具设计变更单或业主答复，否则擅自变更设计图纸要求的施工，造成的后果由你单位负责。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2017年03月13日



本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1

监理工作联系单

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目 编号：007

致：湖南湘中输变电建设有限公司（董塘项目部）

事由：关于现场存在的问题

内容：

1、综合楼地砖已粘铺完成，表面存有砂、灰等建筑垃圾，易造成地砖表面损坏，现要求清理干净，做成品保护。

2、地砖缝存有砂灰，要求清理干净，用勾缝剂勾缝后，地面清理干净做成品保护。

3、门窗及防火门限 5 月 13 日安装完成。

4、站区道路，在配电楼东北角，电缆沟埋管上偏东地面存有裂缝，望你单位做出方案，进行整改。

5、站区场坪，要求清理现场存有的建筑垃圾、砖头及石块，并整平。

6、继保室网线不符合业主指定品牌，要求更换。

7、继保室槽盒里的空调线改为电缆线。

8、相关试验报告必须合格（土建和电气安装）

以上问题望贵部接到联系单后，于 5 月 13 日整改完成，否则将按每天 5000 元处罚警告。未尽事项必须满足电力质检的验收要求，否则也将进行处罚警告。

抄送业主方

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：苏振峰

日期：2017 年 05 月 08 日



监理工作联系单

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目 编号：008

致：湖南湘中输变电建设有限公司（董塘项目部）

事由：关于升压站电气安装进度问题

内容：

升压站电气安装已全面展开，但仍然存在施工人员不足，部分施工部位无安装人员，进展缓慢。为确保 5 月 20 日具备验收条件，业主和监理单位要求，立即增加安装施工人员，平行作业施工，确保每个施工部位必须有人员施工。

要求有施工人员的部位如下：

- 1、继保室二次接线及接地铜排；
- 2、35kV 高压室二次接线，接地铜排，母线罩安装；
- 3、220kV 配电区二次接线，接地线跨接，端子箱、检修箱接线；
- 4、主变区一次及二次接线；
- 5、SVG 变压器、控制箱一次及二次接线；
- 6、2 台接地变接线及站用电接线；

以上部位必须确保有人员施工，否则将按每项 5000 元罚款警告。

抄送业主方

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：姜振宇

日期：2017 年 5 月 09 日



本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1

监理工作联系单

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目 编号：009

致：湖南湘中输变电建设有限公司（董塘项目部）

事由：关于工程质量问题

内容：1、在配电楼 35kV 高压室东墙面，出现凸凹不平，比较明显。

2、阴阳角不顺直。

以上问题望贵部立即整改，不要影响工程竣工验收。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2017年2月25日



本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1

监理工作联系单

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目 编号：010

致：湖南湘中输变电建设有限公司（董塘项目部）

事由：关于现场安全施工问题

内容：在施工现场巡视发现，SVG 变压器西侧，乙炔瓶和氧气瓶一同存放，安全距离没达到规范要求，并且还有一气瓶漏气，阀门没有关闭，严重违反安全操作规程。



对以上存在的问题立即整改，并处罚 1000.0 元警告。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：姜振涛

日期：2017 年 05 月 20 日



本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1


监理工作联系单

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目 编号：011

致：湖南湘中输变电建设有限公司（董塘项目部）

事由：关于综合楼及配电楼装饰装修相关事宜


内容：1、综合楼及配电楼内墙面凸凹不平，部分墙面没有打磨。

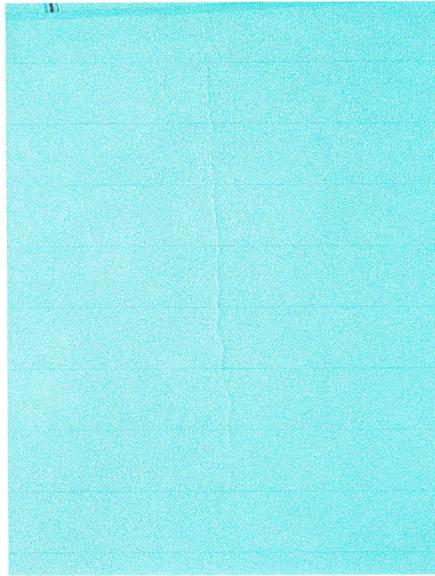

2、综合楼室内木门门套与墙接缝过大。




3、综合楼室内防火门门框成品损坏，接缝不严实，安装不牢固。

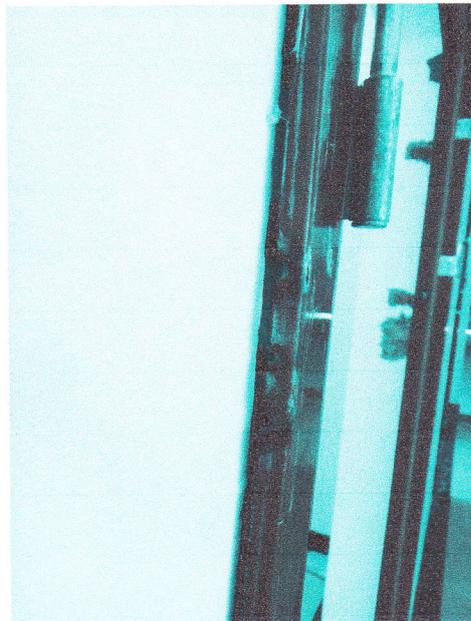

4、防火门门框与预留门洞口尺寸不符合。



5、综合楼主厅进门为无框地弹门，门洞包边不少于 150mm，望贵部按照装修方案进行施工。

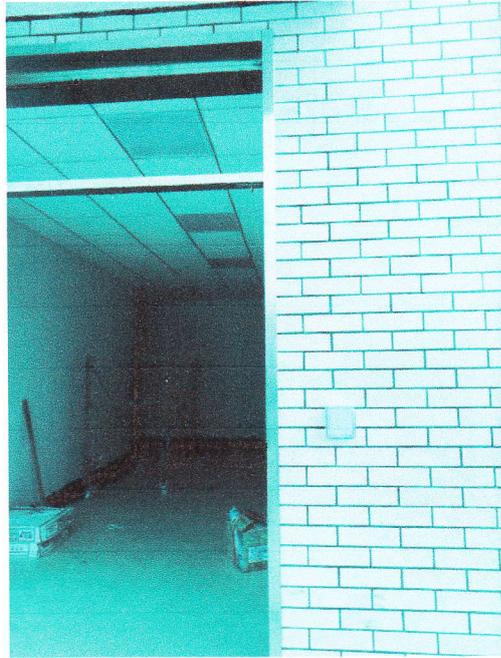

6、要求防火门的厂家资质、合格证、材质、出厂检测报告符合相关规范规定，并与进场防火门相符合，否则出现质量及安全问题由你单位负责。

以上问题望贵部尽快整改，达到验收要求，未尽事项望你部自行检查，达到标准后报业主和监理单位验收。

抄送业主方

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： *[Signature]*

日期：2017年05月30日



本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1
