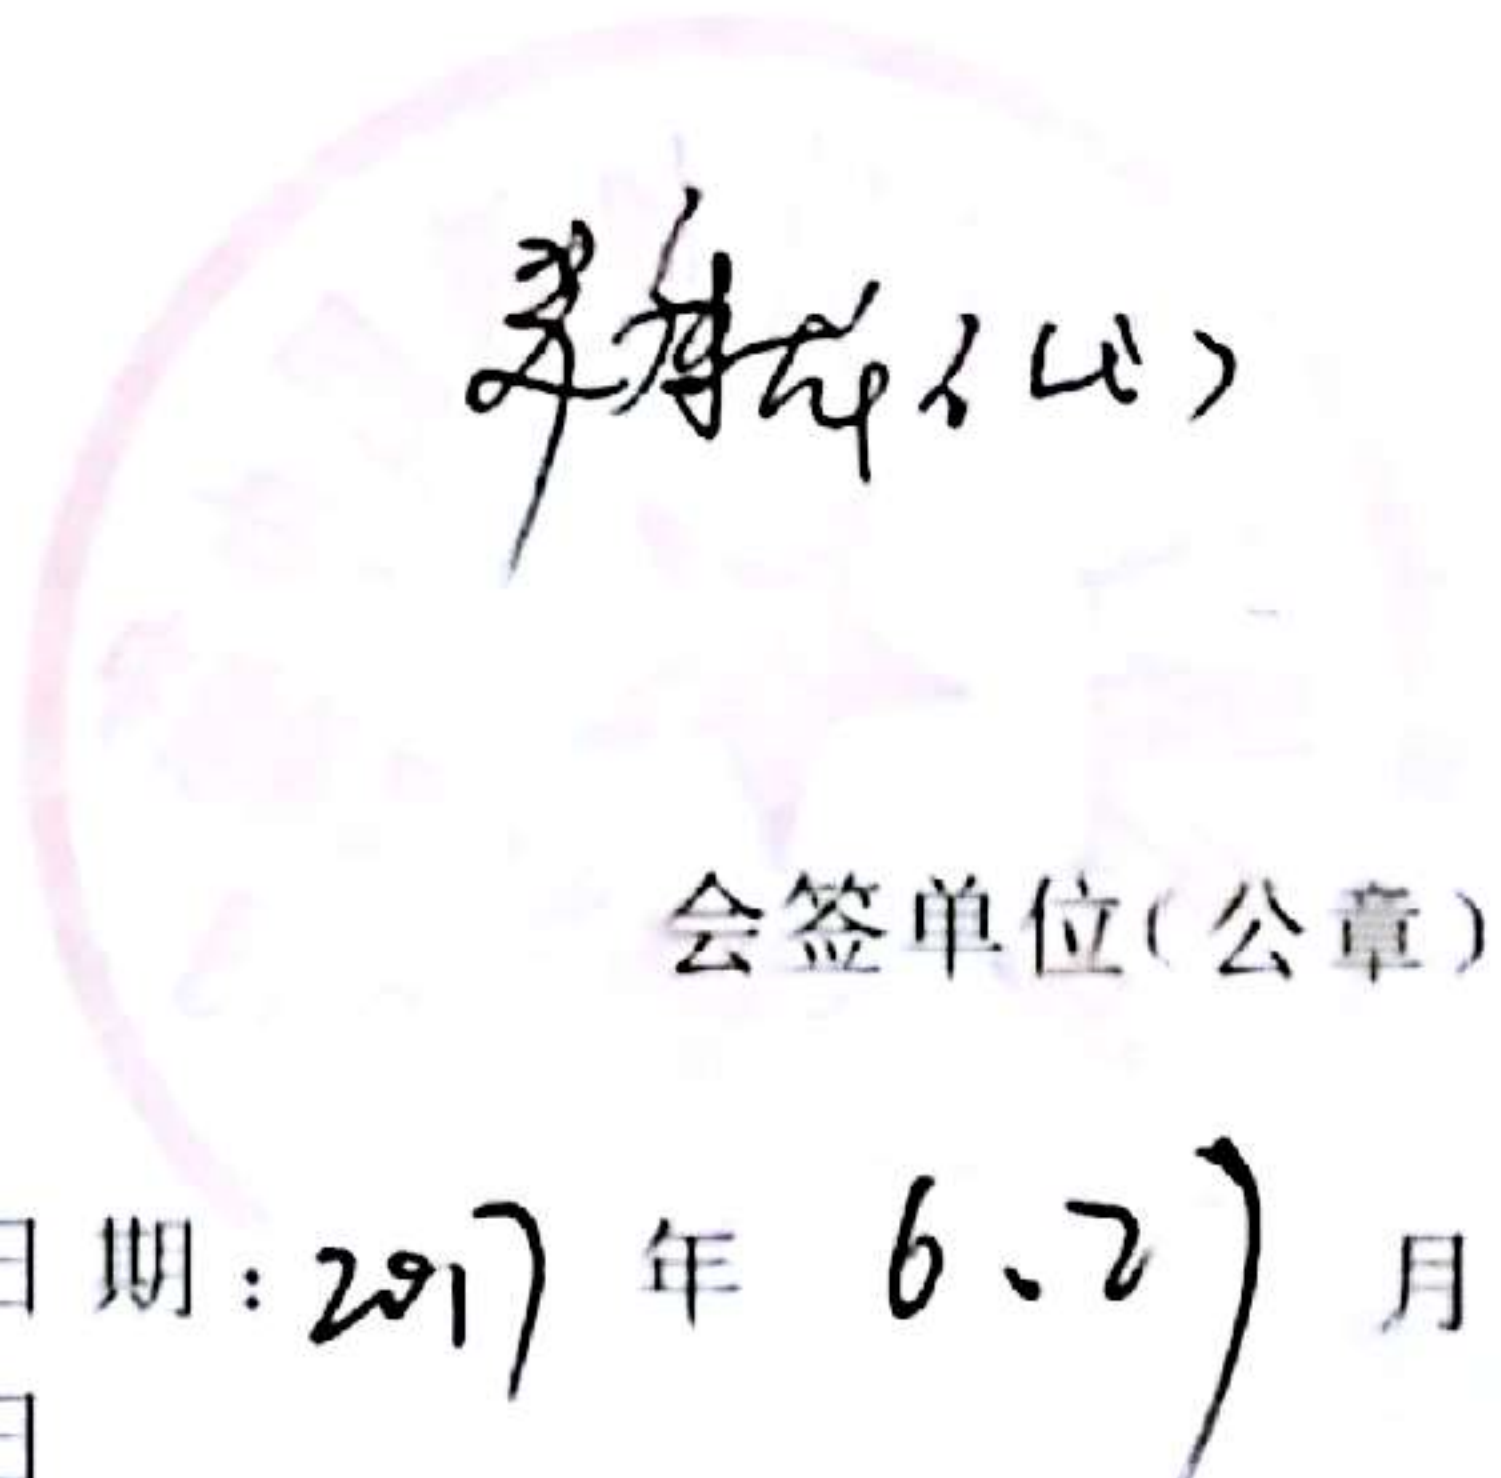


SH/T3503-J112	工 程 联 络 单		工程名称：中地能源 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目
联络单编号	CZZHJL-024	送达单位	中国新时代国际工程有限公司
事由：关于并网后安全施工的事宜； 内容：为了施工安全，根据 2017、6、20 日省地调启动会会议精神，要求并网十天内光伏区域要求停止施工，因设备、电缆全部带电，在停电后再进行整改工作。要求总包单位高度重视安全，合理调度施工计划。对省地调启动会的精神要贯彻落实。 监理单位： 专业监理工程师：黎建光 日 期： 2017 年 6 月 21 日			
监理单位处理意见： 安全是重中之重，确保人身安全无事故，要求总包单位相互配合。 处理单位负责人：（签字）<i>黄泽相</i>			
总包单位意见： <i>试运行结束后进行整改</i> 负责人：<i>王超伦</i> 日期：2017.6.21			
建设单位代表：	监理单位代表：	施工单位代表：	
<i>王超伦</i>  会签单位（公章） 日期：2017 年 6 月 21 日	<i>黄泽相</i>  会签单位（公章） 日期：2017 年 6 月 21 日	<i>王超伦</i>  会签单位（公章） 日期：2017 年 6 月 21 日	

注：本表抄送建设单位、总包单位、监理单位各一份。
