


SH/T3503-J112	工 作 联 络 单		工程名称：中地能源 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目
联络单编号	CZZHJI-014	送达单位	渭南市三泰电力设备工程有限责任公司
事由：外线铁塔四周放射型接地不符合图纸及规范要求 内容：2017 年 4 月 14 日监理、总包在现场 6#铁塔检查，发现铁塔四周接地没有引出接地排已进行回填，具施工方李思耀说是土地不好征用。导致四周不做放射型接地的原因，此施工不符合图纸及规范要求，要求施工单位对上述问题作出整改结论，如拒不整改，势必更改图纸或设计院出具变更手续。 见附图 2 张 专业监理工程师：刘 朋 日 期：2017 年 4 月 14 日			
监理单位处理意见： 要求施工单位负责人高度重视，此问题严重，要求在一周内给予回复整改结果。 监理单位负责人（签字） 黄泽桐 日期：2017、4、14			
分包单位意见： 已按照图号 WP-2DN1-A08 号施工 分包单位质量负责人（签字） 李思耀 日期：2017.4.18			
建设单位代表：  会签单位（公章） 日期： 年 月 日	监理单位代表：  会签单位（公章） 日期：2017 年 4 月 15 日	总包单位代表： 会签单位（公章） 日期： 年 月 日	

说明：抄报建设单位、总包单位、监理单位留存一份。

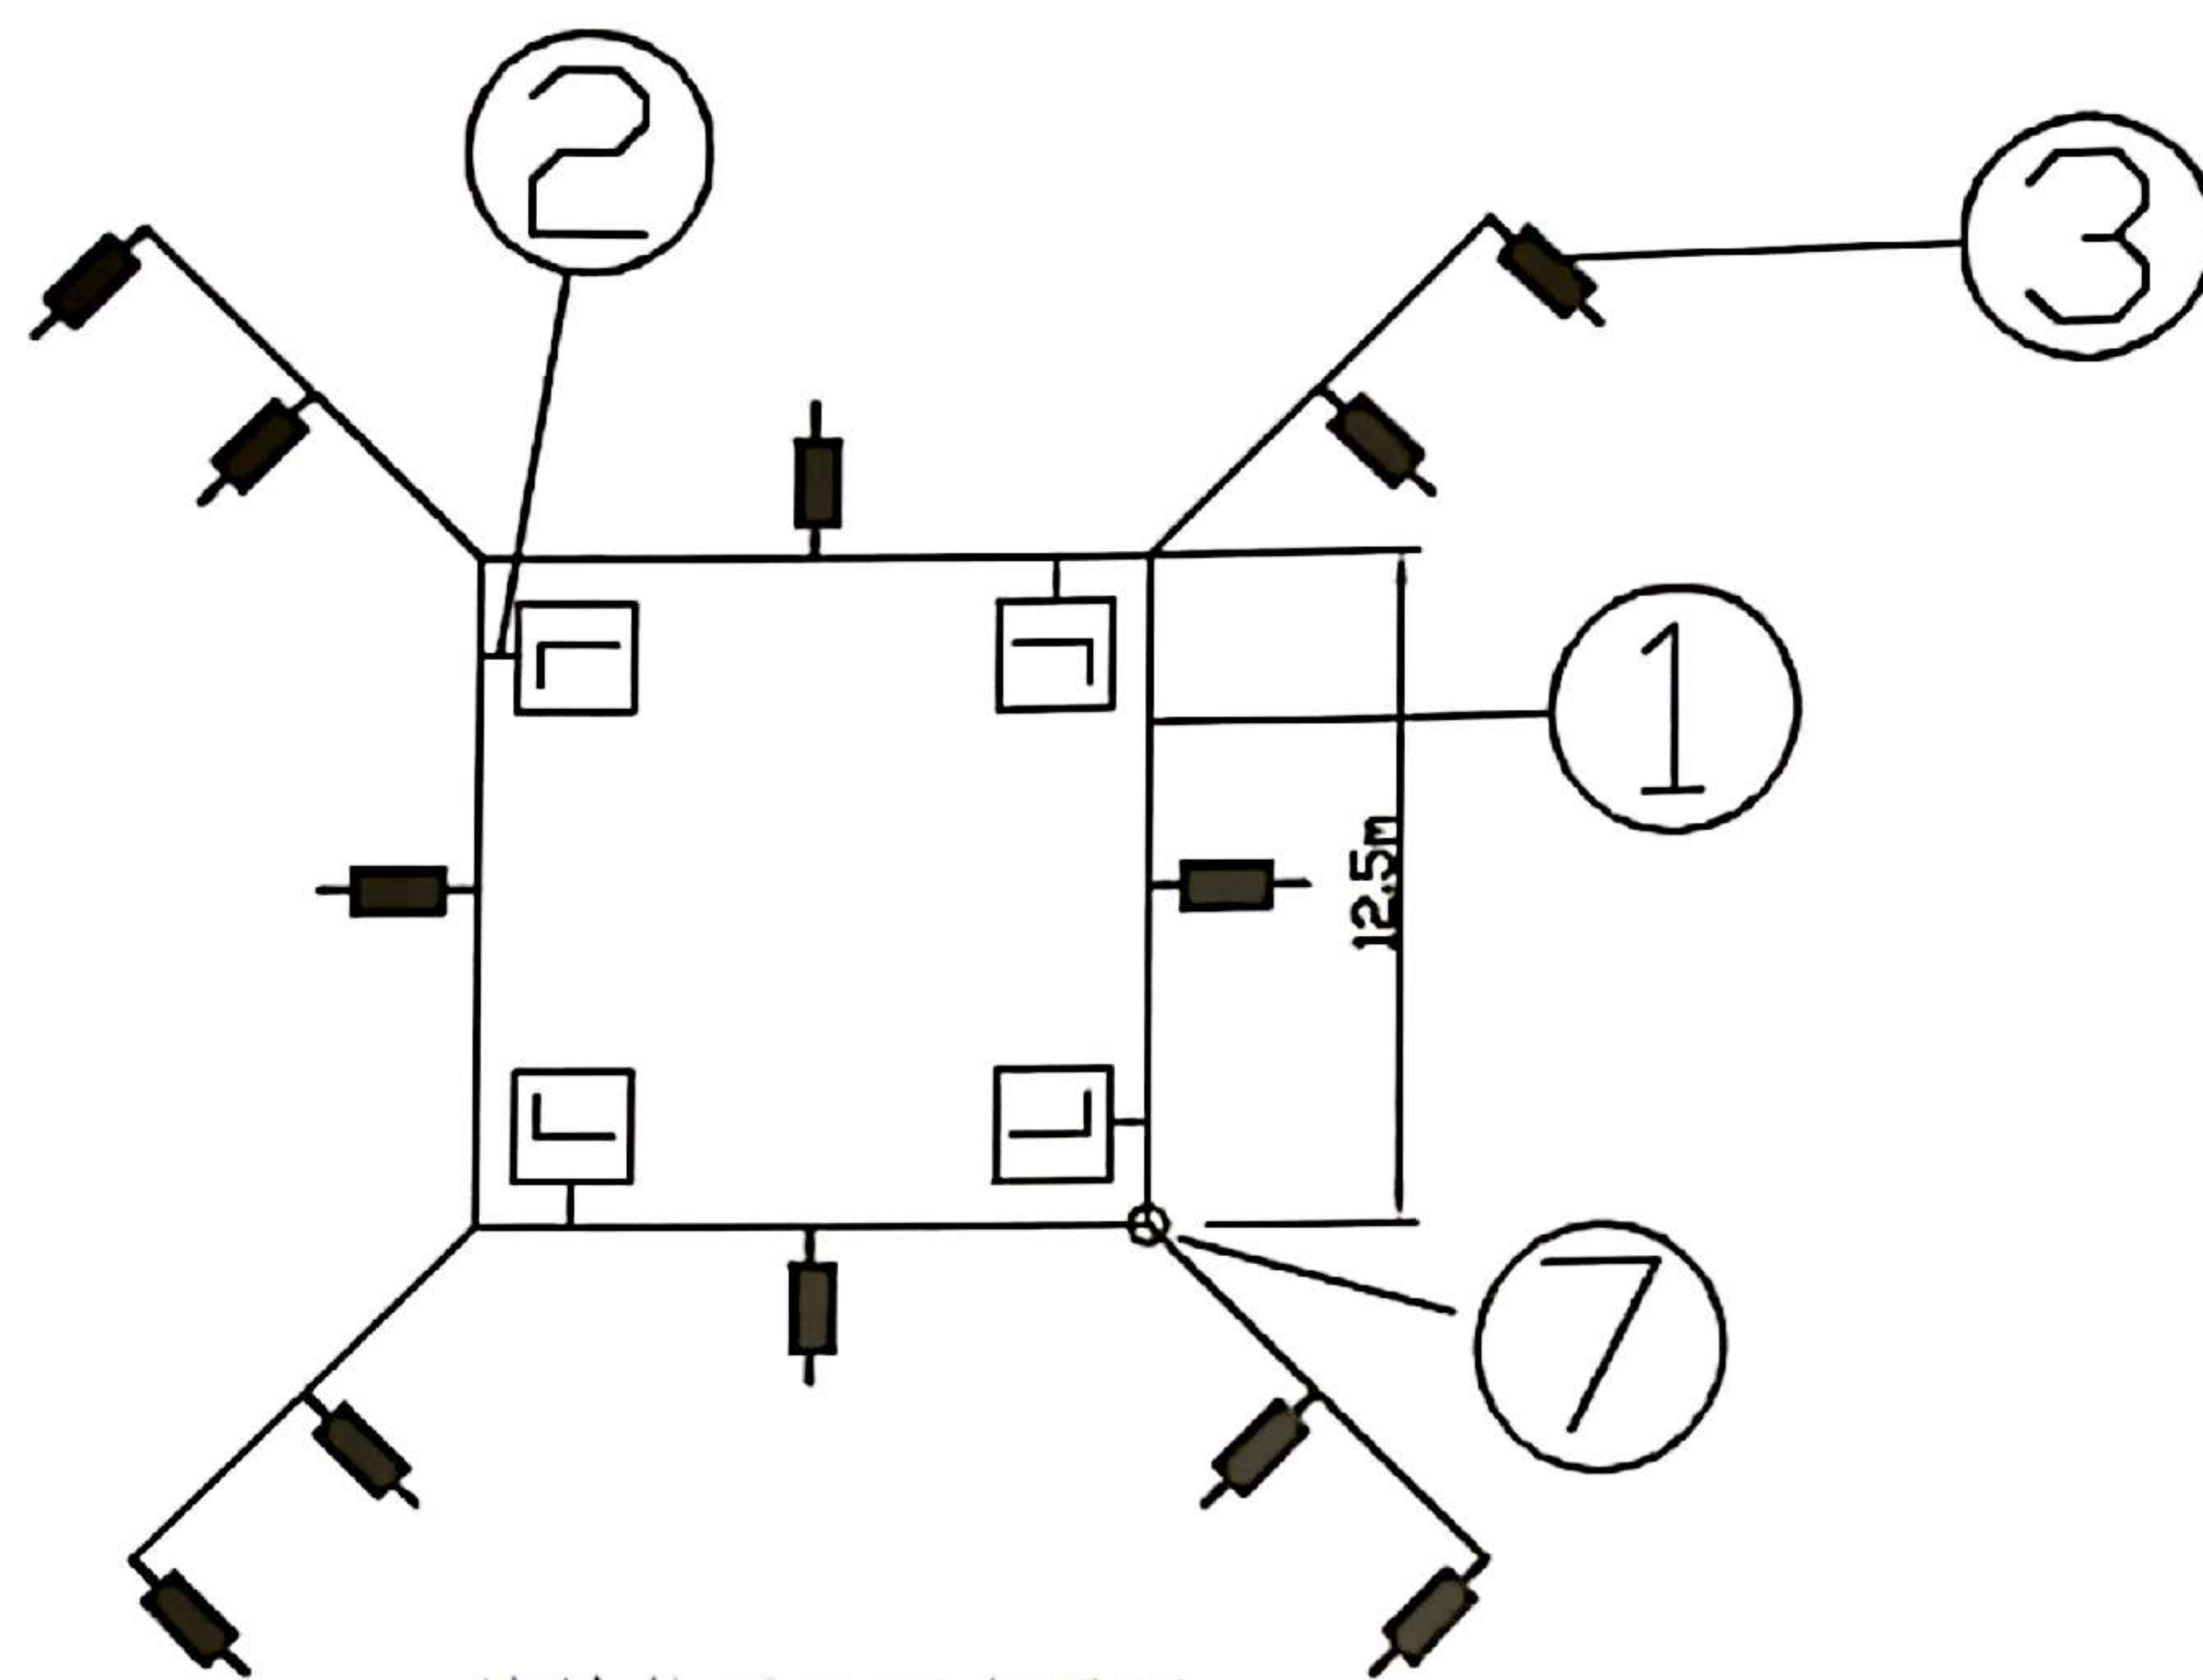


接地装置材料表

国家标准图集



现场已回填（2、3、4#铁塔）



设计院现场施工图
