

监理工作联系单

工程名称：宁波杭州湾新区跨境电商仓储（一期）光伏电站建设项目
KJDSGD-ZHJL-LX-20170303

编号：


致：中机国能宁波杭州湾新区跨境电商仓储 3.635MW 屋顶光伏发电项目
部

事由：野蛮施工

内容：宁波杭州湾新区跨境电商仓储 3.635MW 屋顶光伏发电项目屋顶光伏发电项目建设已启动，施工已开始。贵单位施工人员在电缆沟开挖时不按现场实际情况，随意使用挖机大铲斗进行土方开挖，造成 3 号厂房雨水管道破裂，开挖出的树木到处摆放，不符合工地安全文明施工管理规定的要求，引起原施工单位的投诉与不满，现要求贵单位与原施工单位了解好相关管线位置，对破损的管道进行恢复，对到处摆放的树木进行统一安放，待施工结束后进行移栽，对有关施工人员及时进行督促整改。

综上所述，望贵单位引以为戒，严禁出现施工人员的不文明施工，否则，由此引起的一切责任后果，将由贵单位自行负责，望立即纠正并整改！

此致！

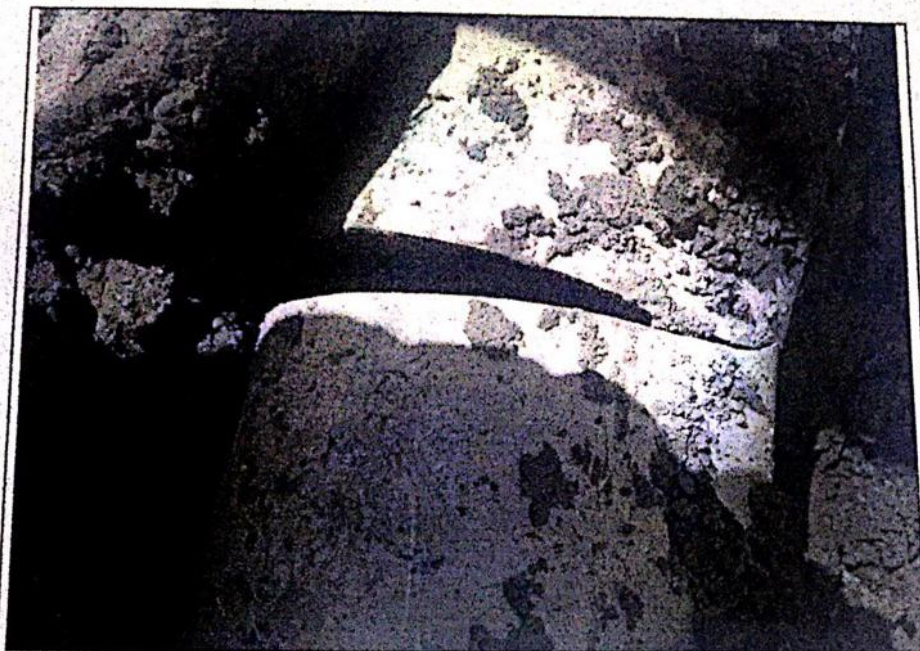

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王道春

日期：2017 年 3 月 3 日

本表一式肆份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。
