

监理工作联系单

工程名称：金坛区直溪镇二期 20MW 鱼塘水面光伏发电项目

编号：JXM6-009

致：特变电工湖南工程有限公司

事由：关于施工进度的相关事宜

内容：


目前现场施工已进入安装高峰，施工进度应按施工进度计划完成，才能确保 6.30 并网发电。但是，近两周来的施工进度一直处在滞后状态，没能按周计划完成工作量，施工人员迟迟不能进入施工现场，是进度滞后的主要原因，目前完成的工作量不到六分之一，如不采取有效措施，就无法按期确保 6.30 并网发电。

鉴于上述问题现要求贵公司必须采取果断措施，重新制定进度计划，安排充足施工人员满足施工进度要求，务必确保在今后的各项施工进度不得滞后，并能提前完成计划工作量，必须保证 6.30 并网发电。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师

日期：2021年4月27日

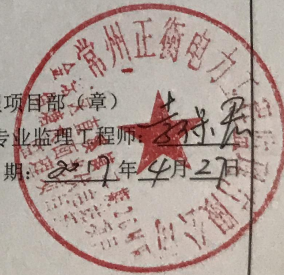

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。
