

监理工作联系单

工程名称: 高邑县恒光新能源有限公司领世陶瓷厂房屋顶光伏发电项目 编号: 003

致: 中广核联达新能源工程有限公司

事由 支架安装问题

内容: 我方监理巡查过程中发现,由南向北第3栋厂房北侧屋面,支架安装完成后,遗留问题较多,主要问题有夹具紧固不到位,螺丝未紧固到位,要求立即对整栋屋面进行排查,进行整改,要求以后支架安装完成后,必须进行排查,确认无误后才能进行组件的安装。加强对支架安装的管控力度,保质保量的按期完工。



常州正衡电力工程监理有限公司
Zhengheng Power Engineering Supervision Co., Ltd.

工程名称:高邑县恒光新能源有限公司
河北领世陶瓷有限公司厂房
屋顶光伏发电项目

施工部位:支架安装

当前日期:2017年5月12日




常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称:高邑县恒光新能源有限公司
河北领世陶瓷有限公司厂房
屋顶光伏发电项目

施工部位:支架安装
当前日期:2017年5月12日

2017/05/12

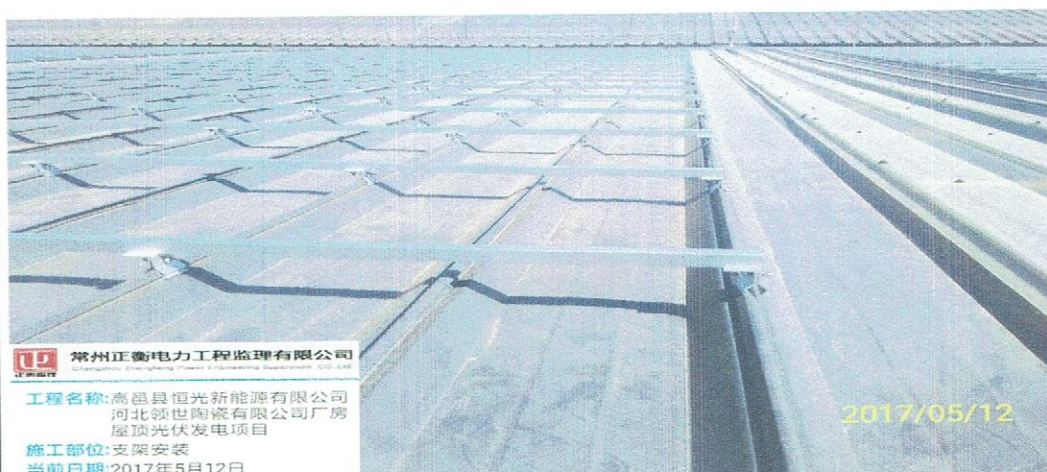

常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称:高邑县恒光新能源有限公司
河北领世陶瓷有限公司厂房
屋顶光伏发电项目

施工部位:支架安装
当前日期:2017年5月12日

2017/05/12



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称:高邑县恒光新能源有限公司
河北领世陶瓷有限公司厂房
屋顶光伏发电项目

施工部位:支架安装
当前日期:2017年5月12日

2017/05/12

常州正衡电力工程监理有限公司
监理项目部(章)
总/专业监理工程师: [Signature]
日期: 2017年5月12日

注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。
