

|                                                                                                                       |      |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|
|  <b>正衡监理</b><br>ZhengHengSupervision | 项目名称 | 滨州北海 5.99MW 屋顶分布式光伏电站项目 |
|                                                                                                                       | 文件名称 | 监理联系单                   |

## 监 理 工 作 联 系 单

工程名称：滨州北海 5.99MW 屋顶分布式光伏电站项目


编号：CZZH-JL-LX-05

致：江苏金马工程有限公司

事由： 质量问题相关事宜

内容：

我方在巡视中发现，开关站基础土建施工的砼墙已严重涨模，导致整体基础严重变形，已经影响到开关站房的安全质量和安装，不能只为争取 630 并网，就不需工程质量、暴力施工、偷工减料，现提出马上整改，要求按设计要求施工。

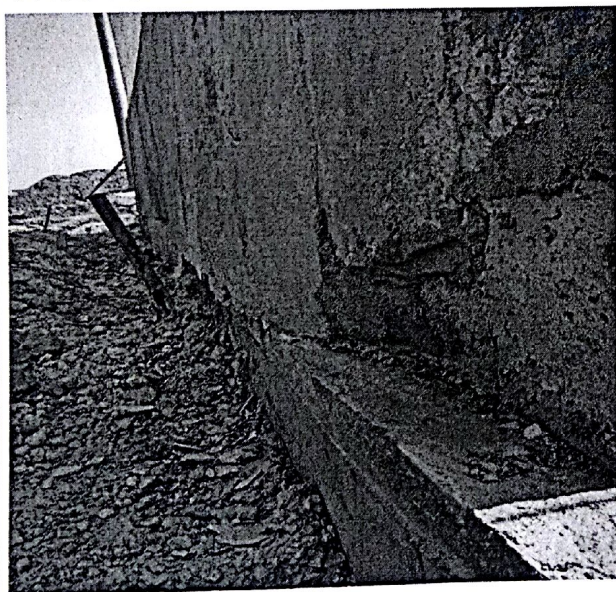

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师

日期：2021年6月29日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份
