

监理工作联系单

工程名称: 溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号: 006

致: 江苏启安建设集团有限公司

事由: 现场施工质量问题


内容:

1、光伏电缆 PVC 保护管转角处, 部分白色绕管缠绕不紧密; 且有部分白色绕管延伸至 PVC 保护管内的长度不够, 已经出现卷缩致使光伏电缆外露的现象; 要求施工单位按相关的要求进行整改。

2、现场巡视的过程中发现有个别工人将接地线放置在组件板上, 现要求施工单位立即整改, 严禁将物品放置在组件板上。

3、现场电缆保护管及电缆的绑扎固定, 不要用白色塑料扎带, 要求用带铁丝内芯的黑色扎丝进行绑扎固定。

4、现场发现, 有个别工人在上或者离开 1#车间屋面 B 区的过程中, 不走搭设的临时阶梯, 而是为了自己的方便从低女儿墙处踩踏而过, 对女儿墙彩钢板造成了破坏; 要求施工单位立即进行整改, 加强对屋面的成品保护工作, 并将已经破坏的儿女墙进行修复。

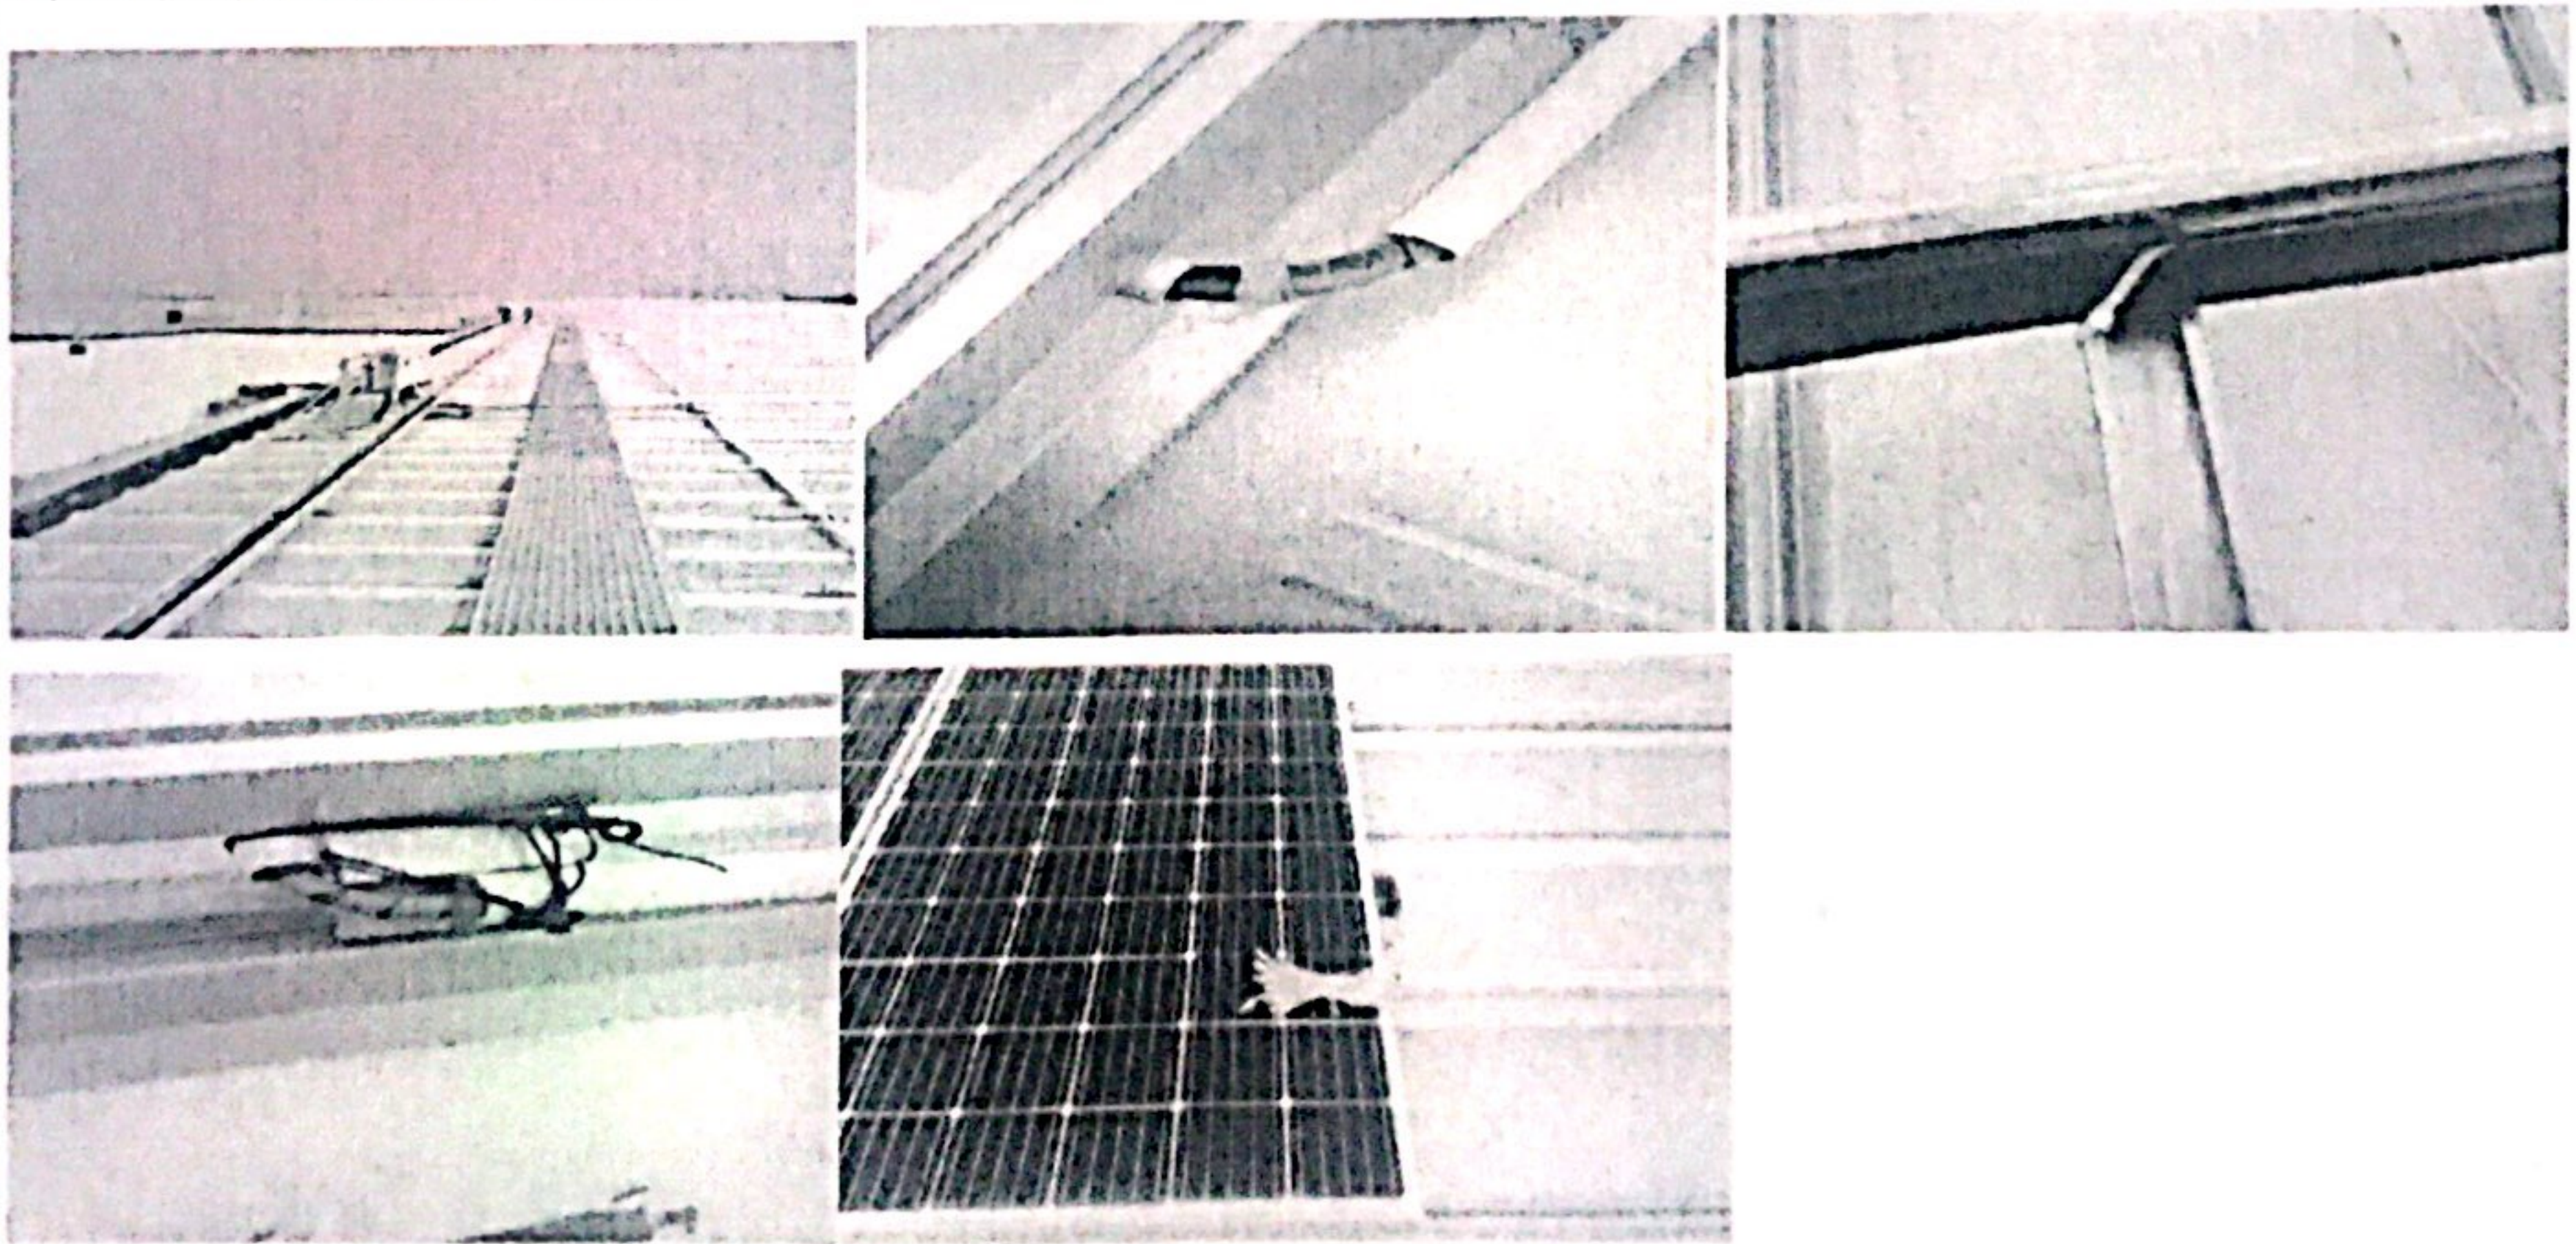

正衡电力工程监理有限公司
监理项目部 (章)
总/专业监理工程师: 生金文
日期: 2017 年 8 月 7 日

注本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份
