

## 监理工作联系单

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MW<sub>p</sub> 农业光伏电站项目

编号：JXM6—021

致：中国核工业二三建设有限公司 施工项目部：

事由：

关于升压站综合楼施工事宜：

内容：

升压站综合楼室内吊顶及外墙施工时，经现场检查，发现以下问题：

1、综合楼室内吊顶时，挂钩预埋电线管钢筋应做防腐处理，同时应用扎带将电线管紧固起来，避免出现掉落。

2、升压站围墙及综合楼内墙在腻子刮完后，按照图纸要求应再找平修补一道白乳胶水泥腻子，避免墙面出现不平整、麻面等现象；


以上两点问题，望你项目部及时采取相关整改措施，熟悉现场施工图纸，并严格按照要求进行施工。




监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017年8月8日

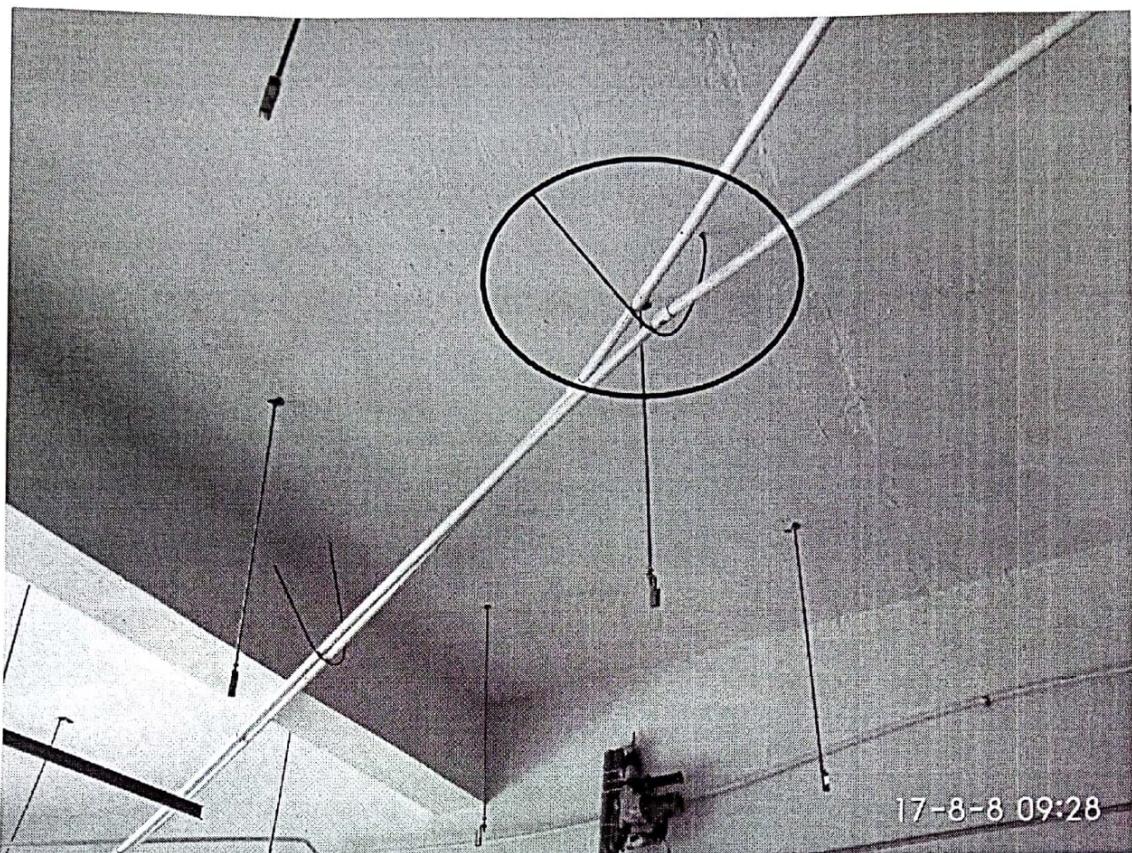

未紧固和防腐

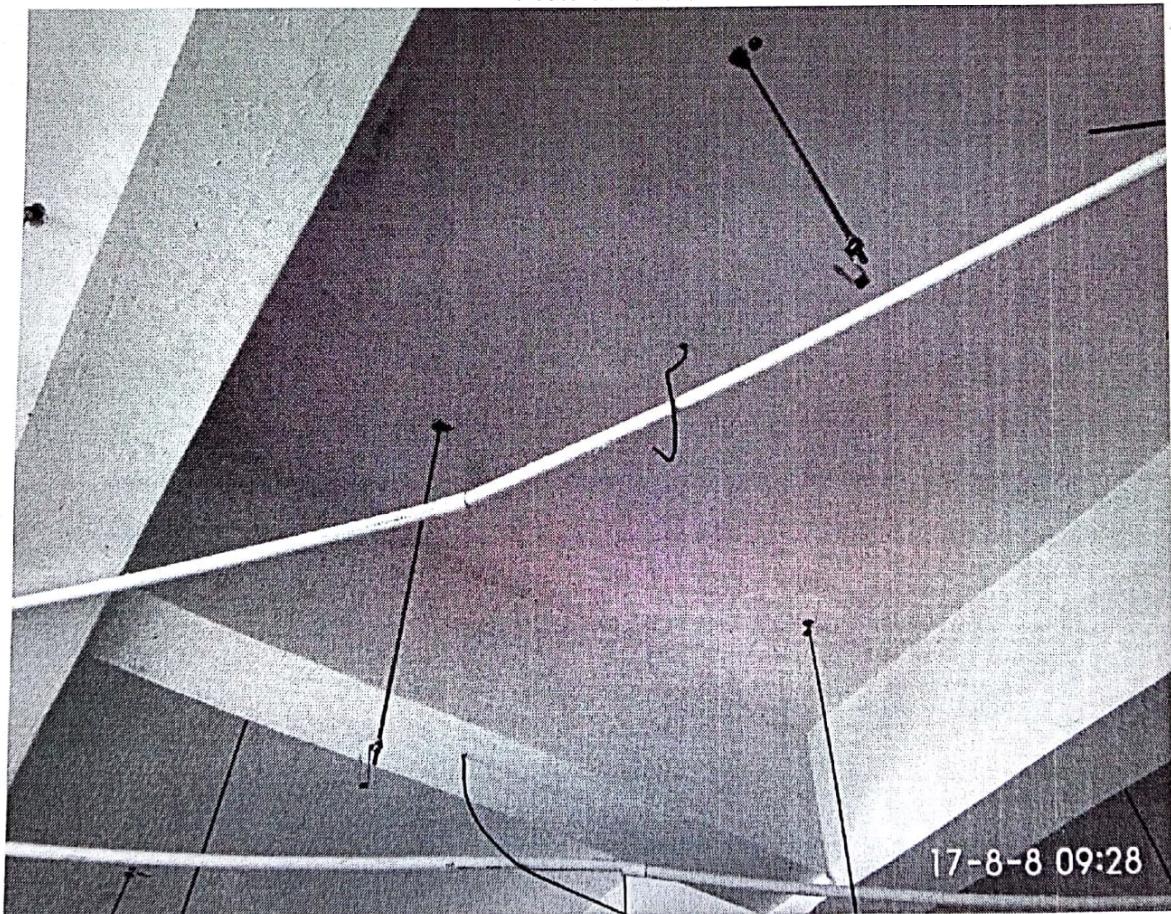

未防腐和紧固
