

监理工作联系单

工程名称：围场满族蒙古族自治县 2016 年村级光伏扶贫电站采购项目

编号：JXM6—006

致：江苏润海环保工程有限公司施工项目部

事由：光伏区现场施工的相关问题

内容：

在对御道口桦树林项目进行巡视时，发现存在以下一些问题：

- 1、部分支架固定螺栓没有紧固到位，平垫、弹垫位置装反。
- 2、电缆沟开挖深度不够，电缆沟内电缆排布混乱。
- 3、接地扁铁焊接接头焊缝没有清理和进行防腐处理。
- 4、现场构配件放置混乱，没有采取防雨措施，平垫已经出现明显锈蚀。

要求你项目部加强现场施工管理，严格按照设计及规范要求进行施工，对存在的问题，及时进行整改，严把质量关。

(后附问题照片)

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017年7月9日



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。






桦树林接地扁铁焊缝没有进行焊渣清理和防腐
2017、7、9



桦树林项目支架螺栓弹垫、平垫位置安装错误
2017、7、9



桦树林项目支架螺栓没有紧固到位
2017、7、9

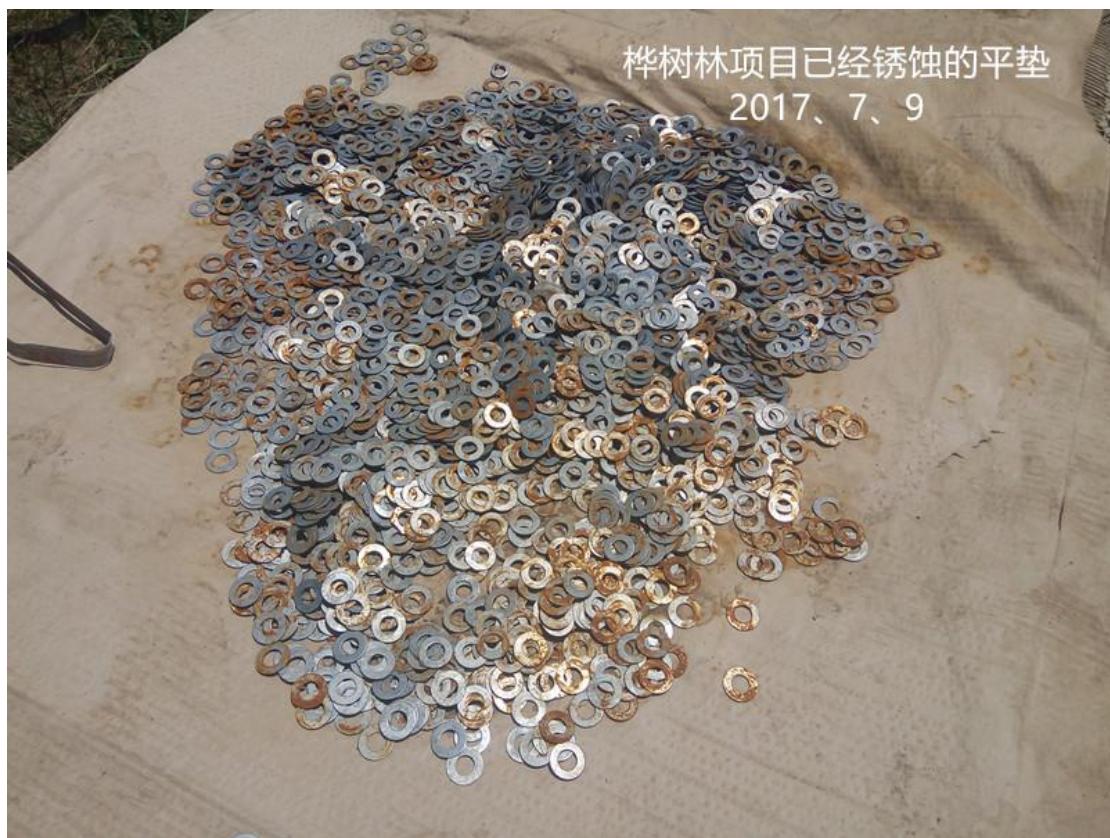

桦树林项目已经锈蚀的平垫
2017、7、9
