

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号：044

致：河南省易通电力工程有限公司

事由：关于工程自检和报检的相关事宜

内容：



你单位承包施工的《森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程》工程：

1、业主和监理在巡视中发现多基塔接地极紧固不到位，接触面积不够；多出出现防盗帽未紧固；28#电缆沟护坡整改和其他塔基护坡尽快砌筑。

2、基础设计变更单，23#、24#、25#第三方检测报告单和检测机构资质；水泥、砂、石子、钢筋、电缆、导线及水泥试块等相关报告单和检测机构资质，多次催要，至今未提供；要求你方尽快提供。

3、工程已接近尾声，要求你方对工程的缺陷进行整改，整改完成后对整条线路进行自检，然后以书面形式出具《验收报告申请》，上报业主方、运维方和监理方进行验收。

抄送：许昌森源新能源发电有限公司梨园沟光伏发电项目部

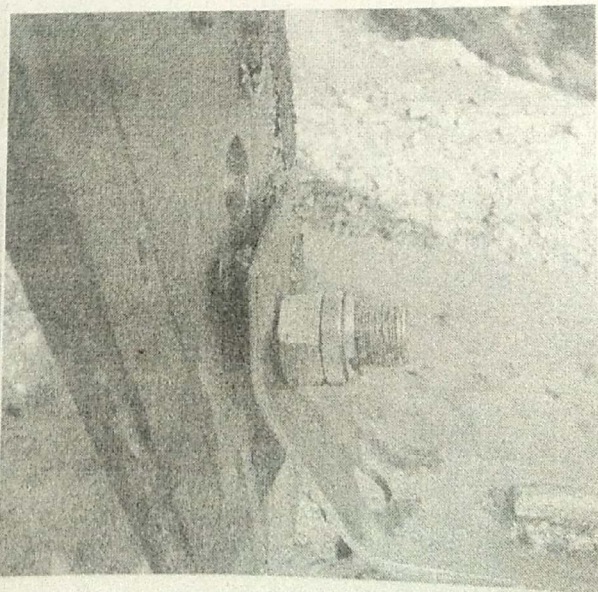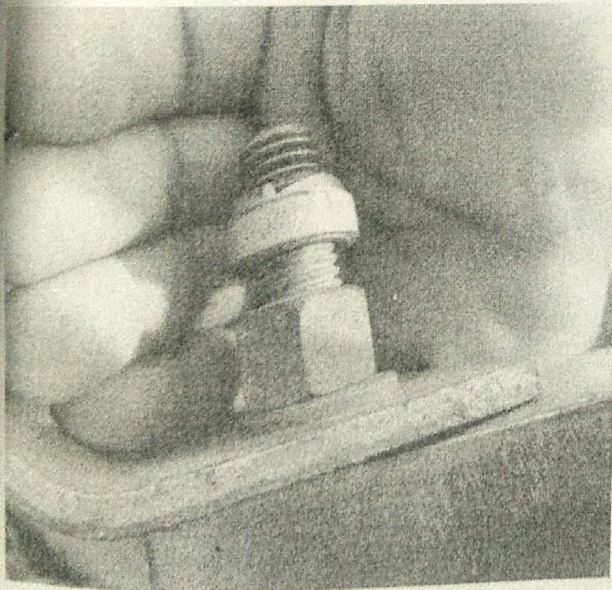

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：

孔沐阳

日期：2018年04月28日

注：本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。



由 扫描全能王 扫描创建
