

监理工作联系单

工程名称：江西木林森三期厂房 5 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目


编号：JXM6-004

致：宁波建工建乐工程有限公司施工项目部

事由：关于 SVG 及连接电抗器基础施工事宜

内容：

监理项目部今早对三期 SVG 及连接电抗器基坑高度进行复查时，发现 SVG 基础开挖深度未达到设计要求的 1.3 米；且两个基坑内存水，土质松软；按照设计图纸要求两个基础都应进入持力层 $\geq 300\text{mm}$ ；现要求你项目部，必须将基坑内的水处理，同时加深基坑深度，在浇筑前需完成三级自检并进行报验；严格按照设计图纸要求进行施工。确保施工质量。（下附照片）

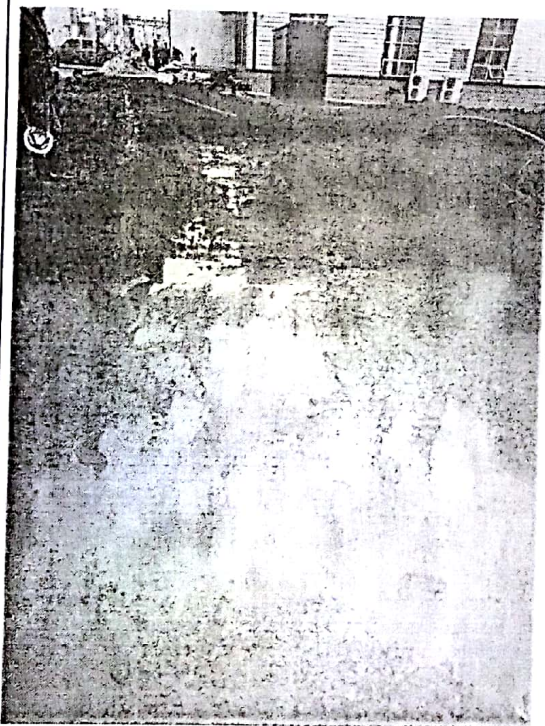

基坑存水



SVG 基础深度不够

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日

期：2017

年

12

月

2

日

