

# 监理工作联系单

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号：018

致：中国电建集团河南工程公司

事由：关于 9# 光伏区部分支架檩条连接件材料与设计不符，存在质量缺陷事宜。

内容：因檩条连接件缺失严重，贵单位为抢进度，未通知建设单位及监理单位，私自更换自制连接件，安装檩条连接件不符合设计，存在质量、安全隐患，不符合验收条件。（详见附图）

要求及时更换不符合设计的连接件，消除质量安全隐患，更换工序前及更换过程中，报监理部跟踪检查。

见此联系单立即给予回复，给出确切支架连接件到货日期，整改日期、整改措施，确保工程质量。

项目监理机构 (章):


总/专业监理工程师:

日期 2018 年 5 月 30 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份

附图一：

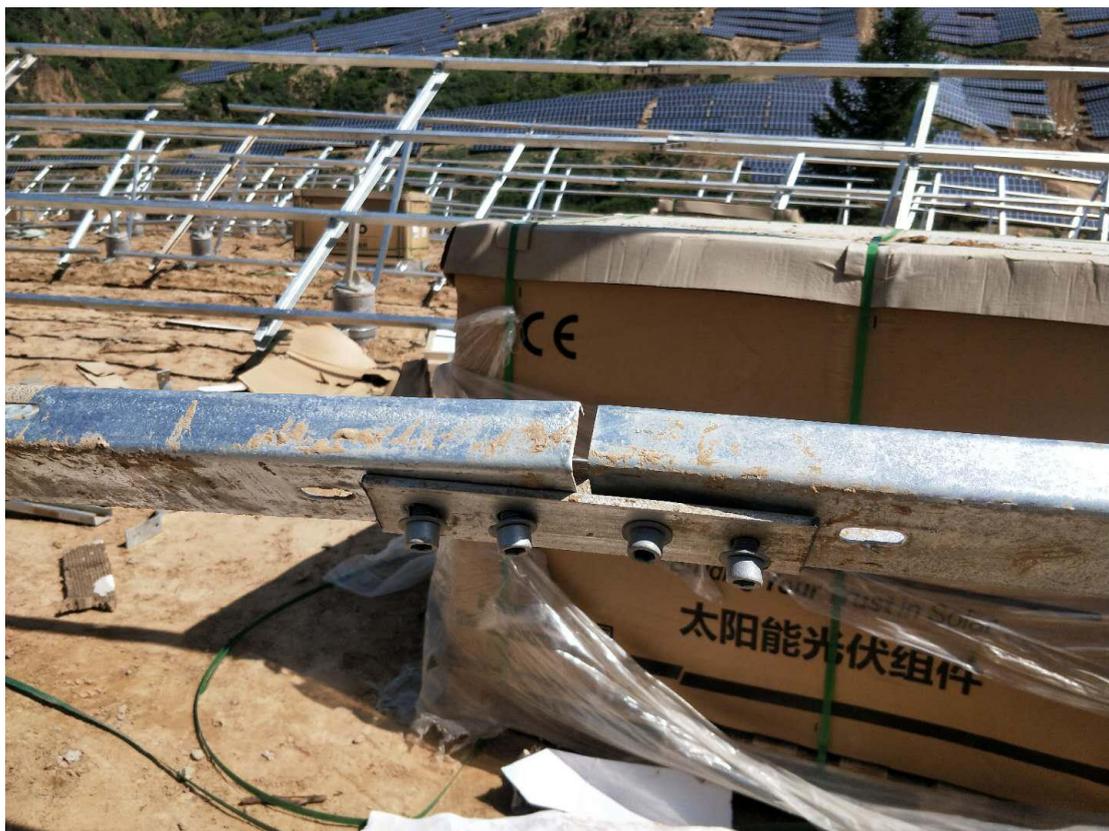

附图二：



附图三：



附图四：

