

监理工作联系单

项目：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-GL-032

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏发电项目部（单位）

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

主题：关于光伏区 31 区管桩长度事宜；

内容：


经现场巡检，：

1、 2018 年 5 月 28 日上午 10 时左右到 31 区巡检，发现桩长与设计要求长度不符。

（1）、31 区红砖房南面，西面，北面山坡设计要求为 4 米管桩，

实际测量桩长为 3.5 米，不符合设计要求。

（2）、请施工单位按照图纸和规范的要求进行更换，保证工程质量。

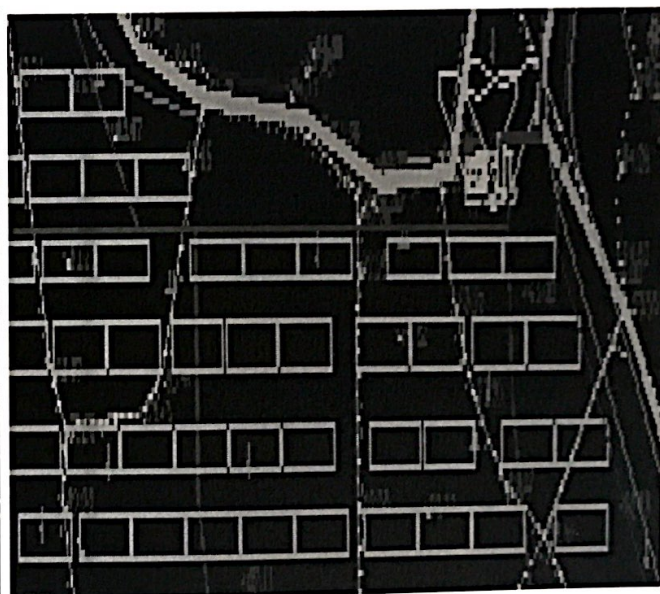

项目监理机构（章）：

总监理工程师（总代）：

日

期：

2018.5.29



由 扫描全能王 扫描创建
