

监理工作联系单

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHLJL-SDHLMY-020

致：西北电力建设第一工程公司 施工项目部

事由：关于现场施工存在的问题

内容：

项目监理部对施工现场巡视检查，发现以下问题：

1. 4#、5#屋面汇流箱与主网的接地线截面积不符合要求，应采用 16² 接地线。

2. 桥架内电缆转弯处未采取保护措施。

3. 接近汇流箱处检修通道固定不到位。

4. 桥架至汇流箱电缆保护管长度达不到要求，建议电缆屏蔽接地线与主电缆分开进入汇流箱。

要求施工单对以上问题进行整改，整改后报监理部验收。


附：现场问题照片

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 4 月 13 日


注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。

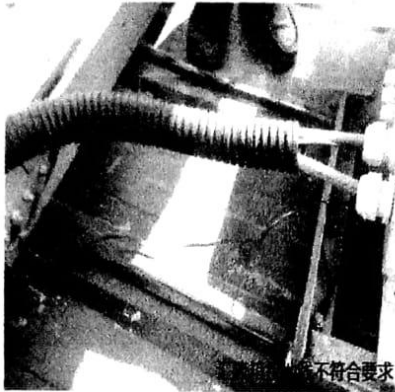

汇流箱接地线不符合要求



电缆拐弯处未采取保护措施

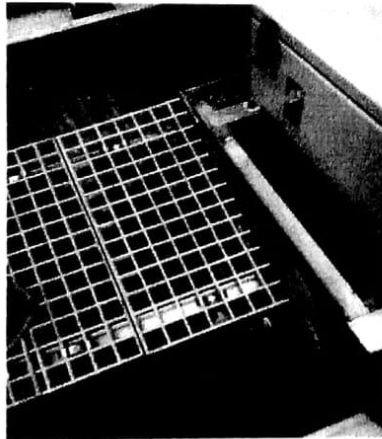

检修通道固定不到位



电缆保护管长度达不到要求
