

监理工作联系单

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-004


致：珠海兴业新能源科技有限公司 施工项目部

事由：关于施工质量的事宜

内容：

本工程 3#地已安装支架和组件，我监理部在巡视检查过程中，发现安装质量存在以下问题：

1. 光伏阵列组件下端距地面太近，有的甚至平地面。必须按图纸设计要求整改（设计要求距地面大于 1100mm）。
2. 个别光伏阵列（北坡）存在阳光遮挡，影响发电效率和组件使用寿命。
3. 光伏阵列倾角度偏差大，必须在安装组件前调整好支架倾角度和平行度。
4. 部分支架安装缺少弹垫，存在极大的质量隐患。

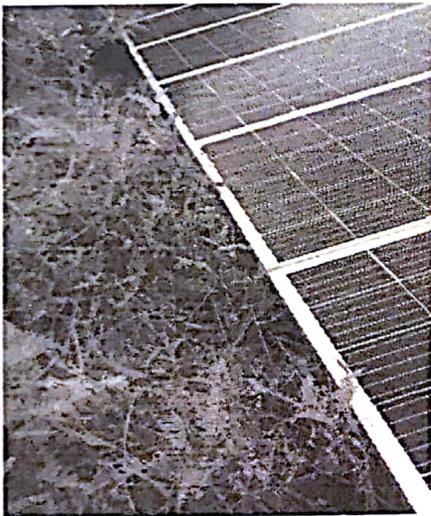

距地面太近



阳光遮挡



倾角度偏差大

以上问题必须整改，整改完成后通知监理和业主检查验收。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018年11月8日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。
