

监理工作联系单

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-LXD-057

致：包头青山电器设备有限公司

主题：

关于光伏 26#区送电事宜

内容：

光伏 26#区 2018 年底支架组件已安装完成，至今未送电，现根据业主要求，光伏 26#必须于 3 月 15 日前发电，否则进行经济考核拾万元，并保留后续电量等损失追缴的权利，直至送电为止。

项目监理机构（章）：

监理工程师：

日

期：2019.3.10号



填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建

监理工作联系单

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-LXD-058


致：包头青山电器设备有限公司

主题：

关于光伏区组件紧固事宜

内容：

监理巡视现场，发现现场有组件被大风吹落情况，乌海地区春季风沙大，要求施工单位组织人员对光伏区所有安装组件进行排查，紧固螺丝防止再次出现组件掉落的情况，若现场再发现此类情况由此所造成的一切损失由你单位自行承担并对你单位进行经济考核。

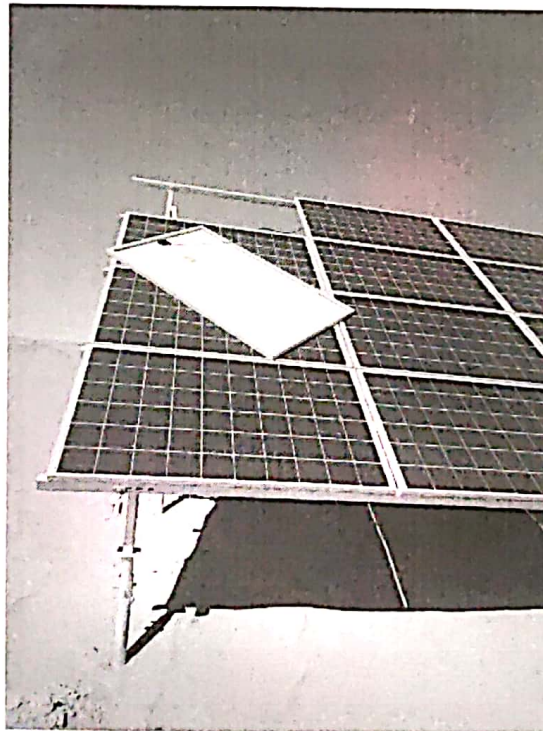

项目监理机构（章）

监理工程师：

日

期：2019.3.11



填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建

监理工作联系单

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-LXD-059

致：包头青山电器设备有限公司

主题：

关于光伏区跟踪区施工事宜

内容：

光伏跟踪区已开始施工，现要求施工单位在施工前必须向业主、监理提交跟踪区施工计划，开始施工后要求施工单位对跟踪区所有未浇筑的支架基础及已引孔的进行清理，其支架底座预埋件必须按图施工，所有工序完成后必须报总包单位、监理单位、业主单位进行验收，验收通过后方可进行下道工序混凝土浇筑等，并且材料送检、施工资料等必须与工程同步，否则由此造成的一切问题由你单位自行承担。

项目监理机构（章）：

监理工程师：

日

期：

2019.3.12

填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建
