

监理工作联系单

工程名称：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期


编号：GFDZJBM07-22

致：上海上电电力工程有限公司

事由：关于直埋电缆沟开挖事宜

内容

贵方电气安装施工队伍在进行二十区的直埋电缆沟的开挖作业时，开挖的电缆沟距离支架基础过于接近，且电缆沟内积水较深。现要求贵方电气安装分包队伍立即对电缆沟内的积水进行排水施工，电缆敷设完毕后及时对开挖的电缆沟进行回填谨防电缆沟塌方至支架基础塌陷。

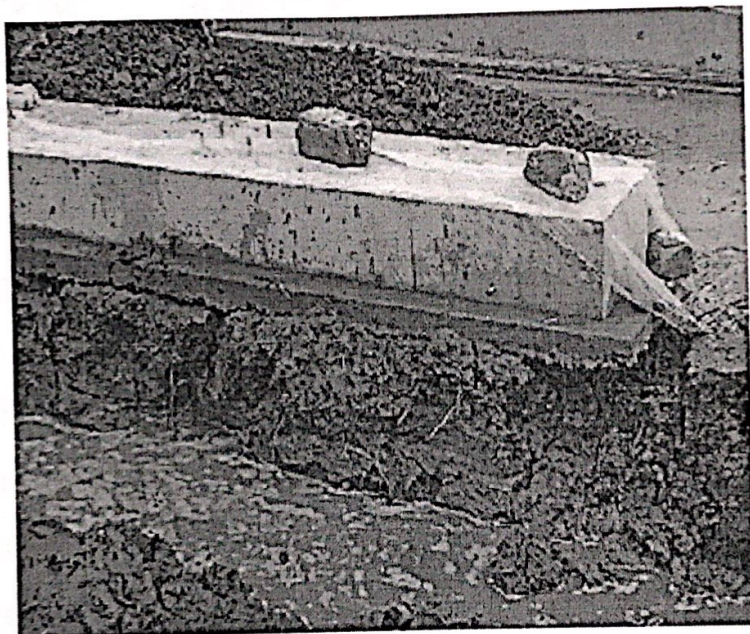


此致！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 07 月 03 日



本表一式肆份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。
