

监理工作联系单

工程名称：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期



编号：GFDZJBM07-25

致：上海上电电力工程有限公司

事由：关于场区内电缆沟开挖事宜

内容

贵方电气安装队伍在二十区场区内开挖 39#箱变至开关站的 35KV 电缆沟的施工过程中，为加快施工进度采用挖机在已安装完组件阵列间进行施工，因挖机开挖过程中无人监护，挖机与组件发生刮擦导致组件碎裂。请贵方特种机械施工过程中配备相应的监护人员，作业面积有限的地区采用人工进行开挖回填，以免对已场区内的设备造成破坏。

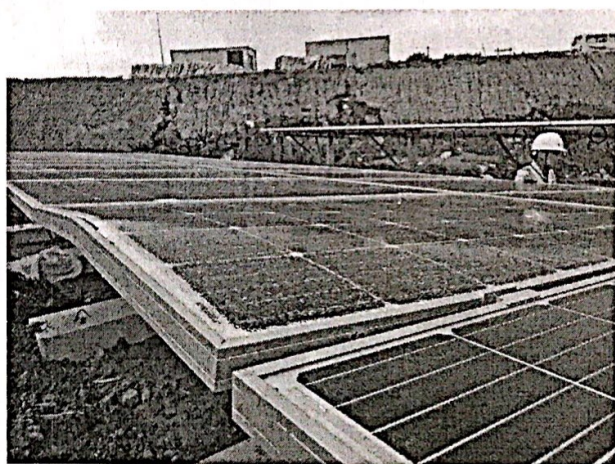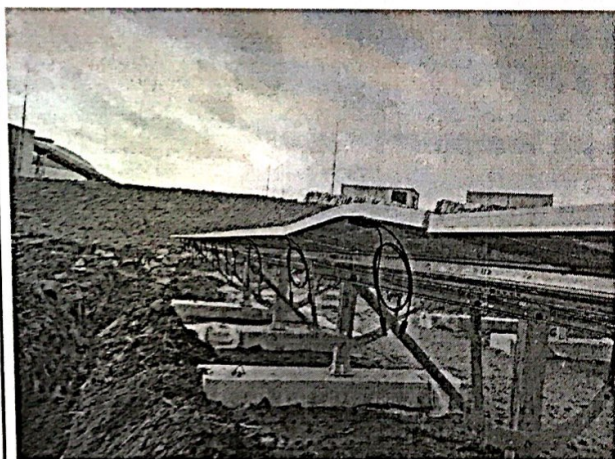


此致！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日期：2018 年 07 月 11 日



本表一式肆份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。
