

监理工作联系单

工程名称: 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 工程一标段

编号: 010

致: 河南华之源实业有限公司湖北房县分公司

主题: 施工质量问题相关事宜

内容:

1. 经近几日监理对支架的验收, 发现部分支架檩条间距过大、檩条连接件空隙过大、斜梁与檩条边距过短、螺栓未紧固、缺弹垫、平垫, 斜撑装反等现象, 监理已在支架上用记号笔做出记号, 望贵单位及时整改。
2. 围栏安装时个别围栏浇筑不合格、螺栓未紧固, 围网被损坏等现象。二号场地有一片围网下有电线杆子, 必须把电线杆子拉出后再安装围网。
3. 接地沟个别深度未达到设计要求, 个别水平接地扁铁焊接未做搭建, 焊渣未处理, 未刷防腐漆。

综上所述, 贵单位尽快把以上所述施工问题尽快整改。整改后上报监理部, 验收合格后方可进行下一道工序。

附: 图 2 页

抄送房县天昊光伏扶贫有限公司

项目监理机构 (章):

专业 / 总监理工程师:

日

期: 2018.7.18

本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、承包单位各存一份, 项目监理部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建


标条间距过大



标条与斜梁边距过短



螺栓未紧固

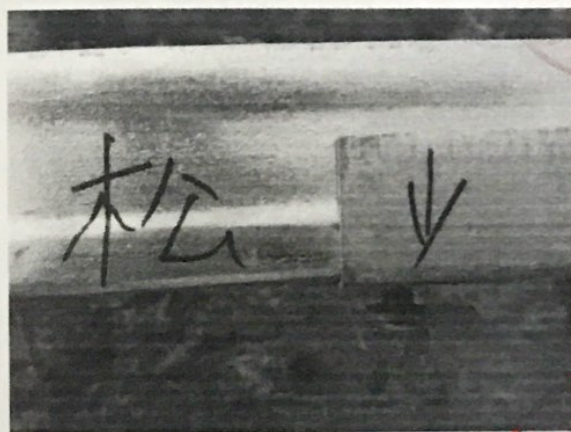

围网被破坏




围网螺栓未紧固



围网下有电线杆子



连接件空隙过大

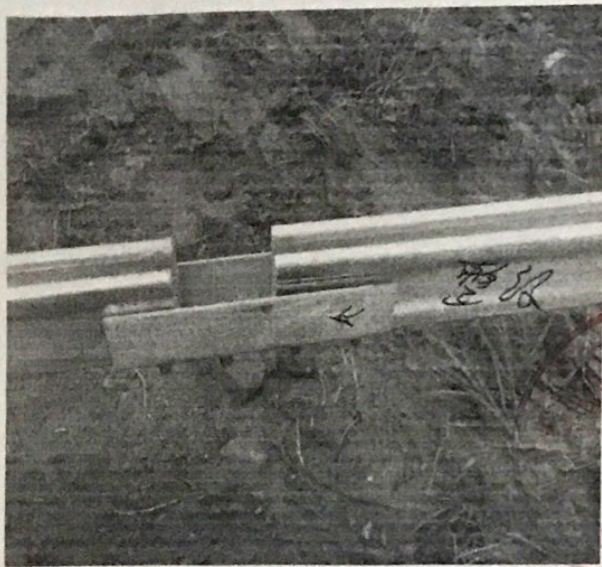

斜撑装反

