

监理工作联系单

项目名称: 西安中铁装备 1.83915MW 分布式光伏电项目

编号: ZHJL-ZTZB-011

致: 陕西大唐新能电力设计股份有限公司 施工项目部:

事由: 关于装配式结构厂房施工质量的相关事宜




内容: 1、个别边压块没有安装到位;

2、接地扁钢焊口焊接不合格直接涂刷银粉漆;

3、逆变器、汇流箱支架和接地扁钢的所有焊口都没有刷防锈漆, 直接刷银粉漆;

4、电缆桥架和接地扁钢没有固定在屋面彩钢板上;

5、汇流箱进出线 PVC 管不垂直于屋面。

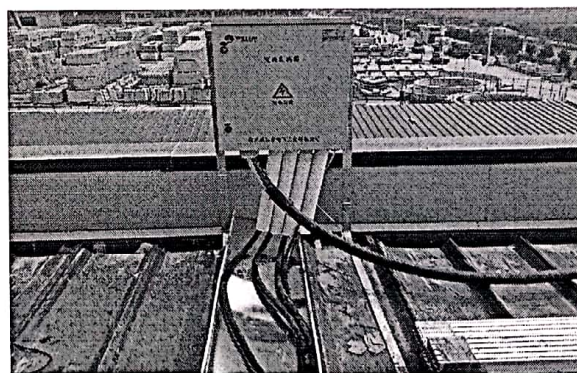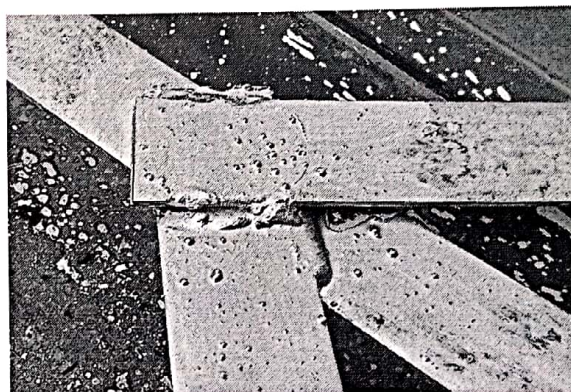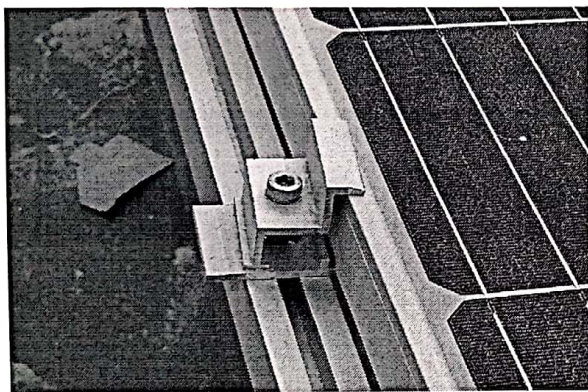

以上内容希望施工单位引起足够重视, 立即进行整改, 不要耽误后续的竣工验收。

项目监理部(章):

专业监理工程师:

高以平

日期: 2019 年 03 月 05 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部、监理项目部各存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建
