

## 监理工作联系单

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶 5.9MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-ZSFZ-LX-11

致：湖北飞友建设集团有限公司河南省浙商纺织有限公司屋顶 5.9MW 分布式光伏发电项目 施工项目部

事由：关于组件出场时油渍与施工造成的刮花区别

内容：

经监理单位对 2 号屋面组件吊装及散料巡视检查发现及班组反馈的组件问题，我单位做出以下说明及要求：

1. 组件散料时严重不符合组件安装手册要求，组件边框尖锐部分直接放置组件玻璃面伤，人员安装是极易造成组件刮花，堆放过多极易造成组件碎裂。（详见附图一、二）

2. 人员造成组件刮花会存在触摸粗糙的反馈，而且与出场时组件油渍花纹有明显的区别。

3. 组件出场时表面出现类似于花纹的，用手触摸会有一种类似于油渍扩散的，用水无法及时擦除的现象，此问题为组件出场时自身原因，已反馈厂家。（详见附图三、四）

要求：

组件散料必须严格按照要安装手册及交底求执行（详见会议纪要、通知单以及私发到各班组负责人微信上文件），严禁多块组件堆放，如再出现类似于图一的情况，我单位将按要求进行处罚（关于组件堆放，屋面支架导轨未经验收且未进行整改，私自施工进行组件吊装散料，整改未完成就进行组件吊装，造成的图一、二堆放，由此产生的组件刮花、碎裂、隐裂等现象将由你单位自行承担。）再次强调，如再出现安装人员踩、坐组件、组件刮花现象，我单位将按要求进行处罚


项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日 期： 2019



扫描全能王 创建

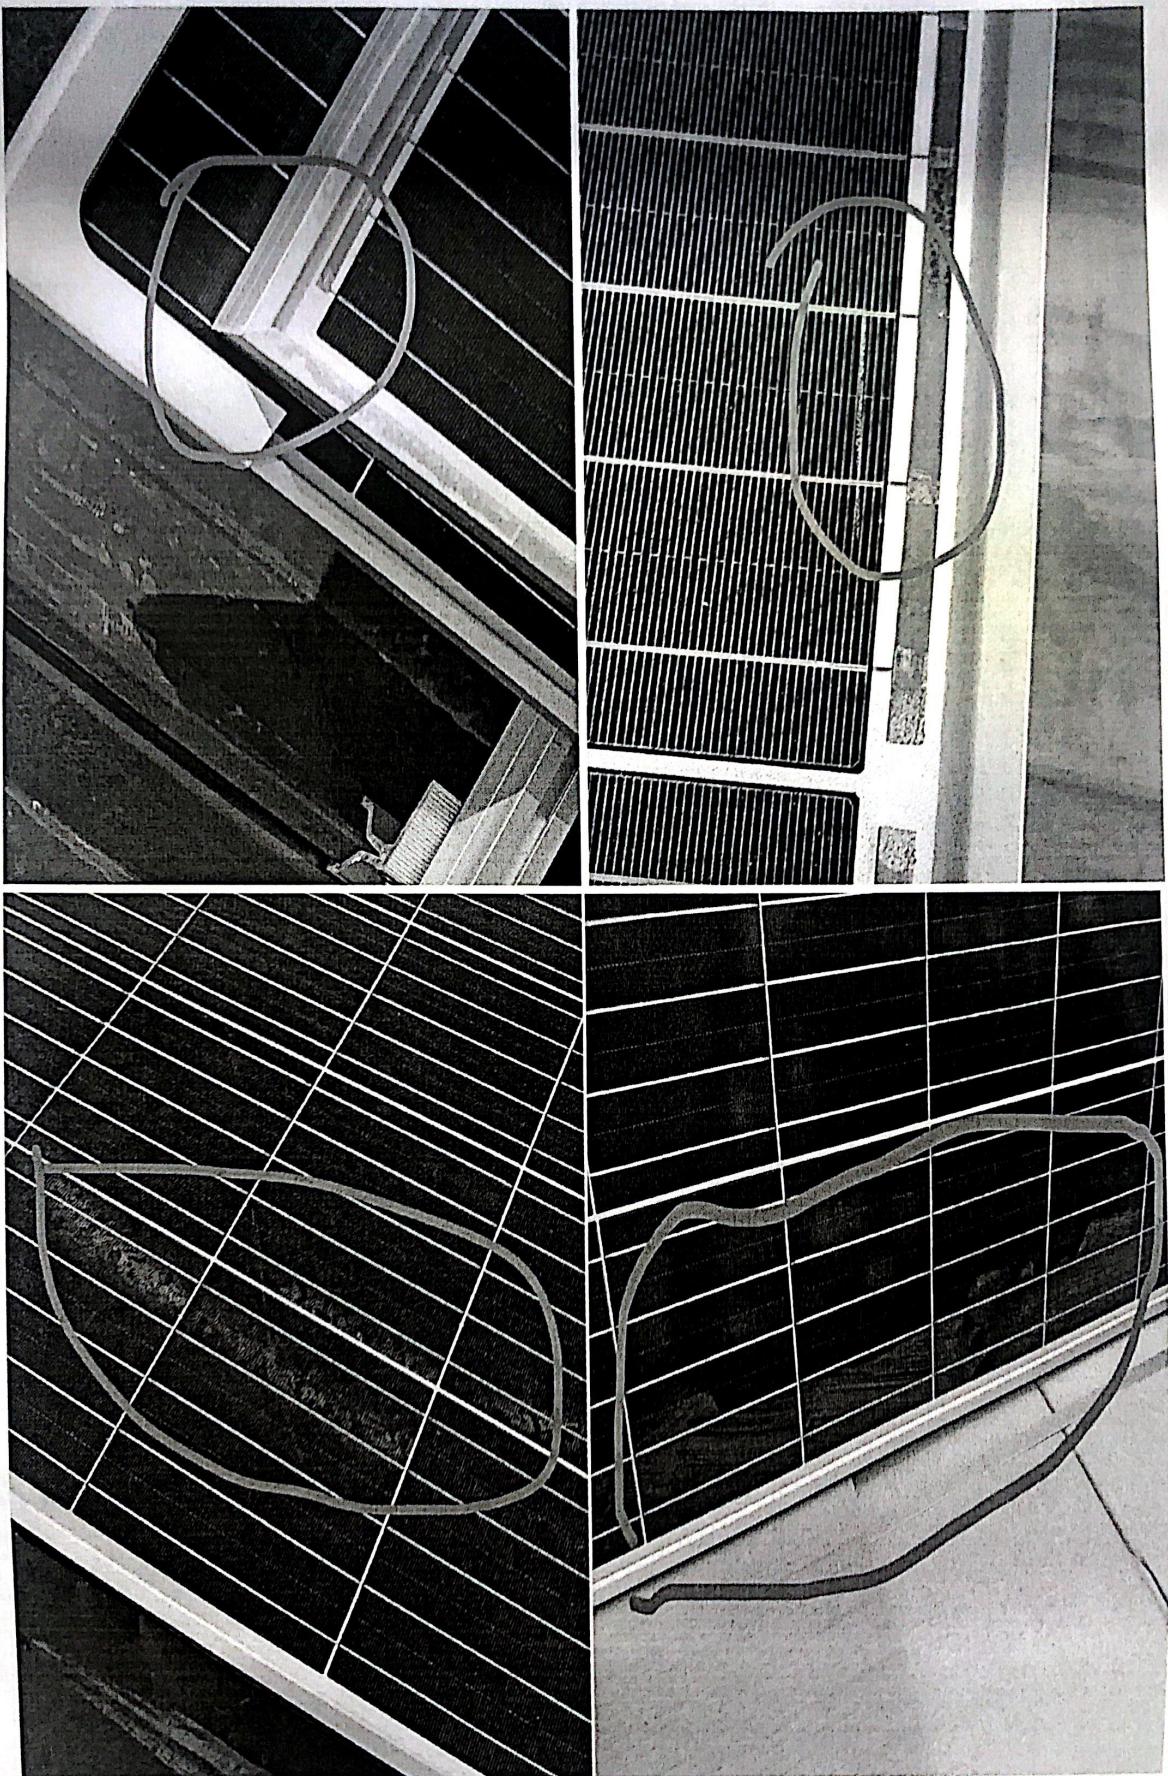

扫描全能王 创建
