

JXM6

监理工作联系单

工程名称：江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目


编号：JSJY-JL-LXD-05

致：上海电气集团股份有限公司江苏金源项目部

事由：关于屋面组件成品保护事宜

内容：

目前现场屋面组件安装已基本完成，开始转入后续桥架、逆变器等设备安装施工，经监理现场巡视发现，2#屋面组件上发现有脚踩痕迹，要求你单位项目部加强现场管理，做好成品保护工作，杜绝任何使组件产生隐裂隐患的一切行为，若再发现此类现象发生，监理部将对你单位项目部进行经济考核。

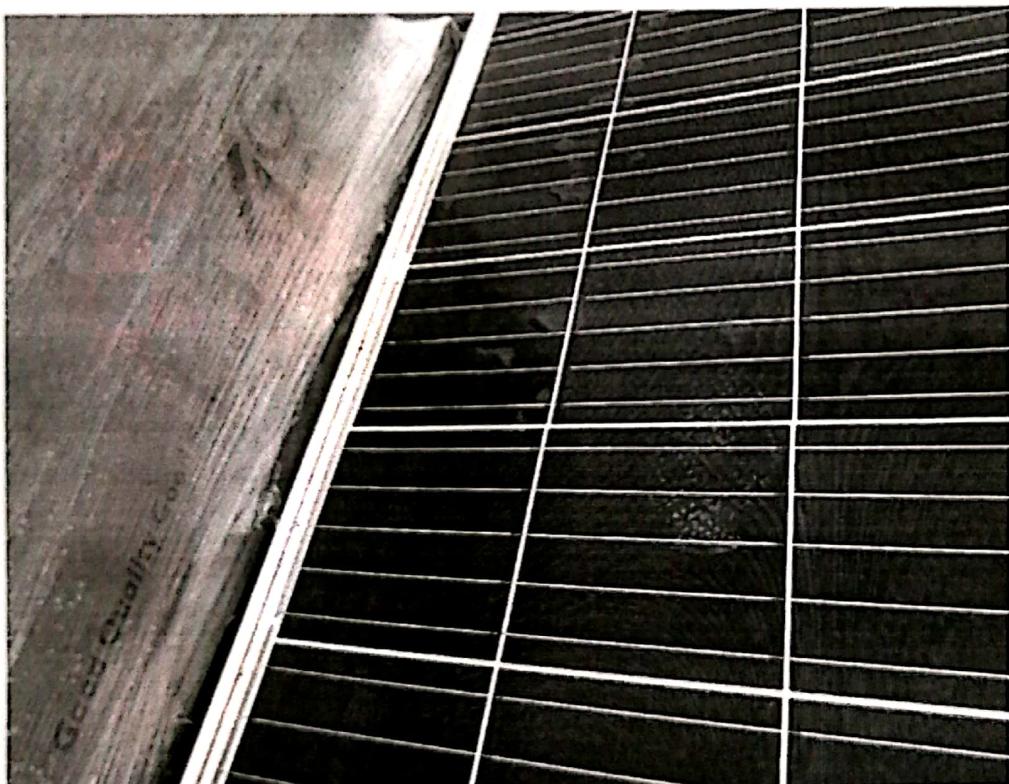

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2017年09月06日



本表一式二份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。
