

监理工作联系单


项目名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

编号：ZHJL-JLYJY-LXD-011

致：江苏中天科技工程有限公司 施工项目部

事由：关于接地扁钢焊接质量的相关事宜：

内容：彩钢瓦屋面防雷接地扁钢焊接时，两根扁钢搭接重叠的部分，长度必须要大于扁钢宽度的 2 倍，扁钢重叠的部分施焊时必须满焊，个别焊口咬边、焊瘤现象严重，不符合焊接规范要求。

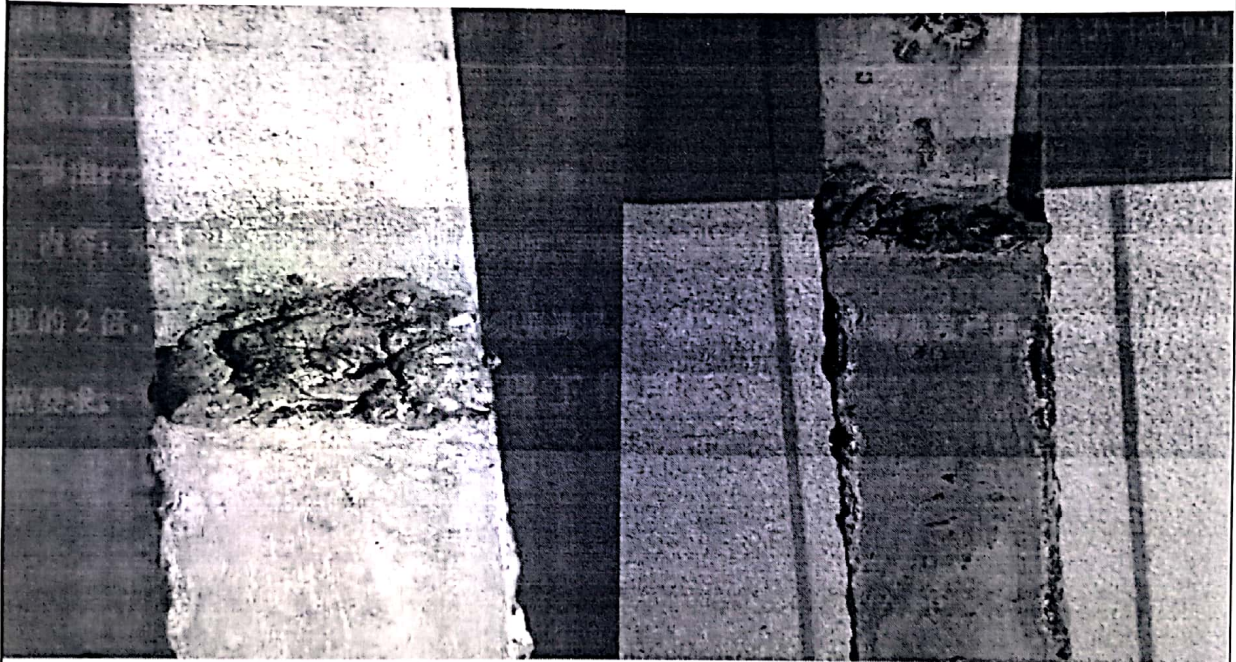

以上内容请施工单位负责人立即安排施工人员整改，不合格的焊缝全部割掉重焊，类似问题不要再次发生。

项目监理部（章）：

专业监理工程师：

日

期：2019 年 08 月 26 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部 1 份。



扫描全能王 创建
