


监理工作联系单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
编号：TJYJP-CZZH-LXD-004

致：安徽天太太阳能光伏工程有限公司（施工单位）

事由：关于施工质量及施工工序的事宜

内容：2019年10月19日上午，我方监理项目部人员在巡视施工现场过程中发现：你单位在高庄区域支架安装与组件安装两道工序同时进行，违反了施工规范工序要求，易造成隐裂损坏组件严重影响了施工安装质量。你单位必须严格遵守光伏电站支架及组件安装规范技术要求，若因私自更改施工方法而造成的一切损失由你单位自行负责，监理项目部将依据施工管理办法及处罚规定对你单位进行经济考核。

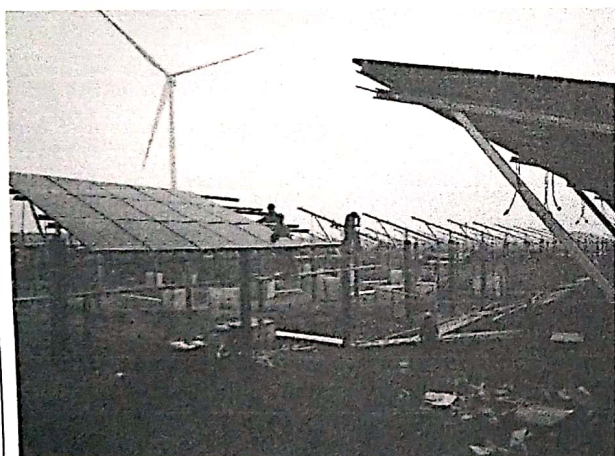


支架与组件同时安装施工

抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 李久波

日期： 2019 年 10 月 19 日



本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。



扫描全能王 创建
