

监理工作联系单

工程名称：崇礼区 28 个村级光伏扶贫电站项目（二标段）

编号：ZHJL-LXD-010

致：江西展宇光伏科技有限公司施工项目部

抄送：张家口崇礼区城镇建设发展有限公司（二标段）项目部

主题：巡视检查二标段村级电站现场施工

内容

监理对二标段标段四个村级电站现场进行巡视检查，发现存在以下问题：

- 1、巡视现场发现预埋件与立柱间缺少螺栓紧固；
- 2、檩条与连接件螺栓未紧固到位；
- 3、檩条、C 型钢切口处未做防腐处理；
- 4、接地扁铁焊接处未做除渣处理；
- 5、个别安装的组件压块缺失；
- 6、阵列拉杆未按图施工；
- 7、逆变器交流电缆穿管需校正；
- 8、接地扁铁未延沟敷设；接地扁铁未焊接到位。

以上各村级电站施工方需对现场问题统一检查并整改，完成后上报我监理部，若发现未整改继续施工将对你单位进行重罚。

现场问题照片见附件

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。




扫描全能王 创建

附件:



1、立柱与预埋件缺少螺栓




2、檩条与连接件螺栓未紧固

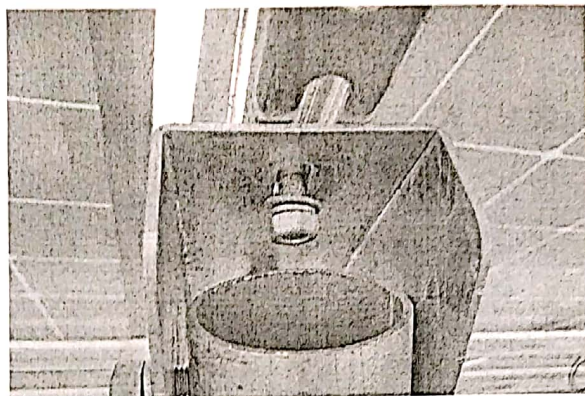


3、檩条、C型钢切口处未做防腐处理

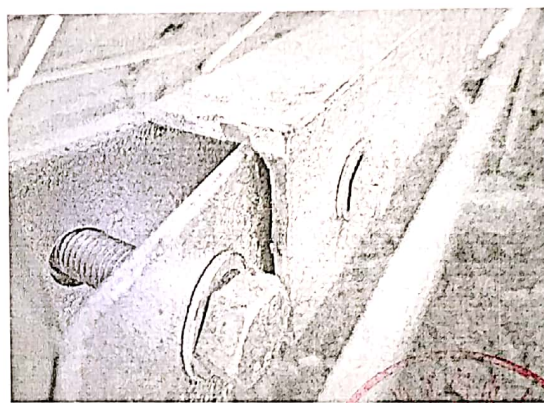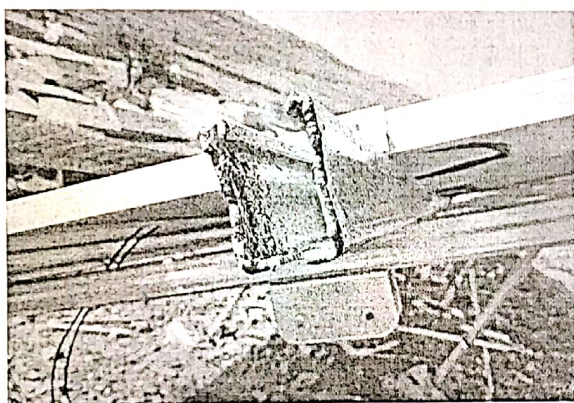

4、接地扁铁焊接处未做除渣处理

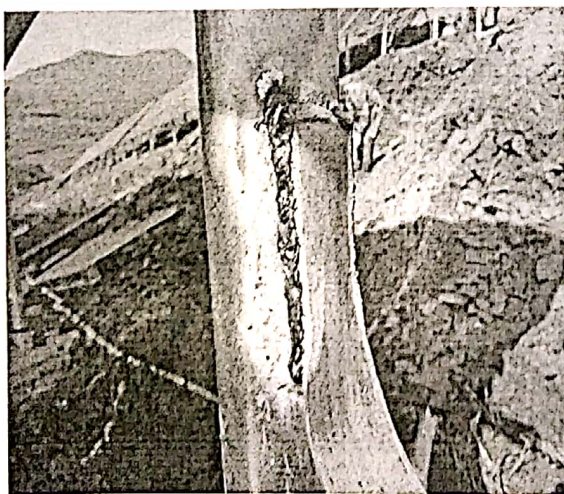

5、个别安装的组件压块缺失

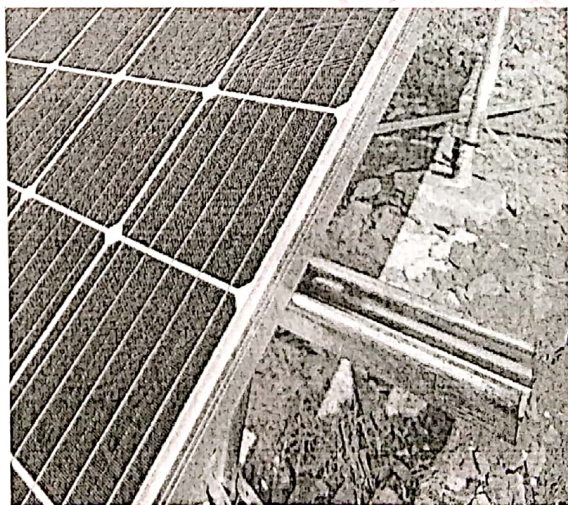


扫描全能王 创建

6、阵列拉杆未按图施工



7、逆变器交流电缆穿管需校正

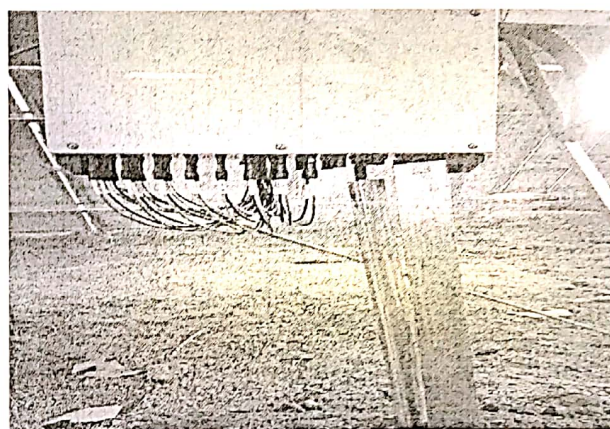

8、接地扁铁未延沟敷设；接地扁铁未焊接到位

