

监理工作联系单

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-LXD-002

致: 安徽慧天新能源有限公司施工项目部

抄送: 合肥正泰光伏发电有限公司 项目部


主题: 生产质量监督管理与执行

内容

监理对联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 6#厂房屋顶支架安装进行巡视检查,发现存在以下问题:

1、联宝(合肥)项目厂房屋顶支架部分安装不符合要求,现场安装间距有偏差,不垂直,将会造成后期组件安装有偏差。现要求你方立即整改,限期一天。

整改完成后报监理验收合格后方可进行下一步施工。

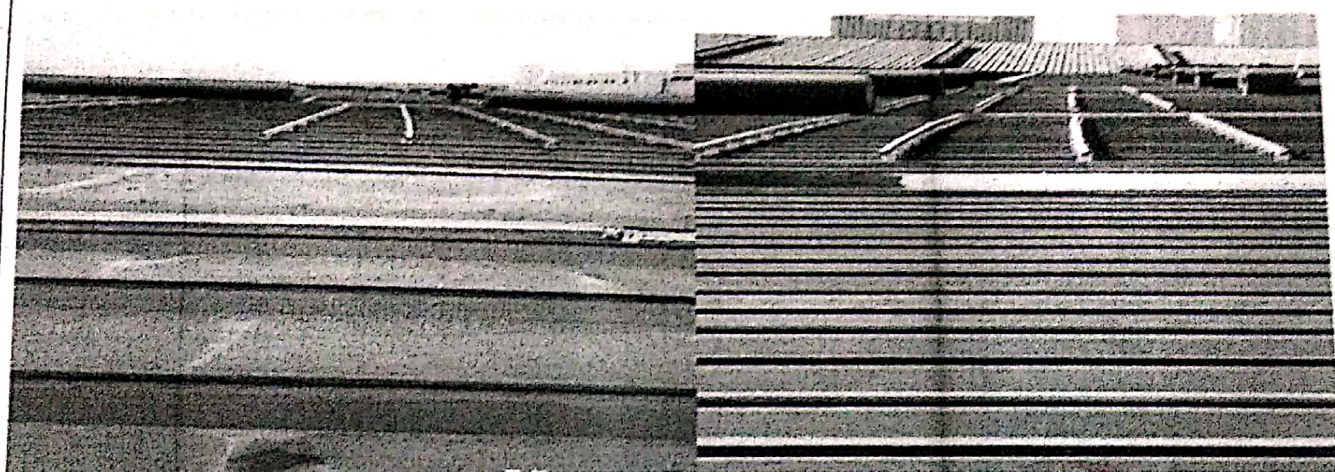

项目监理机构(章):

专业监理工程师: 2014.11.13

日期: 2014.11.13

注: 本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



扫描全能王 创建
