

监理工作联系单

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-LXD-007

致: 安徽慧天新能源有限公司施工项目部

抄送: 合肥正泰光伏发电有限公司 项目部


主题: 生产安全、质量监督管理与执行

内容

监理对联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 1#、2#、4#、5# 屋面厂房屋顶安装进行巡视检查, 发现存在以下问题:

检查过程中发现有围栏、桥架材料吊装到厂房屋顶之后, 未能及时散开。导致大量材料堆积在一起, 因库房加固尚未完成, 厂房承载力不够。现要求施工单位一到两天之内将材料进行分散处理, 避免雨雪天气影响厂房结构安全。现要求围栏、桥架及汇流箱等材料停止吊装。

现场安全文明施工落实不到位, 屋面垃圾未做到及时清理。施工人员施工过程中没有安全防护意识, 安全教育落实不到位。要求对施工人员进行安全教育宣传, 增强工人施工安全意识。

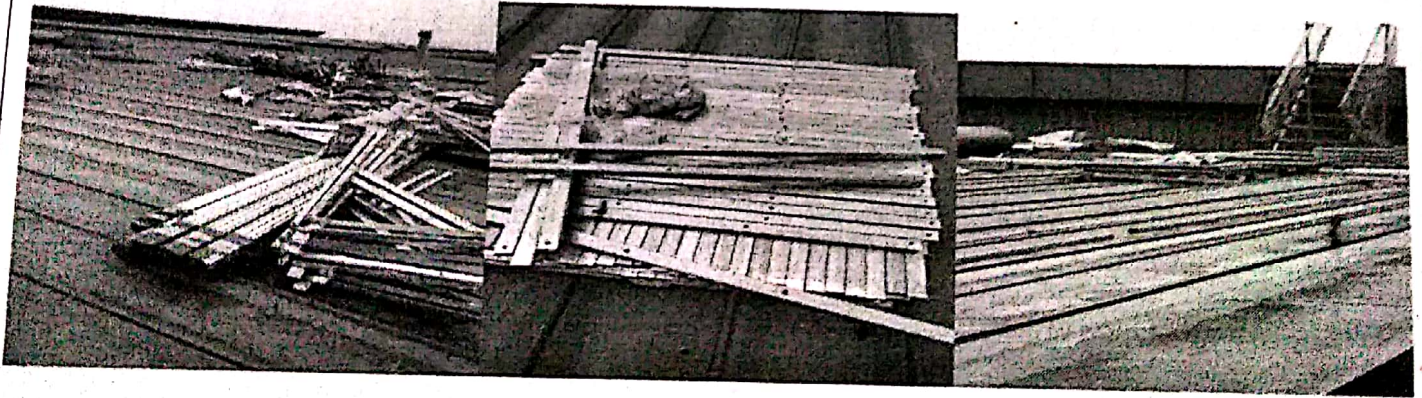

项目监理机构(章):

专业监理工程师: 孙文/3

日

期: 2014.12.24

注: 本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



扫描全能王 创建
