

监理工作联系单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：JXM8-JL01-014

致：中电建湖北电力建设有限公司

抄送：公安县通威渔光科技有限公司

事由：关于加快并网前准备事宜

内容：

目前正处于并网关键时期，经检查光伏区存在以下问题：

1. T1、T2、T11 箱变试验还未完成及符合要求的相关试验报告；
2. 未见箱变保持定值整定报告；
3. 未见并网前核准相序的记录；
4. 未见汇流箱、逆变器电缆试验报告；
5. 箱变高压电缆未做固定和封堵（附图 1）。
6. 箱逆一体变平台防雷接地未完成、且局部搭接长度不符合规范要求（附图 2）。
7. 光伏区至升压站运行桥架内的电缆排布杂乱和部分桥架出现变形。

针对以上问题，望你单位立即落实整改，以确保安全并网。

监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师：

日期：2020年6月24日

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。

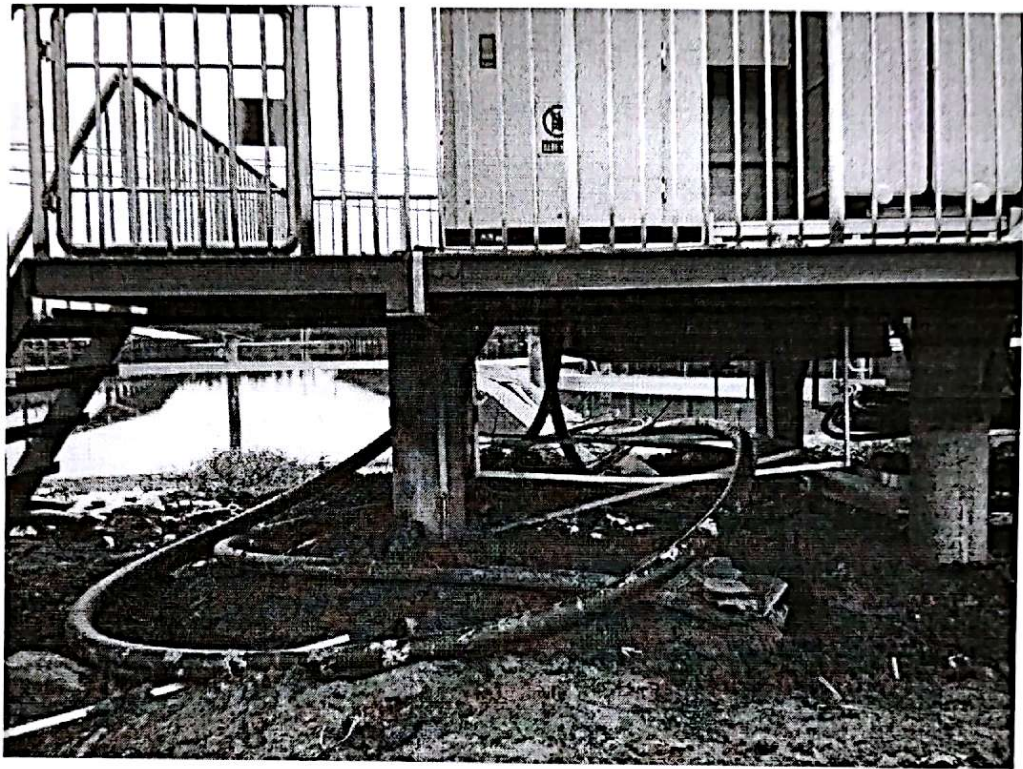


图 1

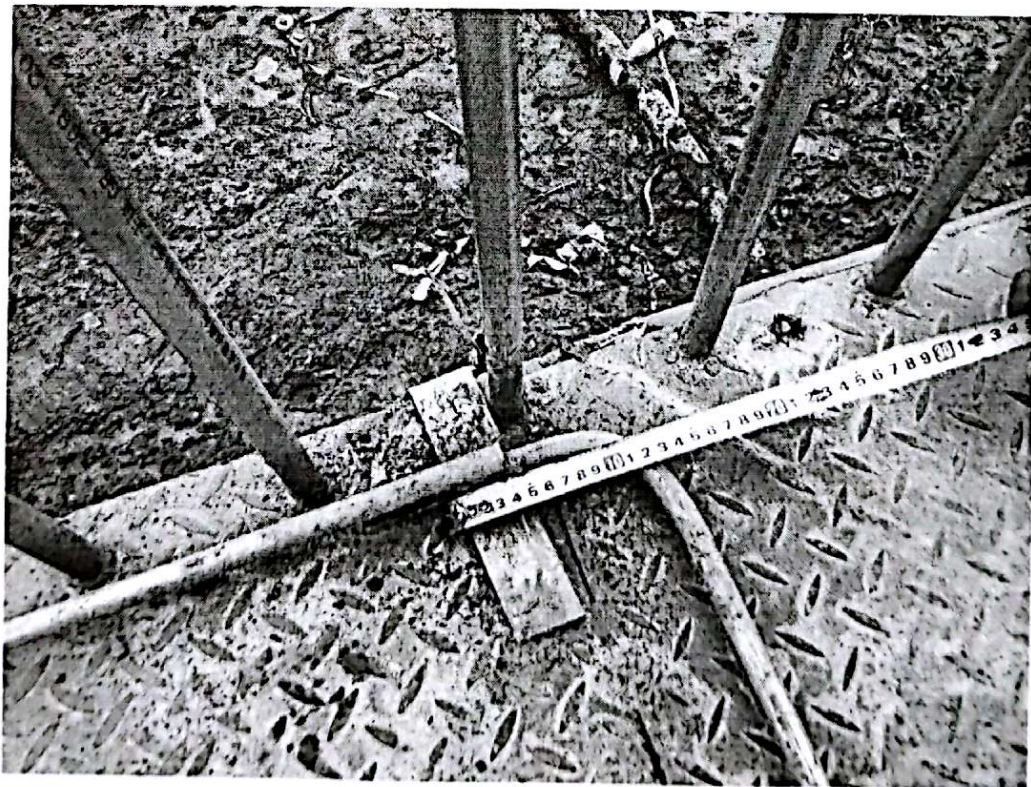


图 2
