

监理工作联系单

工程名称：昆山普枫新能源有限公司昆山普淀仓储有限公司 2000kwp 分布式光伏发电项目

编号：JXM6-ZHJL-007


主送：昆山普枫新能源有限公司

抄送：阳光电源股份有限公司

主题：关于项目时间进度计划事宜

内容：

项目时间进度计划表于 6 月 30 日并网，现场施工进度已严重滞后，望你单位尽快增加施工人员，确保施工进度，并做好安全技术交底，确保施工质量及施工安全，否则因滞后并网发电所造成的一切损失有你单位承担。

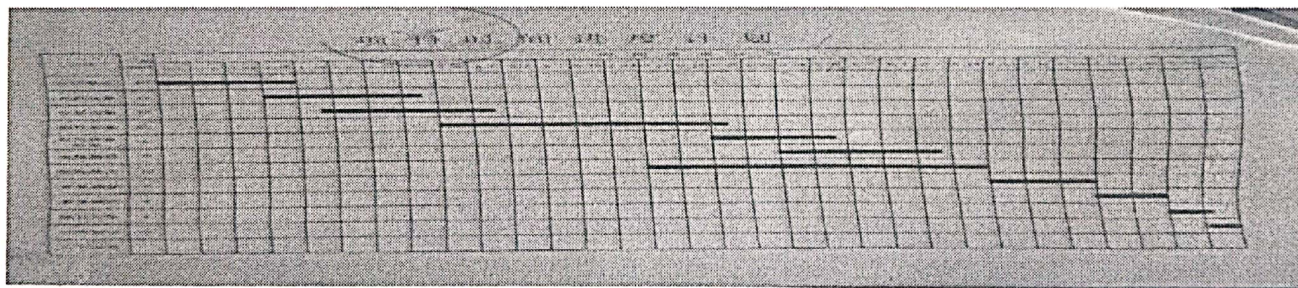

监理项目部：（章）

总监理工程师：子彬

日期：2020年6月16日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建
