

监理工作联系单

工程名称：杭州普枫新能源杭州物流园 1.5MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HZPF-LXD-08


主送：杭州普枫新能源有限责任公司

抄送：阳光电源股份有限公司

主题：关于项目时间进度计划事宜

内容：

杭州物流园南区 1MWp 项目时间进度计划表于 2020 年 6 月 28 日并网，现场施工进度已严重滞后，望你单位尽快增加施工人员，确保施工进度，并做好安全技术交底，确保施工质量及施工安全，否则因滞后并网发电所造成的一切损失由你单位承担。

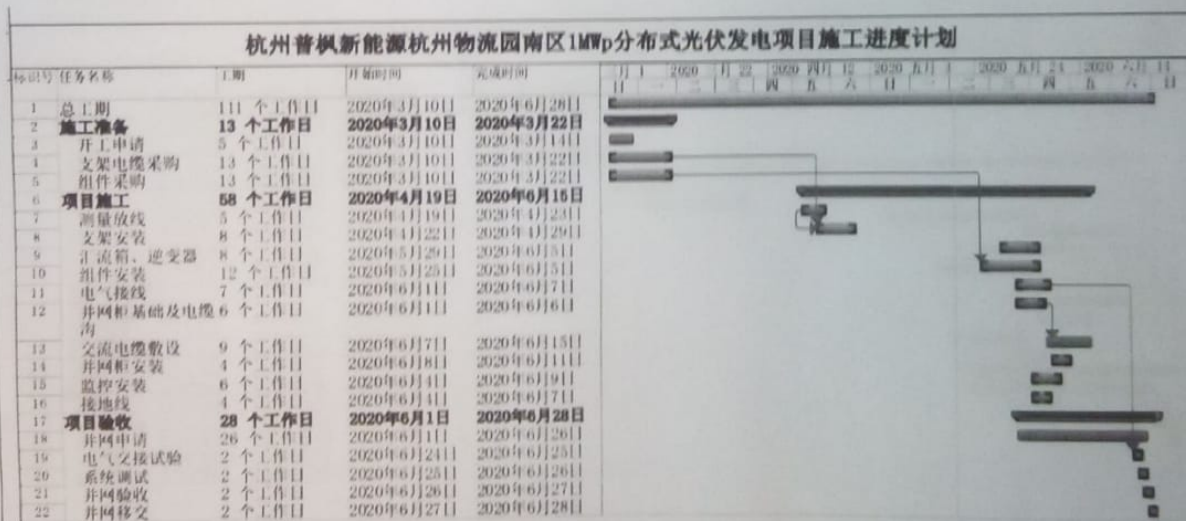

项目监理部（章）：

总监理工程师：

日期：2020 年 6 月 17 日

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位
