

监 理 联 系 单

工程名称：浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目


编号：XCE-B3-006

致：浙江群朗电力工程技术有限公司

事由：关于现场问题事宜

内容：你单位承包施工的《浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目》：目前存在以下问题：

- 1、电缆井砌筑前，未浇筑垫层；
- 2、电缆井进线口处的砖有掉落可能，需做加固措施；
- 3、浇筑的路面需切割伸缩缝；
- 4、长度不足的电缆做接头前需报审相关方案；
- 5、施工资料尽快报审，进场材料、相关工序要按时报验；

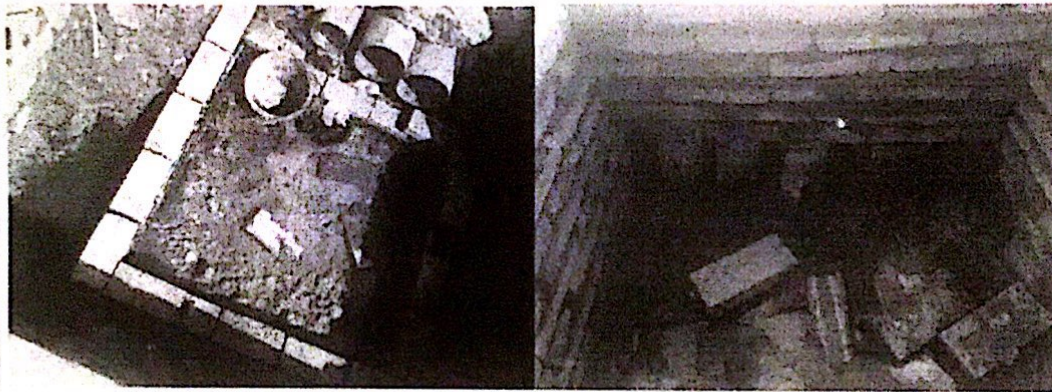

以上问题要求你方尽快处理；

抄送：安吉嘉晖新能源科技有限公司

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：

日 期：2020 年 10 月 02 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。
