

监理工作联系单

工程名称：振发太阳能科技滨海有限公司增容技改项目

编号： ZFBH-JL-LXD-001


致：上海上电电力工程有限公司（项目部）

事由：

现场打桩施工进度

内容：

经现场检查发现，自 2020 年 12 月 02 日下午三点开始进行打桩试桩施工至今日上午十点，现场共完成 1#区 21 根和 2#区 72 根，累计共完成 93 根桩，完成率 18.4%，目前现场已暂停正在修理桩机，且施工期间该打桩机已发生故障两次，影响打桩施工进度，按第一次工地例会达成的时间节点为 12 月 08 日至 10 日打桩全部完成，现发出监理联系单要求你单位项目部采取措施在保证质量的前提下加快打桩进度，确保按时完成施工节点。

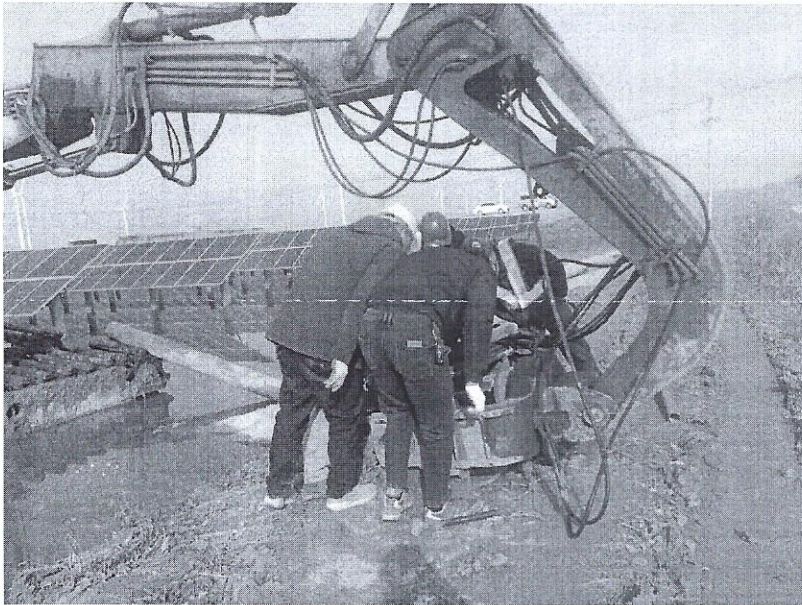

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期： 2020 年 12 月 05 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。
