

监理工作联系单

工程名称：阳江亨氏 1.341MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-004

致：浙江西子联合工程有限公司 总包施工项目部

抄送：阳西县必奥光伏发电有限公司 业主项目部

事由：关于组件组件安装质量事宜

内容：

由你方承建的<阳江亨氏 1.341MWp 屋顶分布式光伏发电项目>，今日组件吊装分散时
监理人员现场发现以下问题：

- 1、早上组件搬运时出现一人肩抗，现场已制止，下午继续出现此类现象；
- 2、分散的组件有 1 块玻璃划伤，1 块玻璃面有脚印；
- 3、有半箱组件倾倒，导致 1 块组件背板玻璃面划伤；
- 4、现场发现 1 块组件电池片虚焊、主栅偏移；

监理项目部已于 11 月 30 日下发监理工作联系单（编号 003），明确要求光伏组件搬运需两人平抬，禁止一人肩抗、后背、头顶，严禁踩踏，今日连续两次出现一人肩抗的现象。现业主项目部及监理项目部对贵单位处以 1000 元罚款，要求贵单位引起重视，给现场施工人员做好技术交底，对于现场挑出的问题组件严禁私自安装，一经发现将对贵单位进行重罚。

后附问题组件照片及编号

项目监理部（章）


总/专业监理工程师：南玉蓉

日期：2021 年 11 月 1 日




注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。


问题组件照片及编号

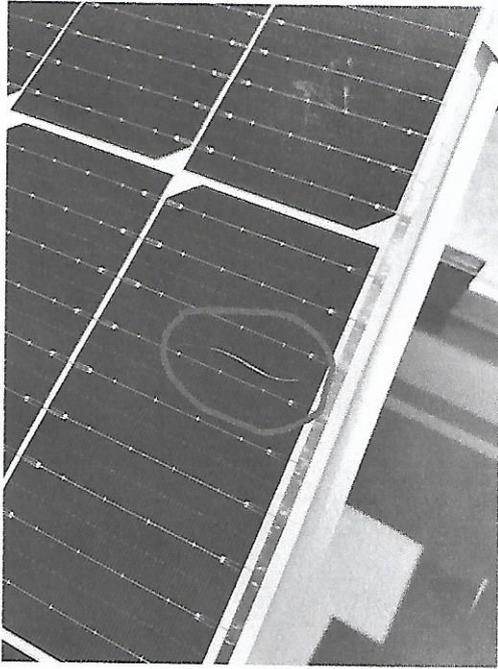


组件编号: 2190108250190601

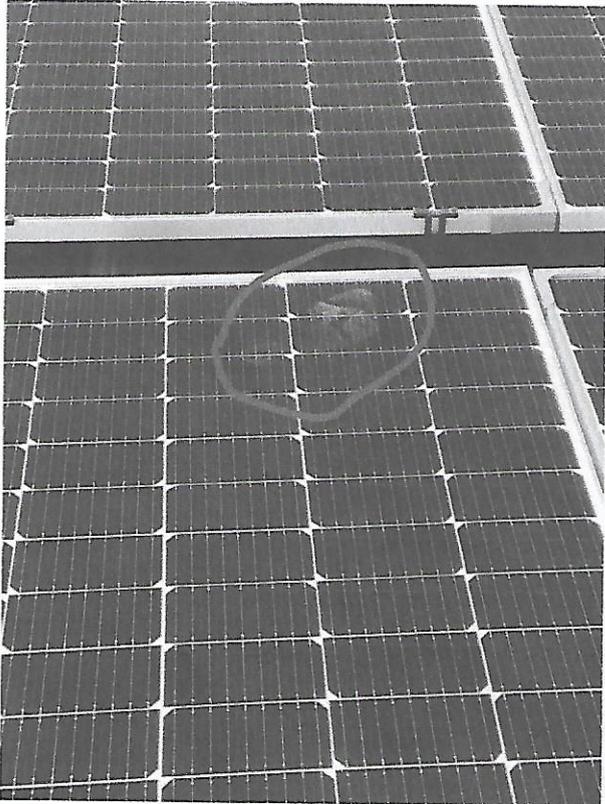

组件编号: 2190108250188279

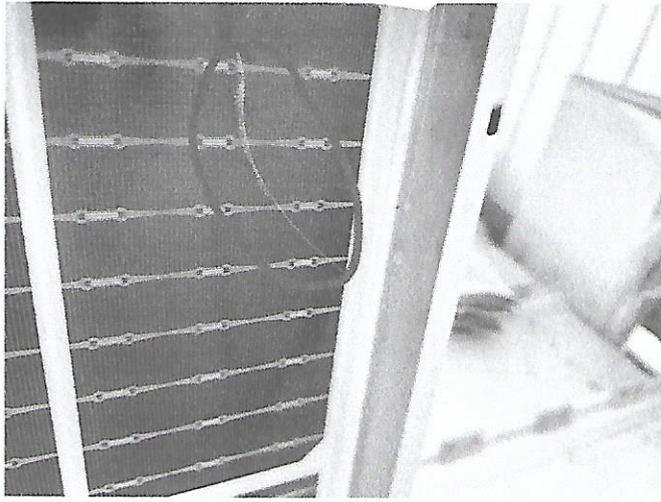

组件编号: 2190108250187307

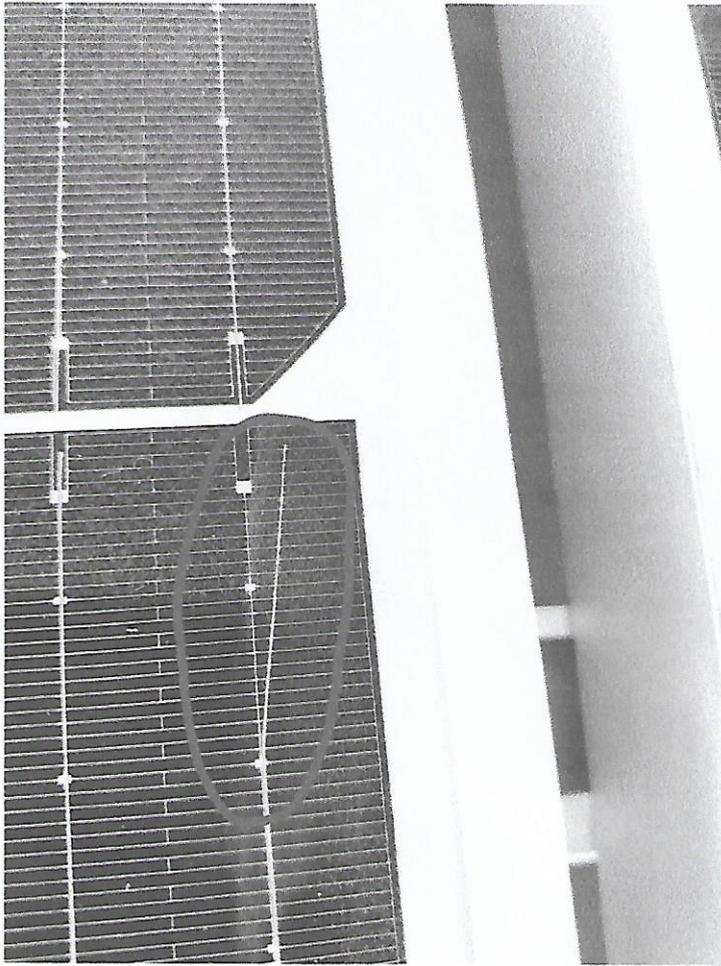

组件编号: 2190108250192231
